



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DEL PERÚ



Firmado digitalmente por ESPEZUA
CHALCO Angel Jimmy FAU
20131370301 soft
Gerente Central De La Oficina
General De Tecnologías De
Motivo: Doy V° B°

PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2025 - 2027



Firmado digitalmente por
ENRIQUEZ GUTIERREZ Cesar
Augusto FAU 20131370301 soft
Gerente General
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.12.2025 12:55:41 -05:00



Firmado digitalmente por
GOICOCHEA MERELLO Jorge
Antonio FAU 20131370301 soft
Gerente De La Oficina General De
Asesoría Jurídica
Motivo: Doy V° B°



Firmado digitalmente por PAREDES
MORALES Luis Gabriel FAU
20131370301 soft
Gerente Central De Oficina De
Planificación Y Presupues
Motivo: Doy V° B°

Lima, noviembre de 2025

ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN	5
II.	BASE LEGAL.....	6
II.1	Normas de Gobierno Digital / Transformación Digital.....	6
II.2	Normas de Atención al Ciudadano	7
II.3	Normas de Gestión Documental.....	7
II.4	Normas de Seguridad de la Información.....	8
II.6	Normas de Software Legal en Entidades Públicas.	8
II.7	Normas de Firmas y Certificados Digitales.....	8
II.8	Normas relacionadas al Ministerio Público.....	8
III.	ENFOQUE ESTRATÉGICO.....	9
III.1	Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).	10
III.2	Acciones estratégicas institucionales.....	11
III.3	Gestión por Procesos.....	11
III.4	Políticas internas vigentes en el ámbito de las tecnologías digitales.....	12
III.5	Políticas o documentos del entorno vigentes.....	14
	Transformación Digital en el Perú.	14
	Tendencias.....	19
	Tendencias Tecnológicas y de Innovación en Servicios Digitales.....	19
	Tendencias en la Formulación de Proyectos de Gobierno Digital.	20
IV.	SITUACIÓN ACTUAL DEL GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL MINISTERIO PÚBLICO.....	21
IV.1	Comité de Gobierno y Transformación Digital (CGTD).	21
IV.2	Cumplimiento de la regulación digital.	22
IV.3	Plan de Gobierno y Transformación Digital 2025 – 2027.....	24
IV.4	Ranking de E-GOVERNMENT 2024.....	24
IV.5	Infraestructura Tecnológica: Hardware.	26
IV.5.1	Redes y Comunicaciones.....	26
IV.5.2	Infraestructura Informática.....	28
IV.6	Conectividad	30
IV.7	Infraestructura Tecnológica: Software.....	30
IV.8	Procesos Digitalizados.....	31

IV.9	Servicios Digitales	33
IV.10	Seguridad de la Información	38
IV.11	Presupuesto	38
V.	OBJETIVOS DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL MINISTERIO PÚBLICO.....	39
V.1	Desafíos del Gobierno y Transformación Digital.....	39
V.2	Objetivos de Gobierno y Transformación Digital.	40
VI.	PORTAFOLIO DE PROYECTOS.....	45
VI.1	Priorización del Portafolio de Proyectos de Gobierno y Transformación Digital.	46
VII.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGTD	50
VIII.	SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGD	50
IX.	ANEXO I – FICHAS TECNICAS INDICADORES.....	53
X.	ANEXO 2 – FICHAS TECNICAS DE PROYECTOS.....	57
	FICHA DE PROYECTO 1.....	57
	FICHA DE PROYECTO 2.....	61
	FICHA DE PROYECTO 3.....	64
	FICHA DE PROYECTO 4.....	68
	FICHA DE PROYECTO 5.....	72
	FICHA DE PROYECTO 6.....	76
	FICHA DE PROYECTO 7.....	80
	FICHA DE PROYECTO 8.....	84
	FICHA DE PROYECTO 9.....	88
	FICHA DE PROYECTO 10.....	92
	FICHA DE PROYECTO 11.....	96
	FICHA DE PROYECTO 12.....	100
	FICHA DE PROYECTO 13.....	103
	FICHA DE PROYECTO 14.....	107
	FICHA DE PROYECTO 15.....	111
	FICHA DE PROYECTO 16.....	114
	FICHA DE PROYECTO 17.....	117
	FICHA DE PROYECTO 18.....	121
	FICHA DE PROYECTO 19.....	124
	FICHA DE PROYECTO 20.....	128
	FICHA DE PROYECTO 21.....	132
	FICHA DE PROYECTO 22.....	136
	FICHA DE PROYECTO 23.....	140

FICHA DE PROYECTO 24.....	144
---------------------------	-----

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Objetivos Estratégicos Institucionales 2023-2030	11
Tabla 2: OEI / AEI Institucionales 2023-2030.....	11
Tabla 3: Cumplimiento de la regulación digital del Ministerio Público.....	22
Tabla 4: Tipo de conectividad a nivel nacional	30
Tabla 5: Matriz de Alineamiento: Gestión por Procesos en el Ministerio Público.....	32
Tabla 6: Proyectos y Objetivos de Gobierno y Transformación Digital.....	42
Tabla 7:Objetivos de Gobierno y Transformación Digital	44
Tabla 8: Cartera Proyectos.....	45
Tabla 9: Valoración	46
Tabla 10: Rango de Prioridades	47
Tabla 11: Cartera Proyectos Priorizados	48
Tabla 12: Cronograma de Implementación de Portafolio de Proyectos.....	49
Tabla 13: Cronograma de Implementación del plan.....	50

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Valores que promueve el Ministerio Público	9
Ilustración 2: Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).....	10
Ilustración 3: Caratula Reglamento Interno para el acceso y uso de herramientas y servicios informáticos.	14
Ilustración 4: Modelo conceptual de la transformación digital.	15
Ilustración 5: Modelo del problema público.....	16
Ilustración 6: Objetivos prioritarios de la Política Nacional de Transformación Digital.....	16
Ilustración 7: Ficha de servicio Identificado para la Carpeta Fiscal Digital.....	17
Ilustración 8: Ficha de servicio Identificado para la Carpeta Fiscal Digital.....	17
Ilustración 9: Indicadores para la ficha del servicio	18
Ilustración 10: Ranking de E-GOVERNMENT 2024.....	25
Ilustración 11: Datos de infraestructura tecnológica.....	27
Ilustración 12: Equipos informáticos.....	28
Ilustración 13: Antigüedad de equipos informáticos.	29
Ilustración 14: Obsolescencia de los equipos informáticos.	29
Ilustración 15: Mapa de procesos institucional	31
Ilustración 16: Portal Ministerio Publico.....	33

Ilustración 17: Mesa de Partes Electrónica	34
Ilustración 18: Mesa de partes Secretaria General de la Fiscalía de la Nación	34
Ilustración 19: Pagina Web de Seguimiento de Denuncias.....	35
Ilustración 20: Pagina Denuncias WEB.....	35
Ilustración 21: Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad.	36
Ilustración 22: Pagina WEB para convocatorias de empleo.....	37
Ilustración 23: Pagina WEB de ORACE para mostrar estadísticas relevantes del Ministerio Publico	37
Ilustración 24 : PIM del año 2024	39
Ilustración 25: Objetivos de Gobierno y Transformación Digital	41
Ilustración 26: Dimensiones versus objetivos de Gobierno y Transformación Digital	41

I. INTRODUCCIÓN.

La rápida evolución tecnológica en la economía digital representa un desafío constante para las Entidades Públicas del Perú. A medida que los ciudadanos y las empresas acceden a más información y están más interconectados, sus expectativas sobre la calidad y eficiencia del servicio público aumentan. Esto impulsa la demanda de decisiones más inclusivas y transparentes, lo que obliga a fortalecer las capacidades estratégicas para planificar, gestionar e implementar soluciones digitales innovadoras y colaborativas que respondan a estas exigencias.

La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital - SGTD, viene impulsando el proceso de TRANSFORMACIÓN DIGITAL en las entidades de la Administración Pública, orientado a un Gobierno Digital que genere valor público e impacte en la mejora de la atención de los ciudadanos y personas en general.

Asimismo, la revolución digital a nivel global está redefiniendo nuestra economía, sociedad y la manera en que se brindan los servicios públicos. En este contexto, los procesos de transformación digital dentro de la Administración Pública adquieren una importancia creciente, y su liderazgo se vuelve un elemento clave para el éxito de estas iniciativas.

Mediante Decreto Legislativo N°1412, del 13 de setiembre de 2018, se aprobó la Ley de Gobierno Digital, el cual define el concepto de Gobierno Digital como “el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la Administración Pública para la creación del valor público” y entre otros aspectos establece “el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por parte de las entidades de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno”, y, como finalidad establecer “la mejora de la prestación y acceso de servicios digitales en condiciones interoperables, seguras, disponibles, escalables, ágiles, accesibles, y que faciliten la transparencia para el ciudadano y personas en general”; además de promover la colaboración entre las entidades de la Administración Pública, así como la participación de ciudadanos y otros interesados para el desarrollo del gobierno digital y sociedad del conocimiento”.

Con el Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, se aprobó la creación de la Plataforma Digital Única del Estado Peruano, en el cual se establecen disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital. En el artículo 9, dispone la creación del rol del Líder de Gobierno Digital en las entidades de la Administración Pública, quien tiene la responsabilidad de coordinar las políticas, objetivos, planes y acciones para el desarrollo del Gobierno Digital en la Entidad.

A través de la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, modificada por la Resolución Ministerial N° 87-2019-PCM, en su artículo 1° se señala que, cada entidad pública debe constituir un Comité de Gobierno Digital, siendo una de sus funciones, la formulación del Plan de Gobierno y Transformación Digital.

Asimismo, mediante la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, se aprobaron: “Los Lineamientos para la Formulación del Plan de Gobierno y Transformación Digital”, y dispone su artículo 3, que el Plan de Gobierno y Transformación Digital: “Es un único instrumento para la gestión y planificación del Gobierno Digital de la Administración Pública, y es aprobado por el Titular de la Entidad para un período mínimo de tres (03) años, debiendo ser actualizado y evaluado anualmente”.

“Los Lineamientos para la Formulación del Plan de Gobierno y Transformación Digital “ aprobados por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, establecen que el Plan de Gobierno y Transformación Digital busca el desarrollo del Gobierno digital y la transformación digital de la Administración Pública, coadyuvando a mejorar la relación entre el ciudadano y el Estado, así como también a mejorar su experiencia e incrementar su confianza, constituyendo el único instrumento de gestión cuyo objetivo es definir la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos de Gobierno Digital, los cuales están, por un lado, en función de las necesidades de los ciudadanos, las necesidades de información de la entidad y cambios en el entorno, y, por otro lado, enfocados en la digitalización de servicios, procesos e información de la entidad, haciendo uso intensivo de las tecnologías digitales y la innovación dirigida por datos.

El presente documento contiene el Plan de Gobierno y Transformación Digital del Ministerio Público correspondiente al período 2025-2027 (PGTD), el cual ha sido elaborado en el marco de los lineamientos establecidos por la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI); tiene como objetivo lograr la mejora de la prestación y acceso a los servicios institucionales para el ciudadano y usuarios en general.

El Plan de Gobierno y Transformación Digital (PGTD) del Ministerio Público se articula con los objetivos y acciones estratégicas institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) para el periodo comprendido entre 2023-2030.

II. BASE LEGAL.

El marco legal que rige la formulación del presente Plan, según los grupos temáticos:

II.1 Normas de Gobierno Digital / Transformación Digital.

- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital.
- Decreto Legislativo N° 1447, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1211, que aprueba medidas para el fortalecimiento e implementación de Servicios Públicos integrados a través de ventanillas únicas e intercambio de información entre entidades públicas.
- Decreto de Urgencia N° 006-2020, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital.
- Decreto de Urgencia N° 014-2021, que dicta Medidas extraordinarias y urgentes para la contratación de la provisión de conectividad a la población rural y de lugares de preferente interés social y su acceso a servicios públicos de telecomunicaciones, en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19.
- Decreto Supremo N° 081-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017.
- Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, que crea la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y establece disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital.
- Decreto Supremo N° 118-2018-PCM, que declara de interés nacional el desarrollo del Gobierno Digital, innovación y la economía digital con enfoque territorial.
- Decreto Supremo N° 093-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30254, Ley de Promoción para el uso seguro y responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones por Niños, Niñas y Adolescentes.
- Decreto Supremo N° 016-2020-PCM, Decreto Supremo que amplía los servicios de información en el marco del Decreto Legislativo N° 1246, del Decreto Legislativo N° 1427 y del Plan Nacional de Competitividad y Productividad.

- Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo.
- Decreto Supremo N° 157-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 006-2020, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital
- Decreto Supremo N° 075-2023-PCM, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N°1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital.
- Decreto Supremo N° 085-2023-PCM, que aprueba la Política Nacional de Transformación Digital al 2030.
- Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, que dispone la creación de un Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la Administración Pública.
- Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM, que aprueba disposiciones sobre la conformación y funcionamiento del Comité de Gobierno Digital.
- Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los Lineamientos del Líder de Gobierno Digital.
- Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno y Transformación Digital.
- Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 003-2019-PCM/SEGDI, que dispone la creación del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital del Estado en la Presidencia del Consejo de Ministros.
- Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2021-PCM/SGD, que aprueba la Directiva N° 001-2021-PCM-SGD, Directiva que establece los Lineamientos para la Conversión Integral de Procedimientos Administrativos a Plataformas o Servicios Digitales.
- Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital N° 002-2021-PCM/SGTD, que aprueba la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD, Directiva que regula la generación y uso del Código de Verificación Digital en las entidades de la Administración Pública.
- Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital N° 002-2022-PCM/SGTD, que aprueba la Guía para el uso e integración de la Plataforma Nacional de Firma Digital en las entidades de la Administración Pública.

II.2 Normas de Atención al Ciudadano.

- Ley N° 29904 - Ley de promoción de la Banda Ancha y construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.
- Ley N° 31170, Ley que dispone la implementación de mesas de partes digitales y notificaciones electrónicas.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, en adelante el TUO de la Ley N° 27806.
- Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.
- Decreto Supremo N° 007-2024-JUS que aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

II.3 Normas de Gestión Documental.

- Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales y su modificatoria.
- Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales.

- Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI, que aprueba el Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo N° 1310.
- Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 002-2019-PCM/SEGDI, que aprueba los Estándares de Interoperabilidad de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) y medidas adicionales para su despliegue.

II.4 Normas de Seguridad de la Información.

- Ley N° 27309, Ley que incorpora los delitos informáticos al Código Penal.
- Ley N° 28493, Ley que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado (SPAM).
- Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales.
- Decreto Supremo N° 031-2005-MTC, que aprueba el Reglamento de la Ley que regula el envío del correo electrónico comercial no solicitado (SPAM).
- Decreto Supremo N° 050-2018-PCM, que aprueba la definición de Seguridad Digital en el ámbito nacional.
- Decreto Supremo N° 016-2024-JUS que aprueba el Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales.
- Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana NTP/IEC 27001:2014 Tecnología de la información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos 2ª. edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática.

II.5 Normas de Desarrollo de Software.

- Resolución Ministerial N° 041-2017-PCM, aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2016 – Ingeniería de Software y Sistemas. Proceso de ciclo de vida del software. 3ª Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática.

II.6 Normas de Software Legal en Entidades Públicas.

- Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública.
- Decreto Supremo N° 024-2006-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública.
- Resolución Ministerial N° 073-2004-PCM, que aprueba la Guía para la Administración Eficiente del Software Legal en la Administración Pública.
- Resolución Ministerial N° 139-2004-PCM, que aprueba la Guía Técnica sobre Evaluación de Software para la Administración Pública.

II.7 Normas de Firmas y Certificados Digitales.

- Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales.
- Ley N° 27291, Ley que modifica el Código Civil permitiendo la utilización de los medios electrónicos para la comunicación de la manifestación de voluntad y la utilización de la firma electrónica.
- Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales.

II.8 Normas relacionadas al Ministerio Público.

- Resolución de Fiscalía de la Nación N° 2895-2017-MP-FN, que aprueba la formalización de la política, objetivos y alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) del Ministerio Público.
- Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 4930-2018-MP-FN, N° 909-2021-MP-FN y N° 512-2023-MP-FN, que aprueba la conformación del Comité de Gobierno y Transformación Digital

del Ministerio Público, responsable de dirigir, evaluar y supervisar el proceso de transformación digital de la institución, asimismo asigna el rol de líder a él/la Gerente General, en representación de el/la Fiscal de la Nación.

- Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2169-MP-FN, que aprueba designar al Gerente Central de la Oficina General de Tecnologías de Información como Líder de Gobierno y Transformación Digital del Ministerio Público, en adición a sus funciones.
- Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 442-2025-MP-FN, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio Público 2025.
- Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1852 - 2025-MP-FN, que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2030 Actualizado del Ministerio Público.

III. ENFOQUE ESTRATÉGICO.

El Plan de Gobierno y Transformación Digital del Ministerio Público 2025 – 2027, tendrá como marco el Plan Estratégico Institucional 2023 – 2030 Actualizado del Ministerio Público, aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1852 - 2025-MP-FN de fecha 18 de junio de 2025, el cual se encuentra en concordancia con la Visión País, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 y con las políticas nacionales.

EL MINISTERIO PÚBLICO TIENE COMO MISIÓN INSTITUCIONAL:

“Ejercer la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio; la persecución del delito y la reparación civil, así como velar por la prevención del delito y por la recta administración de justicia, de manera imparcial y eficaz”.

EL MINISTERIO PÚBLICO TIENE COMO VALORES:

Ilustración 1: Valores que promueve el Ministerio Público.




Fuente: Plan Estratégico Institucional 2023-2030 del Ministerio Público.

III.1 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

En el marco de la misión, lineamientos, atribuciones, principios institucionales, así como los demás escenarios de la fase de conocimiento integral de la realidad y el futuro deseado para la entidad. Actualmente, la institución tiene definido cuatro (4) Objetivos Estratégicos Institucionales:

Ilustración 2: Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

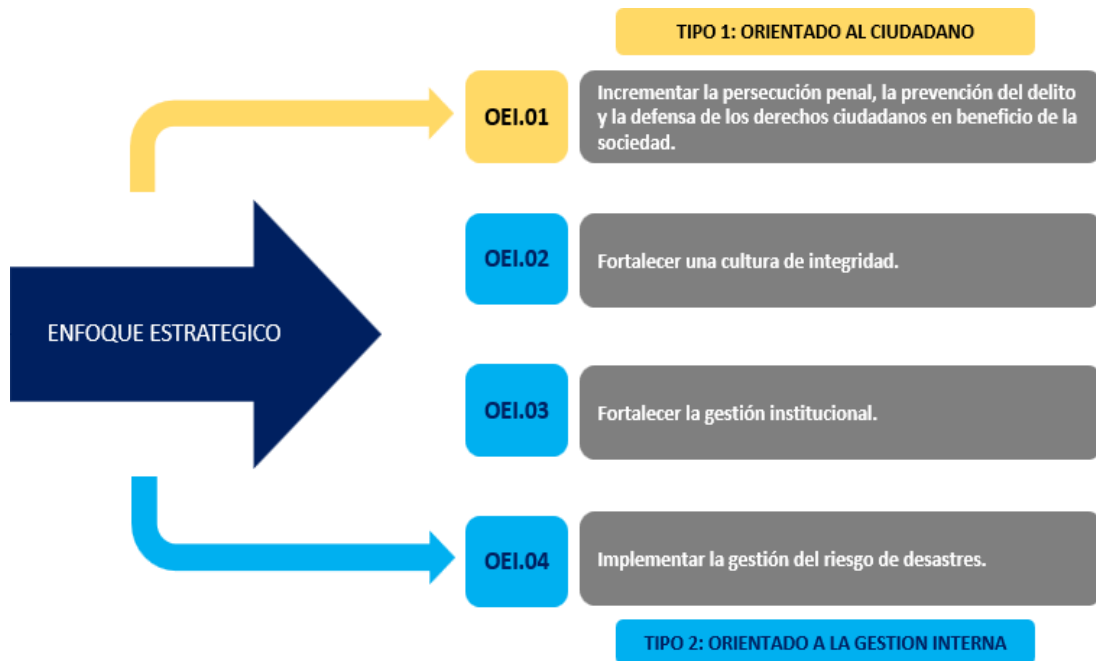

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2023-2030 del Ministerio Público.

Tipo 1: De acuerdo con lo establecido en la “Guía para el planeamiento institucional”, se refiere a la población a la cual sirve la entidad y cuyas condiciones se busca mejorar a través de la entrega y uso de los bienes o servicios provistos.

- OEI 1: Incrementar la persecución penal, la prevención del delito y la defensa de los derechos ciudadanos en beneficio de la sociedad.

Tipo 2: Este tipo de OEI se refiere a las condiciones internas que la entidad busca mejorar o fortalecer; es decir, mejorar sus procesos de soporte o su diseño organizacional para solucionar problemas de gestión u optimizar el uso de sus recursos con la finalidad de atender adecuadamente a su población.

- OEI 2: Fortalecer una cultura de integridad.
- OEI 3: Fortalecer la gestión institucional.
- OEI 4: Implementar la gestión del riesgo de desastres.

Tabla 1: Objetivos Estratégicos Institucionales 2023-2030

Código	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador
OEI 1	Incrementar la persecución penal, la prevención del delito y la defensa de los derechos ciudadanos en beneficio de la sociedad.	Porcentaje de casos fiscales que son resueltos en beneficio de los derechos del ciudadano.
OEI 2	Fortalecer una cultura de integridad.	Porcentaje de funcionarios y servidores del Ministerio Público que demuestran conocimiento de las normas de integridad.
OEI 3	Fortalecer la gestión institucional.	Porcentaje de dependencias con capacidad operativa adecuada.
OEI 4	Implementar la gestión del riesgo de desastres.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones de gestión del Riesgo de Desastres en el Ministerio Público.

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2023-2030 del Ministerio Público.

III.2 Acciones estratégicas institucionales.

En base al planteamiento de los cuatro (04) OEI, en el Ministerio Público se desplegó un total de veintiún (21) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), con la finalidad de programar e implementar el Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual incluye el cumplimiento de la misión institucional.

Una de las acciones estratégicas vinculada al OEI 3: Fortalecer la Gestión Institucional, es la acción estratégica AEI.03.08: Transformación digital progresiva en el Ministerio Público, medida a través de un indicador, tal como se detalla a continuación:

Tabla 2: OEI / AEI Institucionales 2023-2030

Código	OEI / AEI	Nombre del indicador
AEI.03. 08	Transformación digital progresiva en el Ministerio Público.	Porcentaje de sistemas digitales implementados que cumplen con estándares de transformación digital.

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2023-2030 del Ministerio Público.

III.3 Gestión por Procesos.

La Gestión por Procesos es un enfoque organizacional orientado a identificar, analizar, diseñar, implementar y mejorar de manera continua los procesos institucionales, alineándolos con la misión, visión y objetivos estratégicos de la entidad. Este modelo prioriza la eficiencia, la calidad del servicio y la orientación hacia el ciudadano como usuario final.

En el caso del Ministerio Público, la gestión por procesos permite optimizar la forma en que se desarrollan las funciones sustantivas y de soporte, garantizando trazabilidad, transparencia y efectividad en la atención de los servicios de justicia.

Aplicación en el Ministerio Público:

En el marco del Gobierno y Transformación Digital, la gestión por procesos se aplica como un pilar fundamental para transformar y modernizar los servicios institucionales. Sus principales aplicaciones son:

- **Mapeo y estandarización de procesos críticos:** identificación y documentación de procesos sustantivos como la recepción de denuncias, atención a víctimas, gestión de investigaciones fiscales y procesos administrativos internos.
- **Digitalización y automatización:** incorporación de tecnologías digitales (sistemas de gestión, plataformas web, firma digital, interoperabilidad con otras entidades) para reducir tiempos de tramitación y mejorar la trazabilidad de los casos.
- **Interoperabilidad:** integración de los procesos del Ministerio Público con las plataformas de justicia, policía, defensoría y otras instituciones públicas, asegurando un flujo de información seguro, confiable y en tiempo real.
- **Orientación al ciudadano:** rediseño de procesos con foco en la experiencia del usuario, facilitando el acceso digital a servicios como el TUPA, la Mesa de Partes Electrónica, la consulta de expedientes o la programación de citas.
- **Mejora continua:** implementación de indicadores de desempeño y mecanismos de retroalimentación que permitan evaluar la eficiencia y calidad de los procesos, fomentando una cultura institucional de innovación y mejora permanente.

Beneficios esperados:

- Mayor transparencia y trazabilidad de la gestión fiscal y administrativa.
- Reducción de tiempos y costos en la atención de los ciudadanos.
- Homogeneidad y estandarización de procedimientos en todas las sedes del Ministerio Público.
- Incremento en la confianza de la ciudadanía hacia los servicios digitales de justicia.

III.4 Políticas internas vigentes en el ámbito de las tecnologías digitales.

Actualmente la entidad tiene como política interna, el ultimo “**Reglamento Interno para el Acceso y Uso de las Herramientas y Servicios Informáticos en el Ministerio Público**”, el cual fue aprobado el 27 de junio del 2018 con Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 002189-2018-MP-FN.

a) Finalidad

Regular el acceso, uso y seguridad de los recursos informáticos, protegiendo la información institucional y garantizando la continuidad operativa de los servicios digitales.

b) Ámbito de Aplicación

De cumplimiento obligatorio para todo el personal del Ministerio Público y terceros con acceso a sistemas o servicios informáticos.

c) Principios Generales

Uso responsable y ético, protección de la información, respeto a las normas de seguridad digital y prioridad al uso institucional.

d) Derechos y Obligaciones de los Usuarios

Derechos: acceso a sistemas, soporte técnico de la OGTI.

Obligaciones: uso institucional de los recursos, confidencialidad de credenciales, reporte de incidentes, y prohibición de instalar software no autorizado.

e) Prohibiciones

Está prohibido compartir credenciales, instalar software no licenciado, acceder a sitios no institucionales, o manipular información sin autorización expresa.

f) Seguridad Informática

Comprende el control de accesos, auditorías, respaldo seguro de datos, monitoreo de red y reporte obligatorio de incidentes.

g) Responsabilidades de la OGTI

Administrar herramientas tecnológicas, implementar políticas de ciberseguridad, controlar software y capacitar al personal.

h) Sanciones

El incumplimiento constituye falta administrativa y puede conllevar sanciones disciplinarias, civiles o penales, según la gravedad del caso.

i) Disposiciones Finales

El reglamento es de cumplimiento obligatorio desde su aprobación. Las actualizaciones serán comunicadas oficialmente por la OGTI.

En síntesis, este reglamento busca fortalecer la cultura de ciberseguridad y garantizar el uso eficiente, ético y responsable de las herramientas tecnológicas del Ministerio Público, promoviendo la protección de la información y el buen funcionamiento institucional.

Ilustración 3: Caratula Reglamento Interno para el acceso y uso de herramientas y servicios informáticos.



Fuente: Reglamento Interno para el acceso y uso de herramientas y servicios informáticos del MP.

III.5 Políticas o documentos del entorno vigentes.


Transformación Digital en el Perú.

Según la Política Nacional de Transformación Digital (PNTD) al 2030, la transformación digital en el Perú¹ es el proceso continuo, disruptivo, estratégico y de cambio cultural que se sustenta en el uso intensivo de las tecnologías digitales, sistematización y análisis de datos para generar efectos económicos, sociales y de valor para las personas, y se desarrolla a través del Sistema Nacional de Transformación Digital (SNTD).

La PNTD propone el desarrollo de la transformación digital en el Perú a través de cuatro pilares estratégicos y cuatro habilitadores transversales, que permitirán la generación de una sociedad digital, inclusiva y resiliente para mejorar la calidad de vida de las personas en un entorno de confianza digital, a través del uso de herramientas y tecnologías (dinamizadores del modelo).

¹ <https://www.gob.pe/transformaciondigital>

Ilustración 4: Modelo conceptual de la transformación digital.

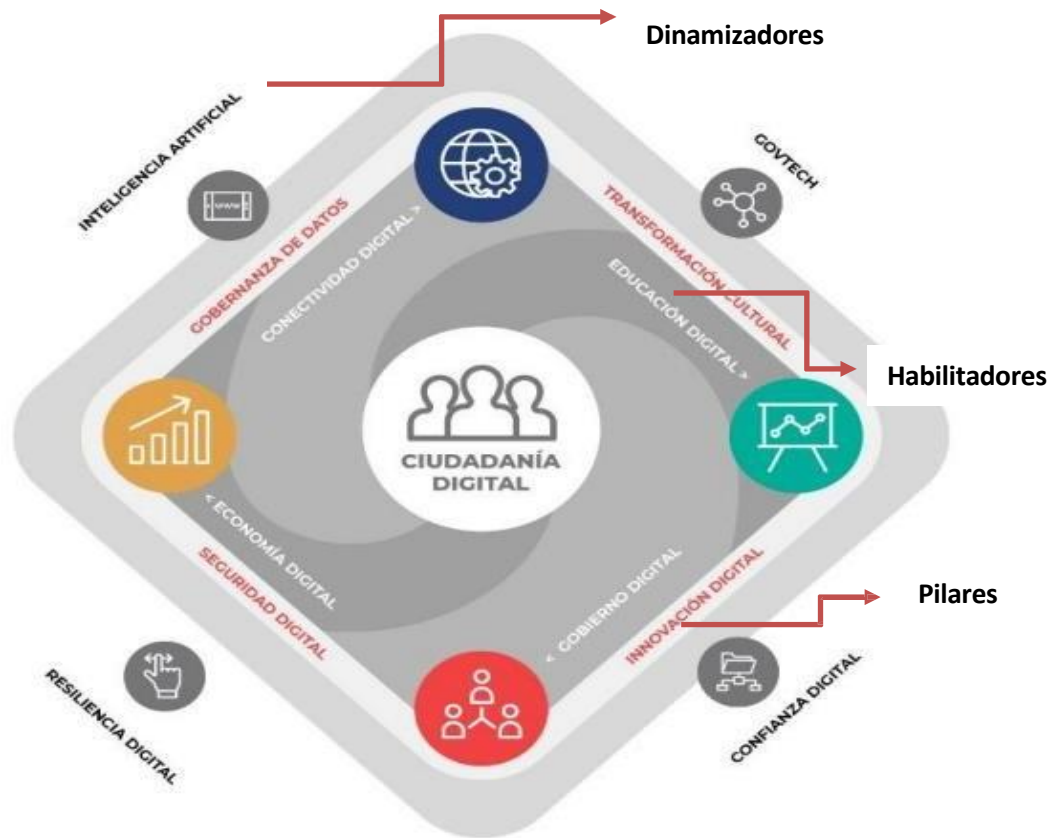

Fuente: Política Nacional de Transformación Digital.

La PNTD² identificó como problema público el **"Bajo ejercicio de ciudadanía digital"**, así como las causas directas e indirectas que la originan, tal como se puede apreciar a continuación:

² <https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/4471543-085-2023-pcm>

Ilustración 5: Modelo del problema público



Fuente: Política Nacional de Transformación Digital.

En correspondencia al problema público enunciado, la PNTD formula seis objetivos prioritarios (OP) para el abordaje:

- OP.1:** Garantizar el acceso inclusivo, seguro y de calidad al entorno digital a todas las personas.
- OP.2:** Vincular la economía digital a los procesos productivos sostenibles del país.
- OP.3:** Garantizar la disponibilidad de servicios públicos digitales inclusivos, predictivos y empáticos con la ciudadanía.
- OP.4:** Fortalecer el talento digital en todas las personas.
- OP.5:** Consolidar la seguridad y confianza digital en la sociedad.
- OP.6:** Garantizar el uso ético y adopción de las tecnologías exponenciales y la innovación en la sociedad.

Ilustración 6: Objetivos prioritarios de la Política Nacional de Transformación Digital.



Fuente: Política Nacional de Transformación Digital.

En ese sentido, la PNTD ha identificado un total de ochenta y dos servicios alineados a cada uno de los objetivos prioritarios; uno de ellos, el servicio **S3.2.6: Carpeta Fiscal Digital interoperable para el sistema de administración de justicia y ciudadanía**, se encuentra alineado al **OP.3: Garantizar la disponibilidad de servicios públicos digitales inclusivos, predictivos y empáticos con la ciudadanía** y la que tiene como ficha del Servicio Identificado la ficha N° 31.

Fuente: Política Nacional de Transformación Digital.

Ilustración 7: Ficha de servicio Identificado para la Carpeta Fiscal Digital.

FICHA DEL SERVICIO IDENTIFICADO 31	
Nombre de la política:	Política Nacional de Transformación Digital
Objetivo prioritario:	OP3. Garantizar la disponibilidad de los servicios públicos digitales inclusivos, predictivos y empáticos con la ciudadanía.
Lineamiento de la política:	3.2 Desplegar la estrategia de gobierno como plataforma de regulación, servicios digitales, datos abiertos e interoperabilidad entre organizaciones públicas y privadas
Nombre del servicio:	S3.2.6 Carpeta fiscal digital interoperable, para el Sistema de Administración de Justicia y ciudadanía
Tipo de servicio:	Mejorado
Descripción del servicio:	La carpeta fiscal digital consiste en custodiar, conservar, trasladar, recomponer y archivar las actuaciones del Ministerio Público en la investigación de un delito. Esta carpeta fiscal comprende la documentación de las actuaciones de la investigación y contiene lo siguiente: (1) la denuncia, (2) el informe policial, de ser el caso, (3) las diligencias de investigación que se hubieran realizado o dispuesto ejecutar, (4) los documentos obtenidos, (5) los dictámenes periciales realizados, (6) las actas levantadas, (7) las disposiciones emitidas, (8) las providencias dictadas, (9) los requerimientos formulados, (10) las resoluciones emitidas por el juez de investigación preparatoria y (11) toda documentación útil a los fines de la investigación. La mejora que aporta la carpeta fiscal digital consiste en la posibilidad que tendrá la ciudadanía, así como las partes, de hacer consultas desde cualquier lugar con disponibilidad de internet, la transparencia en el acceso de información, la reducción de los plazos procesales, un ahorro eficiente de los recursos y el intercambio de información con otras entidades que forman parte del Sistema de Administración de Justicia. Cabe resaltar que el acceso indicado en el párrafo precedente es para las partes de la carpeta fiscal, de conformidad con el artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado con Decreto Supremo N° 021-2019-JUS. Se identifica como información reservada a "las informaciones que impidan el curso de las investigaciones en su etapa policial dentro de los límites de la ley, incluyendo los sistemas de recompensa, colaboración eficaz y protección de testigos, así como la interceptación de comunicaciones amparadas por ley". Debido a ello, es esencial la evaluación del carácter reservado o no de la información antes de brindar el acceso a los posibles solicitantes, lo cual se contemplará en el diseño de dicha carpeta como un requisito previo.
Proveedor del servicio:	PCM - Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, y Ministerio Público - Gerencia General
Receptor del servicio:	Sistema de Administración de Justicia y ciudadanía
Alcance del servicio:	El servicio deberá ser brindado a nivel nacional considerando entre sus componentes los enfoques de interculturalidad y género.
Estándares de cumplimiento:	Interoperabilidad
Descripción del estándar:	Debe destacarse que la información que registra la carpeta fiscal digital es interoperable con diversos sistemas mediante la Plataforma Nacional de Gobierno Digital, lo que se refiere no solo a la posibilidad de intercambiar información sobre el desarrollo de la investigación de un delito, sino también a la capacidad de utilizar la información que ha sido intercambiada, así como a la participación de los juzgados y los fiscales.
Indicador de calidad:	Porcentaje de carpetas fiscales digitales interoperables con el expediente judicial digital
Indicador de cobertura:	Porcentaje de distritos judiciales que han implementado las carpetas fiscales digitales en los procesos de investigación abiertos

Fuente: Política Nacional de Transformación Digital.

Ilustración 8: Ficha de servicio Identificado para la Carpeta Fiscal Digital.





Ilustración 9: Indicadores para la ficha del servicio.

FICHA DEL INDICADOR CALIDAD DEL SERVICIO IDENTIFICADO 31

Nombre de la política:	Política Nacional de Transformación Digital								
Objetivo prioritario:	OP3. Garantizar la disponibilidad de los servicios públicos digitales inclusivos, predictivos y empáticos con la ciudadanía								
Lineamiento de la política:	3.2 Desplegar la estrategia de gobierno como plataforma de regulación, servicios digitales, datos abiertos e interoperabilidad entre organizaciones públicas y privadas								
Nombre del servicio:	83.2.6 Carpeta fiscal digital interoperable para el Sistema de Administración de Justicia y ciudadanía								
Nombre del indicador:	Porcentaje de carpetas fiscales digitales interoperables con el expediente judicial digital								
Justificación:	Este indicador permite cuantificar la proporción del acceso e intercambio de información de los órganos de administración de justicia del Poder Judicial, a través de medios virtuales, a las actuaciones y documentación del proceso de investigación penal que son registrados por el Ministerio Público.								
Responsable del indicador:	Ministerio Público - Gerencia General								
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguna								
Método de cálculo:	Fórmula: $\left(\frac{A}{B}\right) \times 100$ Donde: A: Número de carpetas fiscales digitales interoperables con el expediente judicial digital B: Número de carpetas fiscales digitales								
Sentido esperado del indicador:	Ascendente		Tipo de indicador de servicio:			Calidad			
Fuente y base de datos:	Ministerio Público - Gerencia General, y PCM - Secretaría de Gobierno y Transformación Digital Registros administrativos								
Supuestos:	Se espera una orientación transversal favorable a la vinculación entre la transformación digital y el modelo de desarrollo del país.								
Línea base Logros esperados									
Año	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	0	0	5%	10%	15%	30%	45%	60%	80%

FICHA DEL INDICADOR COBERTURA DEL SERVICIO IDENTIFICADO 31

Nombre de la política:	Política Nacional de Transformación Digital																																								
Objetivo prioritario:	OP3. Garantizar la disponibilidad de los servicios públicos digitales inclusivos, predictivos y empáticos con la ciudadanía																																								
Lineamiento de la política:	3.2 Desplegar la estrategia de gobierno como plataforma de regulación, servicios digitales, datos abiertos e interoperabilidad entre organizaciones públicas y privadas																																								
Nombre del servicio:	83.2.6 Carpeta fiscal digital interoperable para el Sistema de Administración de Justicia y ciudadanía																																								
Nombre del indicador:	Porcentaje de distritos judiciales que han implementado las carpetas fiscales digitales en los procesos de investigación iniciados																																								
Justificación:	Este indicador permite evaluar la tendencia en la implementación progresiva de las carpetas fiscales digitales por los distritos judiciales del país. Se considera que la carpeta fiscal digital ha sido implementada en el distrito judicial, cuando se verifiquen los siguientes supuestos: - Se dispone de conectividad digital permanente y de calidad (acceso a internet). - Se ha implementado previamente la carpeta fiscal electrónica.																																								
Responsable del indicador:	PCM - Secretaría de Gobierno y Transformación Digital																																								
Limitaciones para la medición del indicador:	Que los distritos judiciales que estén ubicados en lugares remotos no reporten la información oportunamente.																																								
Método de cálculo:	Fórmula: $\frac{A}{B} \times 100$ Donde: A: Número de distritos judiciales que han implementado las carpetas fiscales digitales en los procesos de investigación iniciados B: Número de distritos judiciales existentes en el país																																								
Sentido esperado del indicador:	Ascendente		Tipo de indicador de servicio:		Cobertura																																				
Fuente y base de datos:	Ministerio Público - Gerencia General, y PCM-Secretaría de Gobierno y Transformación Digital Registros administrativos																																								
Supuestos:	Se espera una orientación transversal favorable a la vinculación entre la transformación digital y el modelo de desarrollo del país.																																								
<table><tr><th></th><th colspan="2">Línea base</th><th colspan="8">Logros esperados</th></tr><tr><th>Año</th><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><th>Valor</th><td>0</td><td>10%</td><td>15%</td><td>20%</td><td>25%</td><td>30%</td><td>40%</td><td>50%</td><td>60%</td></tr></table>												Línea base		Logros esperados								Año	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Valor	0	10%	15%	20%	25%	30%	40%	50%	60%
	Línea base		Logros esperados																																						
Año	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030																																
Valor	0	10%	15%	20%	25%	30%	40%	50%	60%																																

Fuente: Política Nacional de Transformación Digital

Tendencias.

A partir del análisis del entorno, se identifican las siguientes tendencias a considerar tanto para el diseño de los servicios digitales como para la formulación de proyectos de Gobierno Digital.

Para el diseño de servicios digitales y la formulación de proyectos de Gobierno Digital en el Perú, es clave considerar diversas tendencias tecnológicas, regulatorias y de transformación digital que están marcando la evolución del sector público. A continuación, se detalla las principales tendencias que pueden influir en estos procesos:

Tendencias Tecnológicas y de Innovación en Servicios Digitales.

a) Transformación Digital.

- Fortalecimiento de la Plataforma Nacional de Gobierno Digital (PNGD) y su integración con servicios ciudadanos.
- Uso de interoperabilidad para mejorar la conectividad entre entidades públicas mediante la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE).

b) Digitalización de Trámites y Servicios Electrónicos.

- Avance del Gobierno Cero Papel con la implementación de documentos y firmas digitales.
- Expansión del uso de plataformas de servicios digitales, como la Mesa de Partes Digital y el Sistema de Gestión Documental (SGD).
- Automatización de procesos a través de chatbots y asistentes virtuales para mejorar la atención a los ciudadanos.

c) Identidad Digital y Servicios Personalizados.

- Implementación de la Identidad Digital Nacional, basada en el DNI electrónico y el Sistema Nacional de Identificación Biométrica.
- Uso de inteligencia artificial (IA) y big data para la personalización de servicios públicos.
- Expansión de la carpeta ciudadana digital como repositorio único de información de cada ciudadano.

d) Ciberseguridad y Protección de Datos Personales.

- Aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733) y su impacto en la gestión pública.
- Implementación de políticas de ciberseguridad y certificaciones para garantizar la protección de información gubernamental.
- Expansión del Centro Nacional de Seguridad Digital para la respuesta ante incidentes cibernéticos.

e) Inteligencia Artificial y Analítica de Datos en la Gestión Pública.

- Uso de analítica predictiva para mejorar la toma de decisiones gubernamentales.
- Implementación de IA para la automatización de procesos, reduciendo tiempos de gestión en trámites administrativos.

- Uso de blockchain para garantizar la trazabilidad de documentos e información pública.

Tendencias en la Formulación de Proyectos de Gobierno Digital.

a) Enfoque en la Experiencia del Ciudadano.

- Aplicación de la metodología GovTech para mejorar la prestación de servicios públicos con innovación tecnológica.
- Diseño de servicios digitales centrados en el usuario, con enfoques de experiencia y usabilidad (UX/UI).
- Uso de encuestas y análisis de datos para medir el impacto y mejorar continuamente los servicios digitales.

b) Expansión de la Infraestructura Digital Pública.

- Implementación de redes de conectividad gubernamental para mejorar el acceso a internet en zonas rurales.
- Fortalecimiento del uso de nube gubernamental para reducir costos en almacenamiento y procesamiento de datos.
- Crecimiento de los centros de datos estatales con estándares internacionales de seguridad.

c) Transparencia y Datos Abiertos.

- Fomento de la transparencia gubernamental mediante la publicación de datos abiertos y accesibles a los ciudadanos.
- Creación de plataformas de rendición de cuentas en tiempo real para seguimiento de proyectos públicos.
- Desarrollo de aplicaciones para presupuestos participativos y participación ciudadana en la toma de decisiones.

d) Impulso de la Innovación y la Colaboración Público-Privada.

- Implementación de laboratorios de innovación gubernamental (GovLabs) para desarrollar prototipos de servicios digitales.
- Uso de contratos y licitaciones ágiles para permitir la participación de startups y empresas tecnológicas en proyectos de Gobierno Digital.
- Creación de alianzas con universidades y centros de investigación para impulsar el desarrollo de soluciones digitales.

e) Inclusión Digital y Cierre de Brechas.

- Desarrollo de programas de alfabetización digital para servidores públicos y ciudadanos.
- Ampliación del acceso a banda ancha y servicios móviles en zonas rurales y comunidades alejadas.
- Promoción del uso de servicios digitales accesibles para personas con discapacidad y poblaciones vulnerables.

IV. SITUACIÓN ACTUAL DEL GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL MINISTERIO PÚBLICO.

IV.1 Comité de Gobierno y Transformación Digital (CGTD).

De conformidad a lo establecido en el literal a) del artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, es función del Comité de Gobierno y Transformación Digital formular el Plan de Gobierno y Transformación Digital en coordinación con los órganos, unidades orgánicas, programas y/o proyectos de la entidad.

En ese sentido mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N° 4930-2018 del 31 de diciembre del 2018, se conformó el Comité de Gobierno Digital (CGTD) del Ministerio Público, encargado de dirigir, evaluar y supervisar el proceso de transformación digital de la institución.

El cual fue reconfirmado mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N° 512-2023-MP-FN del 02 de marzo del 2023.

Integrantes:

- El/la Gerente General, en representación del Fiscal de la Nación, quien actuará como Líder de Gobierno Digital.
- El/la Gerente Central de la Oficina General de Tecnologías de la Información.
- El/la Gerente Central de la Oficina General de Potencial Humano.
- El/la Jefe Nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
- El/la Secretario/a Técnico/a de la Secretaría Técnica de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
- El/la Oficial de Seguridad y Confianza Digital.
- El/la Gerente Central de la Oficina General de Planificación y Presupuesto.
- El/la Gerente Central de la Oficina General de Asesoría Jurídica.
- El/la Director ejecutivo de la UE11, Carpeta Fiscal Electrónica.

Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2169 del 15 de julio del 2025, designa al señor Ángel Jimy Espezúa Chalco, gerente central de la Oficina General de Tecnologías de la Información, como Líder de Gobierno y Transformación Digital del Ministerio Público, en adición a sus funciones.

Funciones del Comité de Gobierno y Transformación Digital:

- Formular el Plan de Gobierno y Transformación Digital de la Institución en coordinación con los órganos, unidades orgánicas, programas y/o proyectos.
- Liderar y dirigir el proceso de transformación digital de la institución.
- Evaluar que el uso actual y futuro de las tecnologías digitales sea acorde con los cambios tecnológicos, regulatorios, necesidades, objetivos institucionales, entre otros con miras a implementar el gobierno digital.
- Gestionar la asignación de personal y recursos necesarios para la implementación del Plan de Gobierno y Transformación Digital en el Plan Operativo Institucional, Plan Anual de Contrataciones y otros planes vigentes.

- Promover y gestionar la implementación de estándares y buenas prácticas en gestión y gobierno de tecnologías digitales, interoperabilidad, seguridad digital, identidad digital y datos.
- Elaborar informes anuales que midan el progreso de la implementación del Plan de Gobierno y Transformación Digital y evalúen el desempeño del Modelo de Gestión Documental (MDG), Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en la institución.
- Vigilar el cumplimiento de la normatividad relacionada con la implementación del gobierno digital, interoperabilidad, seguridad de la información y datos abiertos en el Ministerio Público.
- Promover el intercambio de datos de información, software público, así como la colaboración en el desarrollo de proyectos de digitalización interinstitucionales.
- Gestionar, mantener y documentar el Modelo de Gestión Documental (MGD), Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales y Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) de la entidad.
- Promover la conformación de equipos multidisciplinarios ágiles para la implementación de proyectos e iniciativas de digitalización de manera coordinada con los responsables de los órganos y unidades orgánicas de la entidad.
- Otras funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia y aquellas concordantes con la materia.

En ese sentido, el CGTD se constituye como el mecanismo de gobernanza a nivel institucional para el gobierno y transformación digital, responsable de liderar, dirigir, evaluar, supervisar, el uso actual y futuro de las tecnologías digitales en el Ministerio Público, contribuyendo a alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.

IV.2 Cumplimiento de la regulación digital.

A fin de presentar el nivel de cumplimiento de la regulación digital, se muestra el cuadro denominado “Cumplimiento de la regulación digital del Ministerio Público”, elaborado tomando como base la información que proporciona la PCM en su reporte de avances tangibles en los compromisos en materia de gobierno y transformación digital de las entidades públicas³:

Tabla 3: Cumplimiento de la regulación digital del Ministerio Público.

N°	Compromiso	Estado	Observaciones
1	Publicación de la información del Texto Único de Procedimientos Administrativos. (Decreto Legislativo N°1452 que modifica la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General).	Atendido	El TUPA del MP se encuentra publicado en: https://www.gob.pe/institucion/mpfn/informes-publicaciones/992084-tupa-ministerio-publico
2	Mesa de partes digital. (Decreto Supremo N°205-2020-PCM).	Atendido	Se tiene Mesa de Partes Fiscal: Registro de las denuncias electrónicas desde el Portal. https://cfe.mpfn.gob.pe/denuncias-electronicas/

³ <https://www.gob.pe/institucion/pcm/colecciones/4887-entidades-con-mayor-avance-en-gobierno-y-transformacion-digital>, denominado: Entidades con mayor avance en Gobierno y Transformación Digital.



3	Formulación del Plan de Transición al Protocolo IPV6. (Decreto Supremo N°081-2017-PCM).	Atendido	Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2028-2021-MP-FN, prueba el Plan de Transición al Protocolo IPV6 del Ministerio Público.
4	Designación de Funcionario Responsable del Software Público y/u Obligatoriedad de compartir el Software Público. (Decreto Supremo N° 051-2018-PCM).	Atendido	Resolución de Fiscalía de la Nación N° 3831-2018-MP-FN, designa al Gerente Central de la Oficina Central de Tecnologías de la Información como Funcionario Responsable del Software Público del Ministerio Público.
5	Inicio del proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. (Resolución N°003-2023-PCM/SGTD).	Atendido	Resolución de Gerencia General N°1305-2013-MP-FN-GG -Conformación del Comité SGSI.
6	Designación del Oficial de Seguridad y Confianza Digital. (Resolución N°002-2023-PCM/SGTD).	Atendido	Resolución de Gerencia General N°146-2024-GG.
7	Elaboración y aprobación del Plan de Gobierno y Transformación Digital y/o proyectos o Iniciativas (Resolución N°005-2018-PCM/SEGDI).	En proceso	En proceso de elaboración el Plan de Gobierno y Transformación Digital 2025 – 2027.
8	Constitución del Comité de Gobierno y Transformación Digital (Resoluciones N°119-2018-PCM, Resolución N°087-2019-PCM).	Atendido	Resolución de Fiscalía de la Nación 512-2023-MP-FN, que reconfirma el Comité de Gobierno y Transformación Digital del Ministerio Público.
9	Designación del Líder de Gobierno y Transformación Digital (Decreto Supremo N°033-2018- PCM, Resolución N°004-2018-PCM/SEGDI).	Atendido	Resolución de Fiscalía de la Nación N° 4930-2018-MP-FN, mediante el cual se designa al Gerente General, en representación del Fiscal de la Nación, como Líder del Gobierno Digital.
10	Migración y redireccionamiento a GOB.PE (Decreto Supremo N°033-2018- PCM).	Atendido	El Ministerio Público, ha cumplido con incorporar su página web a la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano GOB.PE. https://www.gob.pe/mpfn
11	Realización de la Encuesta Nacional de Activos Digitales del Estado del 2024 (Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412).	Atendido	Se ha cumplido con el diligenciamiento de la Encuesta Nacional de Activos Digitales 2024 – ENAD.
12	Lanzamiento oficial de la estrategia digital de la entidad, y su difusión en medios internos y externos (Decretos Supremos N°118-2018-PCM y N°157-2021-PCM).	Pendiente	Una vez aprobado el Plan de Gobierno y Transformación Digital (PGTD) el siguiente paso en la implementación del Gobierno y Transformación Digital es llevar a cabo la estrategia digital plasmada en dicho plan.
13	Publicación de servicios en la Plataforma Nacional de Interoperabilidad (Decreto Supremo N° 083-2011-PCM).	No corresponde	Teniendo en cuenta que las resoluciones fiscales tienen el carácter de cosa decidida y no de cosa juzgada deviene improcedente la aplicación por parte del Ministerio Público el registro en la plataforma de la PIDE. Además, tal como lo estipula el Código Procesal Penal, la reserva de la investigación penal consiste que el Fiscal tiene la finalidad de guardar y cautelar las actuaciones que se viene realizando dentro de la investigación. Que se consume de la PIDE
14	Incorporación del objetivo estratégico o acción estratégica de transformación digital en el Plan Estratégico Institucional (Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021- PCM).	Atendido	Plan Estratégico Institucional 2023 – 2030. Objetivos Estratégicos Institucionales: Fortalecer la gestión institucional / Acción Estratégica Institucional: Transformación Digital progresiva en el Ministerio Público.

15	Implementación del equipo de respuestas ante incidentes de seguridad digital (Decreto de Urgencia N° 007-2020).	Atendido	Resolución de Gerencia General N°1305-2013-MP-FN-GG, que conforma el Comité de Gestión de la Seguridad de la Información - CGSI, del Ministerio Público.
16	Incorporación de información territorial a la Plataforma Digital Georreferenciada del Estado (Decreto Legislativo N°1412 Ley de Gobierno Digital, Decreto Supremo N° 029- 2021-PCM).	Atendido	El Ministerio Público, ha venido actualizando datos en la Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados Geo Perú, con información del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), Sistema Integrado de Gestión, Registro y Evaluación de Fiscales (SIGREF). https://visor.geoperu.gob.pe/
17	Implementación de herramienta informática de gestión documental o trámite documentario (Decreto Legislativo N° 1310, Resolución N°001-2017-PCM/SEGDI, Decreto de Urgencia 006-2020 y Decreto Supremo N°029-2021-PCM).	Atendido	Resolución de Fiscalía de la Nación N°880-2018-MP-FN. Que declara iniciado el proceso de implementación del Sistema de Gestión Documental – Carpeta Electrónica Administrativa (CEA). En ese sentido, la CEA se constituye como el sistema digital para la gestión de documentos administrativos, que incluye la emisión, recepción y registro de documentos internos y externos en un entorno informático.
18	Inicio del proceso de publicación de datos abiertos en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos (Decreto Supremo N° 016-2017-PCM).	Atendido	El Ministerio Público, ha venido actualizando datos en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, desde el año 2019, del Sistema Nacional de Fiscales, información de Casos Fiscales y Delitos a nivel nacional. https://www.datosabiertos.gob.pe/group/ministerio-p%C3%BAblico-fiscal%C3%ADa-de-la-naci%C3%B3n-mpfn

IV.3 Plan de Gobierno y Transformación Digital 2025 – 2027.

La entidad tuvo un anterior un Plan de Gobierno y Transformación Digital (PGD) correspondientes a los años 2021 -2023, luego correspondía realizar el PGD 2024-2026, pero este no se aprobó, por ello se ha elaborado el correspondiente plan para el periodo 2025-2027.

La relación de proyectos de portafolio de gobierno y transformación digital, se ha ido modificando de acuerdo con las prioridades institucionales del Ministerio Público, en base a la evaluación y valoración aplicada, tomado en cuenta los servicios y procesos de la entidad, establecidos en los documentos de gestión como el Plan Estratégico, donde se establece la misión del Ministerio Público; asimismo, el estado de la infraestructura tecnológica (Software, hardware, servicios, otros), roles y estructuras organizativas para la gestión de las tecnologías digitales, seleccionando los siguientes proyectos los cuales se encuentran alineados a los objetivos de Gobierno Digital.

IV.4 Ranking de E-GOVERNMENT 2024.

Tal como se menciona en el Reporte de E-GOVERNMENT 2024 de la Organización de Naciones Unidas. Dicho reporte destaca que, en la Década de Acción para la Agenda 2030, la ciencia, tecnología e innovación son fundamentales para afrontar los desafíos globales actuales. La digitalización del sector público, en este contexto, es clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y mejorar la eficiencia de los servicios públicos.

El reporte bianual evalúa el despliegue del Gobierno Digital en los países miembros, estableciendo un ranking basado en un índice que analiza los servicios públicos en línea, la infraestructura de telecomunicaciones y la capacidad del capital humano. Este índice sirve como herramienta de benchmarking para acciones de mejora a nivel nacional. Los servicios públicos

considerados prioritarios son salud, educación, empleo, medio ambiente, desarrollo social y, desde 2024, justicia.

Según el reporte, Perú ocupa el puesto 58 de 193 países, mejorando una posición desde 2022. A nivel global, Japón, Australia, Estonia y Singapur lideran el ranking, mientras que en Sudamérica, Uruguay, Chile, Argentina y Brasil muestran un mayor desarrollo en Gobierno Digital.

Los principales países de América según los valores del EGDÍ se enumeran en la figura 10. Los 11 países en el grupo de EGDÍ muy alto incluyen a Estados Unidos, Uruguay y Chile en la categoría V3, seguidos de Argentina, Canadá y Brasil en la categoría V2, y Perú, Costa Rica, México, Ecuador y Colombia en la categoría V1. Cabe destacar que Ecuador, México y Colombia pasaron del grupo de EGDÍ alto al muy alto por primera vez en 2024. La mayoría de los países de la región (20 en total) se ubican en la categoría media del EGDÍ, lo que indica un crecimiento constante en la integración digital a pesar de los desafíos. Belice, Cuba y Honduras, en un nivel relativamente bajo dentro del grupo medio del EGDÍ, aún enfrentan brechas sustanciales en infraestructura digital, servicios en línea y capital humano que requieren atención urgente. Al igual que en 2022, Haití se mantiene en el nivel más bajo del EGDÍ de la región, con crisis políticas y conflictos que socavan gravemente los esfuerzos para crear una infraestructura digital estable y eficaz.

En efecto, si bien el Perú ha demostrado un desarrollo importante a partir del establecimiento e implementación de políticas en la materia, aún se identifican brechas relevantes que cubrir.

Ilustración 10: Ranking de E-GOVERNMENT 2024.

Country	Rating class	EGDI rank	Subregion	OSI	HCI	TII	EGDI 2024)	EGDI (2022)
United States of America	V3	19	Northern America	0.9136	0.8842	0.9605	0.9194	0.9151
Uruguay	V3	25	South America	0.8832	0.8749	0.9437	0.9006	0.8388
Chile	V3	31	South America	0.8612	0.8413	0.9455	0.8827	0.8377
Argentina	V2	42	South America	0.7965	0.9330	0.8425	0.8573	0.8198
Canada	V2	47	Northern America	0.8552	0.8725	0.8078	0.8452	0.8511
Brazil	V2	50	South America	0.9063	0.8077	0.8068	0.8403	0.7910
Peru	V1	58	South America	0.8377	0.7469	0.8364	0.8070	0.7524
Costa Rica	V1	61	Central America	0.7217	0.7877	0.8933	0.8009	0.7659
Mexico*	V1	65	Central America	0.7637	0.7603	0.8310	0.7850	0.7473
Ecuador*	V1	67	South America	0.8851	0.7715	0.6833	0.7800	0.6889
Colombia*	V1	68	South America	0.7521	0.7793	0.8065	0.7793	0.7261

Fuente: ARTÍCULO E-GOVERNMENT 2024

IV.5 Infraestructura Tecnológica: Hardware.

La infraestructura tecnológica del Ministerio Público, está compuesta por diversos elementos que permiten el funcionamiento eficiente de los Sistemas de información entre los cuales están el Hardware, software, redes y comunicación, almacenamiento y gestión de datos y seguridad y protección de la información.

El data center administrado con recursos propios, comprende el alojamiento de servidores físicos y virtuales y los equipos de conectividad, instalación energizada, cableado de red, acceso a internet con mecanismos de seguridad y alta disponibilidad, servicio gestionado de backup, cintoteca y almacenamiento.

IV.5.1 Redes y Comunicaciones.

Data Center

El data center está ubicado en la sede Principal, y es donde se encuentran alojados los servidores físicos y los equipos de conectividad.

Servidores

El Ministerio Público cuenta con 64 servidores físicos y 270 servidores virtuales.

Dispositivos de Red

Se cuenta con 1,837 Switch Acceso, 82 Switch distribución, 2 Switch Core, 645 Switch Acceso PoE, 2 Switch distribución PoE, 703 Routers, 22 Access Point, 3 Firewall físico, 11,000 teléfonos, 2 central telefónica y 1 solución de red y ciberseguridad.

El monitoreo de red es a través de la herramienta Zabbix, que un agente en los servidores para recopilar todos los detalles. Cuenta con diversas opciones de visualización, disponiendo de varios métodos flexibles para el análisis de datos al igual que para crear alertas.

Ilustración 11: Datos de infraestructura tecnológica.

DATOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA				
INFRAESTRUCTURA DE DATOS		MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL DATA CENTER		
Servidores Físicos	64	Descripción	si/no	observacion
Servidores Virtuales	270	Aire acondicionado fan coil	si	
EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE SERVIDORES		UPS	si	solo para 1 tablero estabilizado
Gabinetes		Generador Electrico/ Grupo Electrogeno	si	
Switch		Acceso biométrico y control de visitantes	si	
Central Telefonica		Camaras de vigilancia	no	
Equipo de soluciones de Red y Ciberseguridad		Luces de emergencia	no	
UPS		Detectores de Humo	no	
Estabilizador		Detectores de Temperatura y Humedad	si	con fallas
SEGURIDAD DE PROTECCION DE DATOS		Sistema contra incendios	no	solo extintores
Ciberseguridad		EQUIPAMIENTO DE RED		
Firewall , IDS, IPS, Reporteador, WAF, AntiDDOS		EQUIPOS DE RED		CANTIDAD
CONECTIVIDAD INTERCONEXION DE SEDES		Módems		0
El ancho de banda de interconexion de diferentes rangos de 5M a 25G		Hub		0
Fibra optica	667	Switch Acceso		1837
radioenlace	39	Switch distribución		82
satelitales	24	Swich Core		2
SOFTWARE		Swich Acceso PoE		645
Gestor documental (Alfresco, Laserfiche, otros)		Swich distribución PoE		2
Repositorio digital de archivos		Router		703
Gestión de inventarios y activos fijos		Access point		22
Gestión de Recursos Humanos (asistencia, remuneraciones, licencias, etc.)		Firewall físico		3
Gestion financiera (Recaudación, tesoreria, contabilidad)		Telefonos		11000
Ofimática (Procesador de texto, hojas de calculo, etc.)		Central Telefonica		2
LICENCIAS DE SOFTWARE		Soluciones de Red y Ciberseguridad		1
Sistema Operativo	35235	MONITOREO DE RED		
Lenguaje de programación	1	Si se cuenta - Manage Engine-para los dispositivos de red		
Base de datos	5	Monitoreo de Servidores : Zabbix		
GIS	5	POLITICAS DE SEGURIDAD		
Software de Oficina (Word, Excel, Open Office, etc.	35235	Políticas de relación con proveedores		
Diseño Gráfico	48	Políticas de aplicaciones permitidas		
Software de Seguridad	43	Política de Acceso Remoto		
Virtualización (Vmware, otros)	70	Políticas de copia de seguridad		
Backup	2	Política de Gestión de Riesgos		
PLATAFORMAS TRANSVERSALES UTILIZADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO		Política de continuidad de negocio		
Plataforma digital única del Estado Peruano	Gob.pe	Política de respuesta a incidentes		
Plataforma de registro de visitas		Política de control de acceso		
Plataforma del libro de reclamaciones		Política de uso de Internet		
Plataforma de denuncias	PNDA	Política de Concientización y formación		
Plataforma Nacional de datos abiertos	PNGD	Política de actualizaciones de software		
Plataforma Nacional de Interoperabilidad	PIDE	Política de instalación de software		
Plataforma integral de solicitudes digitales del Estado Peruano	FACILITA	política de auditoria de sistemas		
		Política de seguridad de la red		
		Política de correo electrónico		
		Política de escritorio limpio		

Fuente: Oficina de redes y telecomunicaciones.

IV.5.2 Infraestructura Informática.


Computadoras, Laptops, Scanner, Multifuncionales, Impresoras, Otros.

Los equipos PCs que cuenta el Ministerio Público, se adquieren de acuerdo a la demanda de las unidades orgánicas, según el crecimiento operativo y administrativo, y conforme al presupuesto institucional. Según el último inventario de la Oficina de Tecnologías de la información al 31 de diciembre del 2024, se tienen veintiún mil quinientos doce (21,512) equipos informáticos de escritorio, ocho mil ciento cincuenta y tres (8,153) Laptops, Mil setecientos ochenta y tres (1,783) impresoras de tinta y láser, tres mil trescientos ochenta y ocho (3,388) Multifuncionales, quinientos setenta y un (571) Scanner y Doce (12) fotocopadoras.

El 43% de estos equipos tienen hasta 3 años de antigüedad, 27% tienen entre 4 y 8 años de antigüedad y el 30% de generaciones anteriores con mayores de 9 años de antigüedad.

El inventario actual de los equipos informáticos se muestra en la figura y tabla siguientes:

Ilustración 12: Equipos informáticos.

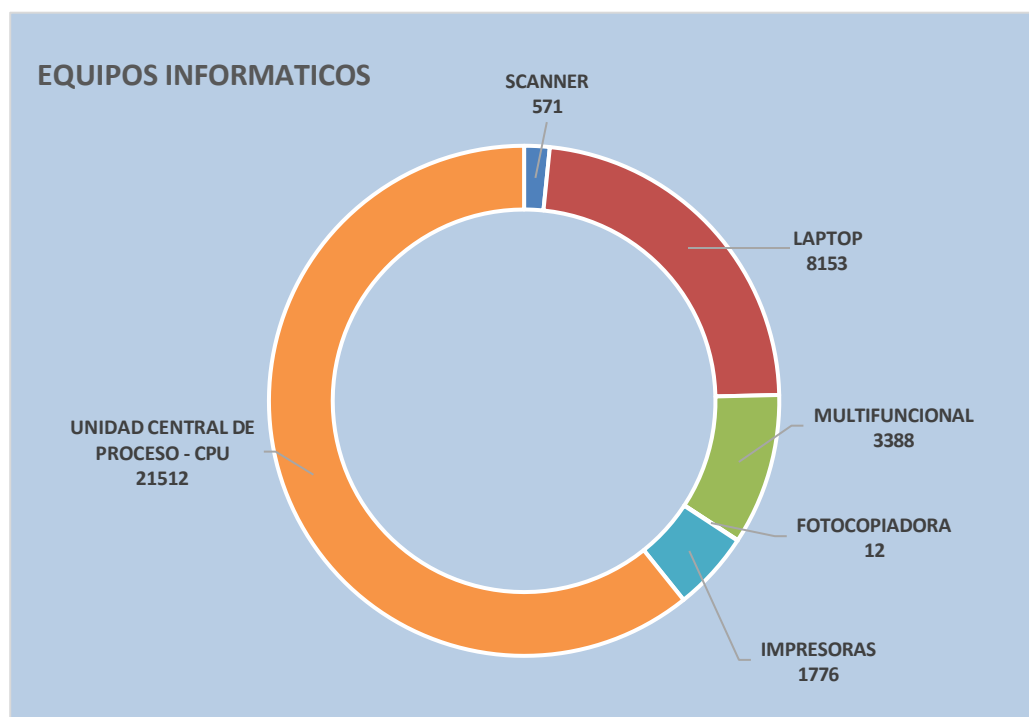


Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 13: Antigüedad de equipos informáticos.

Descripción	Obsolescencia			
	Hasta 3 años de Antigüedad	Entre 4 y 8 años de Antigüedad	Mayor a 9 años de Antigüedad	Total General
CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	128	306	137	571
COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL	5900	1679	574	8153
EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER Y/O FAX	879	1930	579	3388
FOTOCOPIADORA EN GENERAL			12	12
IMPRESORA (OTRAS)	3		4	7
IMPRESORA A INYECCIÓN DE TINTA	39	80	52	171
IMPRESORA DE CÓDIGO DE BARRAS		16	5	21
IMPRESORA DE DISCOS COMPACTOS			1	1
IMPRESORA DE TARJETAS	1			1
IMPRESORA LÁSER	42	187	1296	1525
IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO		4	46	50
IMPRESORA PARA PLANOS - PLOTTERS	1	5	1	7
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	8150	5428	7934	21512
Total general	15143	9635	10641	35419

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 14: Obsolescencia de los equipos informáticos.

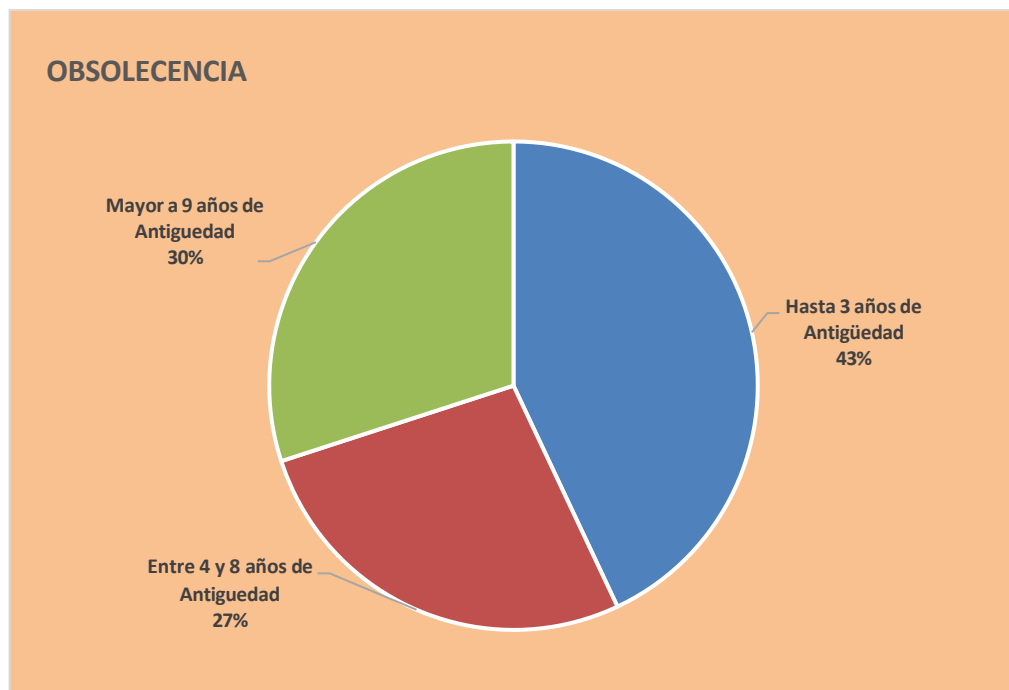

Fuente: Elaboración propia.

IV.6 Conectividad.

A febrero del 2025 el Ministerio Público cuenta con 730 sedes conectadas a nivel nacional y el ancho de banda de interconexión está en diferentes rangos de 5M a 25G

Tabla 4: Tipo de conectividad a nivel nacional

Tipo de Servicio	Sedes
Fibra óptica	667
Radioenlace	39
Satelitales	24

Fuente: Elaboración propia

IV.7 Infraestructura Tecnológica: Software.

La OGTI tiene identificado los diversos tipos de software para las funciones de: Gestor documental, repositorio digital de archivos, gestión de inventarios y activos fijos, gestión de recursos humanos, gestión financiera, ofimática e internet.

Asimismo, se cuenta con 35,235 licencias de software de sistema operativo, 5 de base de datos, 5 de Software GIS, 35,235 de Software de oficina, 48 de diseño gráfico, 43 de Software de seguridad, 70 de virtualización, 1 de lenguaje de programación y 2 de Backup.

IV. 8 Procesos Digitalizados.

Ilustración 15: Mapa de procesos institucional

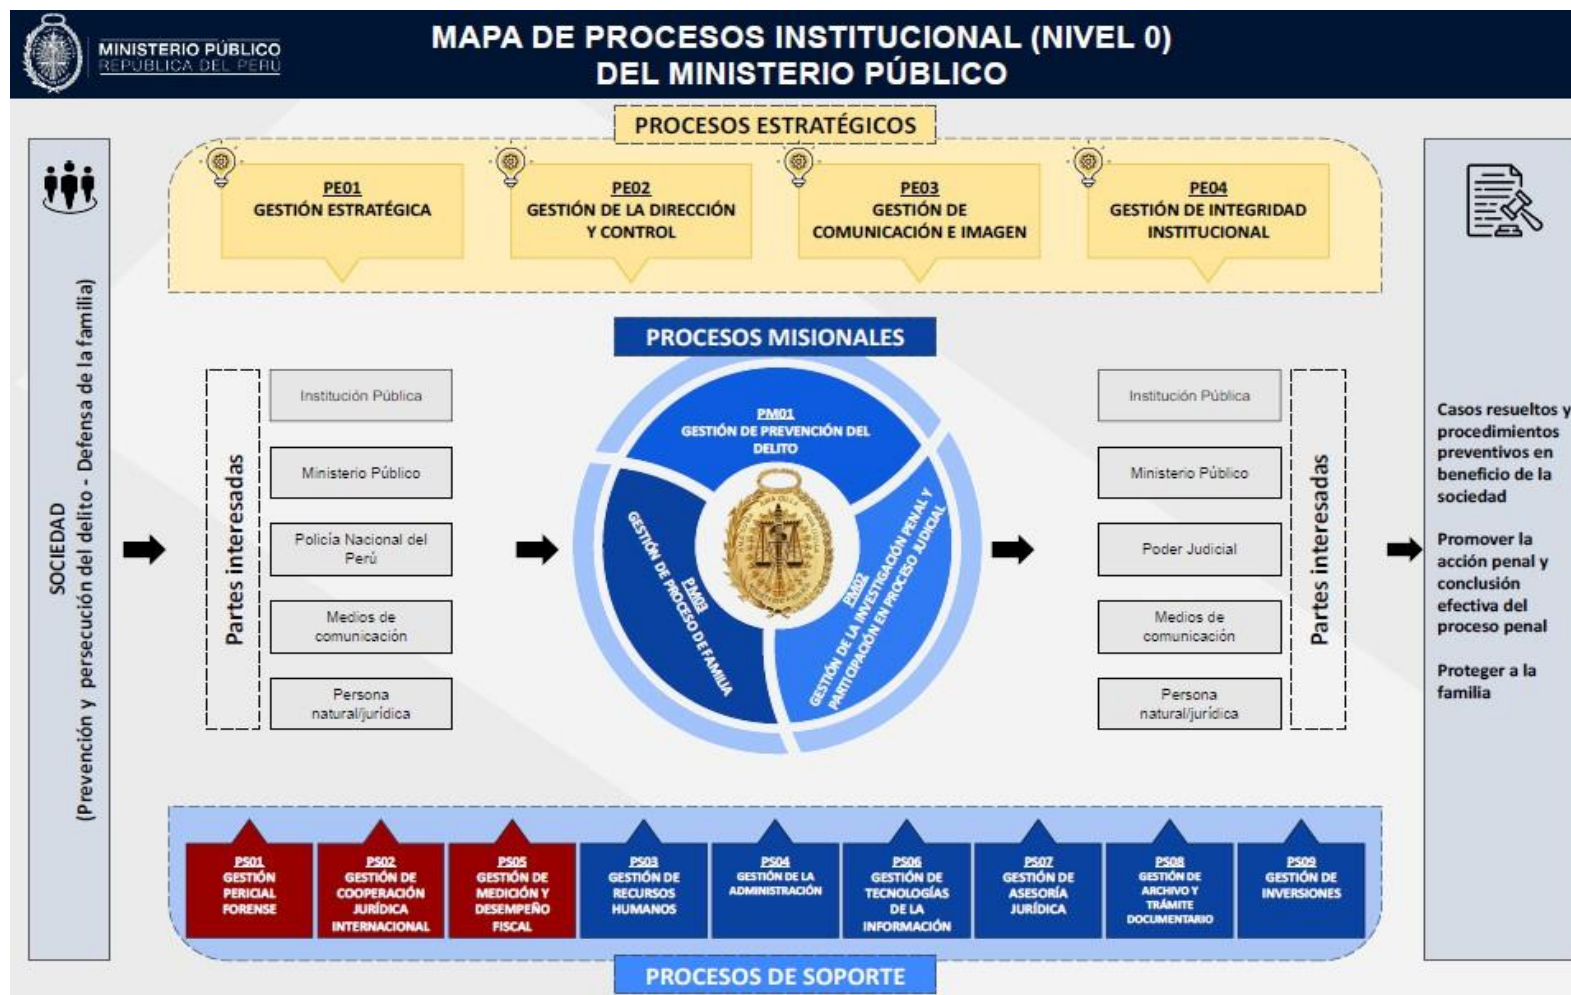


Tabla 5: Matriz de Alineamiento: Gestión por Procesos en el Ministerio Público

Procesos Institucionales	Componentes del Gobierno y Transformación Digital	Aplicación / Herramienta Digital	Beneficios Esperados
Atención de denuncias y casos fiscales	Servicios digitales y ciudadanía digital	Mesa de Partes Electrónica, Registro digital de denuncias	Acceso ágil y remoto, reducción de tiempos de atención, mejora en la trazabilidad de casos.
Protección y atención a víctimas y testigos	Gobernanza de datos e interoperabilidad	Integración con RENIEC, MIMP, PNP y Poder Judicial	Atención integral y coordinada, protección efectiva de víctimas, reducción de duplicidad de trámites.
Gestión de investigaciones fiscales	Transformación y procesos digitales	Sistema de Gestión Carpeta Fiscal Electrónica	Trazabilidad completa de investigaciones, mayor control y transparencia procesal.
Gestión administrativa y de soporte (recursos humanos, logística, presupuesto)	Gobierno de datos y servicios en la nube	Plataformas de gestión administrativa digital, firma digital, interoperabilidad con MEF y SEACE	Optimización de la gestión interna, reducción de carga operativa, mayor transparencia en contrataciones.
Trámite Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)	Servicios digitales y simplificación administrativa	Plataforma digital del TUPA interoperable con el Banco de la Nación	Acceso remoto, reducción de costos y tiempos, pago en línea y seguimiento digital de trámites.
Comunicación y coordinación interinstitucional	Interoperabilidad y seguridad digital	Plataforma de interoperabilidad del Estado (PIDE), firma digital y certificados electrónicos	Flujo seguro y oportuno de información, reducción de duplicidad y errores, decisiones más informadas.
Gestión de la mejora continua y control interno	Innovación digital y analítica de datos	Tableros de control, indicadores en tiempo real, analítica avanzada	Mejora continua, monitoreo de desempeño, fortalecimiento de la rendición de cuentas.




IV. 9 Servicios Digitales

PORTAL INSTITUCIONAL (<https://www.gob.pe/mpfn>):

Portal donde se puede encontrar toda la información referida a la entidad bajo los parámetros y lineamientos de la plataforma del Estado peruano GOB.PE

Ilustración 16: Portal Ministerio Publico.

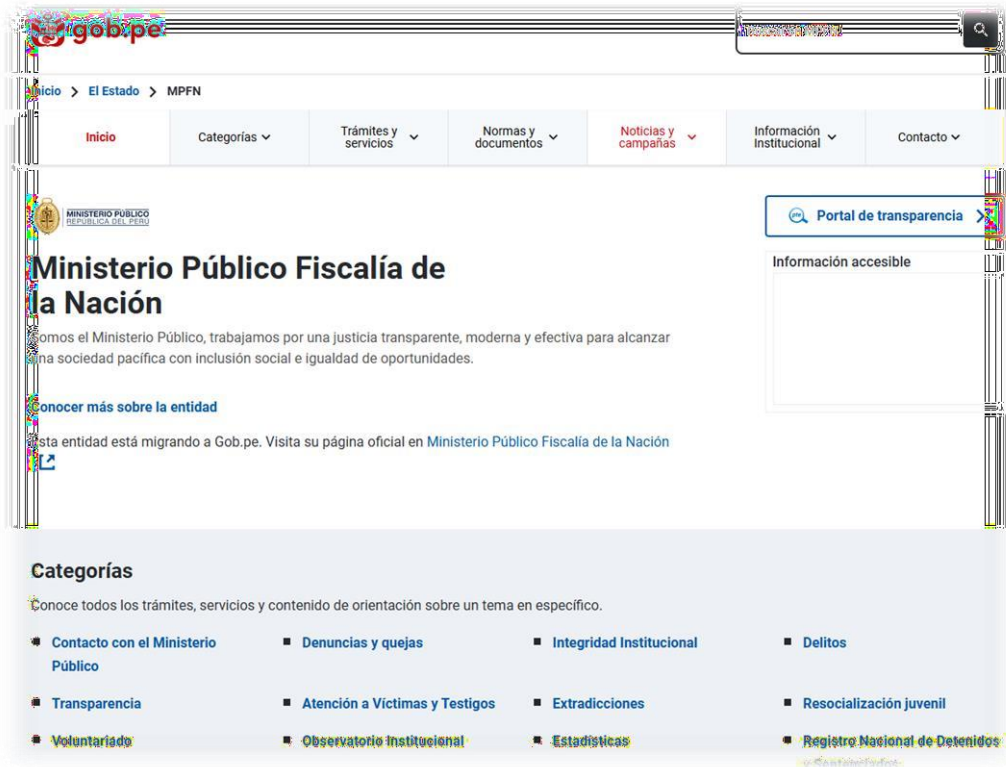

MESA DE PARTES VIRTUAL:

Permite que los ciudadanos envíen documentos al Ministerio Público sin acudir físicamente. Hay distintas mesas de partes virtuales: en los distritos fiscales de Lima (Centro, Norte, Sur) y en la Secretaría General del MP.

Ilustración 17: Mesa de Partes Electrónica.

Ministerio Público

Bienvenido a la Mesa de Partes Electrónica

Aquí usted podrá presentar documentos y denuncias de hechos que ocurrieron en los distritos de: Barranco, Breña, Jesús María, La Victoria, Lima (Cercado), Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, Rimac, San Borja, San Isidro, San Luis, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo, correspondientes al Distrito Fiscal de Lima; y de las jurisdicciones de: Ventanilla, Mi Perú, Santa Rosa, Ancón y Puente Piedra pertenecientes al Distrito Fiscal de Lima Noroeste.

MP
MESA DE PARTES
ELECTRÓNICA

Puedes realizar tu denuncia y presentar tus documentos como:

 CIUDADANO(A)

 POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

 PODER JUDICIAL

 ENTIDAD (P. JURÍDICA / PROCURADURÍA / CEM)

Fiscalía Provincial Penal

Si el delito tiene relación con robo, hurto, estafa, usurpación, apropiación ilícita y otros.

[Realiza tu denuncia](#)

[Presentar documentos \(Casos Excepcionales\)](#)

Fiscalía de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar

Si el delito tiene relación con violación sexual, actos contra el pudor, violencia contra la mujer, acoso sexual, lesiones y otros.

[Realiza tu denuncia](#)

[Presentar documentos \(Casos Excepcionales\)](#)



- [Guía Rápida](#)
- [Guía - Presentar Denuncia](#)
- [Guía - Presentar Documentos](#)
- [Videotutorial](#)

Fiscalía especializada en Materia ambiental de Lima

Puedes realizar su denuncia sobre delitos como contaminación, residuos sólidos, tráfico ilegal de residuos

Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Trata de Personas de Lima

Puedes realizar su denuncia sobre

Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y Propiedad Intelectual

Puedes realizar su denuncia sobre delitos como

Ilustración 18: Mesa de partes Secretaria General de la Fiscalía de la Nación.

 **MINISTERIO PÚBLICO**
FISCALÍA DE LA NACIÓN

MESA DE PARTES VIRTUAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN

[Descargar Manual de Usuario](#) [Ver Video Tutorial](#) [Ver Política de Calidad de la SEGFIN](#)

DESTINATARIO

DESTINATARIO DEL DOCUMENTO (*) [--SELECCIONE--](#)


NOTA: PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS A OTROS DESPACHOS FISCALES U ÓRGANOS DEL MINISTERIO PÚBLICO DEBERÁ REALIZARLO DIRECTAMENTE POR MEDIO DE SUS MESAS DE PARTES O CORREOS ELECTRÓNICOS. [CLICK AQUÍ](#)

DATOS DEL REMITENTE

PERSONA(*) NATURAL TIPO DE DOCUMENTO(*) DNI N°DOC(*) N°FO DE DOCUMENTO

PARA VALIDACIÓN DE DATOS INGRESE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN (*)

FECHA NAQ(*) dd/mm/aaaa UBIGEO(*) 0000000




DNI ELECTRÓNICO **DNI AZUL**

CODIGO CAPTCHA(*)  INGRESE CAPTCHA(*) INGRESAR CAPTCHA [Validar](#)

AP. PATERNO(*) APELLIDO PATERNO

AP. MATERNO(*) APELLIDO MATERNO



SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE DENUNCIAS:

Puedes consultar en línea en qué estado se encuentra una denuncia presentada al MP.

Ilustración 19: Pagina Web de Seguimiento de Denuncias.

portal.mpf.gov.pe/seguimiento-de-denuncias

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS

☒ DNI
☐ CARNÉ DE EXTRANJERÍA

N° Documento:

Año de Registro de la denuncia: 2025

Consultar Cancelar

NOTA: Si su denuncia ha sido registrada antes del 8 de Agosto del 2015 marque la siguiente casilla ☐

Descargar Manual

Línea Gratuita para Informes y denuncias : 0800 - 00 - 205

DENUNCIA VIRTUAL:

Los ciudadanos pueden presentar denuncias por delitos desde la web, mediante el registro de denuncias por web del MP.

Ilustración 20: Pagina Denuncias WEB.

portal.mpf.gov.pe/denuncias-en-linea

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DEL PERÚ

Bienvenido al portal de denuncias

A través de esta plataforma digital, puedes reportar los hechos y registrar tu denuncia desde cualquier lugar del país. Reafirmamos nuestro compromiso con el acceso oportuno, seguro y eficiente a la justicia para todos los ciudadanos.

Para el caso de Extranjeros
Podrá realizar su denuncia mediante un abogado y/o apoderado de nacionalidad peruana.

¡Importante!
Si el hecho que pretendes denunciar ocurrió en las últimas horas y existe flagrancia (se tiene un detenido) por favor acércate a presentarla inmediatamente a la comisaría más cercana o a la fiscalía de turno.

Línea gratuita para informes y denuncias: 0800-00-205

Primero, completa estos datos para empezar con el registro de tu denuncia.

¡IMPORTANTE! Recuerda seleccionar el departamento, provincia y distrito donde ocurrió el hecho que quieres denunciar.

DEPARTAMENTO
LIMA

PROVINCIA
SELECCIONAR

DISTRITO
SELECCIONAR

FISCALÍA ESPECIALIZADA



Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad (RENAESPPE):

Portal web para consultar la situación jurídica de personas que han sido detenidas o sentenciadas con pena privativa de libertad, con datos como fecha de detención, delitos, establecimiento penal, etc.

Ilustración 21: Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad.

The screenshot shows the web portal for RENAESPPE (Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad). The browser address bar shows 'portal.mpf.n.gob.pe/consultarena'. The page header includes the logos of RENAESPPE and the Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. The main heading is 'CONSULTA DETENIDOS'. Below this, a text block explains the service: 'RENAESPPE pone a su disposición el servicio "CONSULTE SU DETENIDO", donde usted podría hacernos llegar sus consultas sobre personas posiblemente detenidas, deberá ingresar los datos que se le solicitan obligatoriamente para luego de validarlos dar respuesta a su consulta al correo electrónico que nos indica.' (Todos los datos deben de ser obligatorios). The form is divided into two sections: 'Datos del Solicitante' and 'Consulta sobre la persona'. The 'Datos del Solicitante' section includes fields for Tipo de Documento (D.N.I.), Nro. de Documento, Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres, Fecha Nacimiento, País de Nacimiento (PERU), Ciudad de Nacimiento (Lima), Email, Relación (Seleccione Relación), País (PERU), and Ciudad (Lima). The 'Consulta sobre la persona' section includes fields for Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres, Lugar de Referencia, and Motivo de la consulta (Obligatorio). A text area for the consultation is at the bottom right.

Convoca

Plataforma digital del Ministerio Público (MP) donde se publican las convocatorias de empleo y donde los interesados pueden postular en línea a puestos de trabajo en la institución, como vacantes CAS (Contratos Administrativos de Servicios) o plazas para otras modalidades de contratación.



Ilustración 22: Pagina WEB para convocatorias de empleo.

UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO FISCAL	RÉGIMEN LAB	CONVOCATORIA	FECHA PUBLICACIÓN	FECHA POSTULACIÓN	ANEXOS	ESTADO	CARGO(S)
GERENCIA GENERAL	DISTRITO FISCAL DE CAÑETE	CAS	CONVOCATORIA CAS N° 138 - 2025 CAS N° 138-2025-MP-FN-GG-PJFS-DF-CAÑETE (DETERMINADO (NECESIDAD TRANSITORIA) CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DIEZ (10) PERSONAS PARA EL DISTRITO FISCAL DE CAÑETE	02/10/2025	Del 17/10/2025 08:00:00 al 17/10/2025 16:00:00	Anexos	Vigente	Ver Cargo(s)
GERENCIA GENERAL	DISTRITO FISCAL DE ANCASH	DL 728 (Suplencia)	CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 728 N° 48 - 2025 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL RÉGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 728 POR LA MODALIDAD DE SUPLENCIA PARA CUBRIR COTAS (10) PLAZAS DEL DISTRITO FISCAL DE ANCASH	02/10/2025	Del 17/10/2025 08:00:00 al 17/10/2025 16:00:00	Anexos	Vigente	Ver Cargo(s)

Portal Estadístico

Esta plataforma muestra la información que elabora nuestra Oficina de Datos Estadísticos nuestra institución, Dashboard de datos con respecto a los delitos, fiscalías, casos, fiscales y todas las publicaciones que se han venido emitiendo mes a mes.

Ilustración 23: Pagina WEB de ORACE para mostrar estadísticas relevantes del Ministerio Publico.

Portal Estadístico

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DEL PERÚ

ORACE

INICIAR SESIÓN

INICIO NOSOTROS SUBGERENCIA DE ESTADÍSTICA PRODUCTIVIDAD FISCAL OBSERVATORIO DE CRIMINALIDAD RENDESPIE

ESTADÍSTICAS
DASHBOARDS
PUBLICACIONES
REPOSITORIO

ANUARIOS
BOLETINES
INFORMES
INFOGRAFÍAS

Ministerio Público - Fiscalía de la Nación
Av. Abancay Cda 5 s/n (Sede central en Lima) - Perú

Central Telefónica: 435 5555
Línea Gratuita: 8-800-00 205

IV.10 Seguridad de la Información.

Por la naturaleza especializada de Seguridad de la Información, es la encargada de proporcionar recomendaciones a las diversas unidades orgánicas sobre el tratamiento a la información y su flujo. Sus funciones están enmarcadas en buenas prácticas como la NTP ISO/IEC 27001:2014, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, NTP 37001, Sistema de Gestión Anti Soborno, Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y la RCG N° 014604-20179-CG, Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Implementación del Sistema de Control Interno, todas estas tienen requisitos en materia de Seguridad de la Información, teniendo las siguientes actividades principales:

- Monitoreo y Auditoría de Seguridad de la Información. De forma trimestral en conjunto con las diversas unidades orgánicas se verifica el estado de los controles organizativos, técnicos y legales, generando índices de riesgos tecnológicos y operaciones.
- Gestión del Riesgo de Seguridad de la Información. Se trabaja con diversas unidades orgánicas y a nivel Institucional para identificar y tratar los riesgos con componentes de riesgos operativos, tecnológicos, corrupción y de cumplimiento.
- Incidentes de Seguridad de la Información. Se realiza la investigación interna de los casos de fuga de información Institucional e identifica situaciones en que la Institución puede ser víctima de delitos informáticos, con el objetivo de generar acciones correctivas y canalizar para la sanción de los responsables.
- Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Busca preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información aplicando un proceso de gestión de riesgos, manteniendo alineación estratégica institucional.

IV. 1Presupuesto

Para el Plan de Gobierno y Transformación Digital que se ha elaborado, se toma como punto de referencia el Presupuesto Institucional Modificado – PIM del año 2024.

Ilustración 24 : PIM del año 2024

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,295,903
ACTIVOS INTANGIBLES	303,740
SOFTWARES	302,760
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	980
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	18,300,908
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	30,291
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES PARA OFICINA	5,084,163
	13,186,454
CONTRATACION DE SERVICIOS	36,613,864
LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	1,330,200
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	5,230,759
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	208,785
SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	29,830,706
VIAJES	13,414
COMPRA DE BIENES	8,454,103
REPUESTOS Y ACCESORIOS	38,396
MATERIALES Y UTILES	8,415,707
	71,968,518

V. OBJETIVOS DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL MINISTERIO PÚBLICO.

V.1 Desafíos del Gobierno y Transformación Digital.

Para identificar los objetivos de Gobierno y Transformación Digital, fue necesario determinar los desafíos de la Entidad para el desarrollo del Gobierno y Transformación Digital. Bajo este contexto, se consideran cuatro (4) desafíos de los siete (7) sugeridos por los lineamientos para la formulación del PGD; estos son:

Desafío 2: Asegurar la generación de beneficios para la entidad en base a las inversiones de tecnologías digitales.

El Ministerio Público debe garantizar que las inversiones en tecnologías digitales se traduzcan en beneficios concretos que fortalezcan su función constitucional de defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y la lucha contra el delito.

Esto implica que las soluciones tecnológicas apoyen la digitalización de procesos fiscales, administrativos y de soporte, contribuyendo al ahorro de recursos, reducción de tiempos de atención, mejora de la productividad institucional, fortalecimiento de la transparencia y generación de información de calidad para la toma de decisiones estratégicas.

Alinear las inversiones digitales con los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2023-2030 del Ministerio Público, promoviendo el uso eficiente de recursos públicos y la sostenibilidad de las soluciones tecnológicas implementadas.

Desafío 3: Asegurar que la experiencia del ciudadano con los servicios digitales sea plena y satisfactoria.

El Ministerio Público debe garantizar que los ciudadanos, víctimas, testigos y demás usuarios accedan a sus servicios digitales de manera simple, rápida y segura.

Mejorar la experiencia digital de los ciudadanos a través de portales, aplicativos y servicios en línea centrados en el usuario, accesibles e inclusivos; y al mismo tiempo, fortalecer la experiencia del usuario interno mediante soluciones interoperables, capacitación digital y herramientas colaborativas.

Desafío 4: Digitalizar servicios.

El Ministerio Público requiere avanzar hacia la digitalización de principio a fin de sus servicios más demandados —tanto administrativos como fiscales— asegurando la trazabilidad, integridad y disponibilidad de la información.

Esto incluye la automatización de procesos, implementación de sistemas interoperables, uso de firma digital, expedientes electrónicos, notificaciones digitales y mecanismos de atención virtual, con especial enfoque en la descentralización y cobertura nacional.

Digitalizar los servicios institucionales priorizando aquellos de mayor impacto ciudadano (mesa de partes digital, atención a víctimas, denuncias en línea, gestión documental y sistemas de investigación fiscal), garantizando su accesibilidad en todas las sedes del país.

Desafío 7: Asegurar que la infraestructura tecnológica brinde flexibilidad, escalabilidad e interoperabilidad.

El proceso de transformación digital del Ministerio Público exige una infraestructura tecnológica moderna, segura y escalable que soporte el incremento de servicios digitales, la gestión de grandes volúmenes de datos y la interoperabilidad con otras entidades del Estado.

Asimismo, se requiere fortalecer los centros de datos, redes, servicios en la nube, mecanismos de respaldo, continuidad operativa y ciberseguridad institucional.

Implementar una infraestructura tecnológica integral y resiliente que garantice la continuidad del servicio fiscal y administrativo, soporte la interoperabilidad con plataformas nacionales (RENIEC, PNP, Poder Judicial, etc.) y responda a las demandas crecientes de la transformación digital.

V.2 Objetivos de Gobierno y Transformación Digital.

Las capacidades de la infraestructura tecnológica de la entidad deben ser suficientes para asegurar la flexibilidad, escalabilidad e interoperabilidad de las soluciones o servicios públicos que se desarrollen sobre ella.

El presente Plan define cuatro Objetivos de Gobierno y Transformación Digital (OGTD), definidos en base al Plan Estratégico Institucional 2023-2030 del Ministerio Público, destinados a mejorar la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad de los servicios que ofrece el Ministerio Público para satisfacción de los ciudadanos.

Ilustración 25: Objetivos de Gobierno y Transformación Digital



Ilustración 26: Dimensiones versus objetivos de Gobierno y Transformación Digital



Tabla 6: Proyectos y Objetivos de Gobierno y Transformación Digital

N°	Código Proy.	ÁREA	OBJETIVOS DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION	NOMBRE DEL PROYECTO	DESAFIO	OBJETIVOS DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL
1	MP-PGD-008	OGTI	OGTD3	Implementación de Carpeta Fiscal Electrónica (con sus respectivos componentes).	#2. Valor y Sostenibilidad de las Inversiones.	Garantizar que las inversiones en tecnologías digitales generen beneficios medibles en eficiencia, productividad, ahorro y valor público.
2	MP-PGD-010	OGTI	OGTD3	Servicio de Interconexión de la Red de Comunicaciones para las Sedes del Ministerio Público a Nivel Nacional (Red WAN).	#2. Valor y Sostenibilidad de las Inversiones.	Garantizar que las inversiones en tecnologías digitales generen beneficios medibles en eficiencia, productividad, ahorro y valor público.
3	MP-PGD-011	OGTI	OGTD3	Implementación del Sistema de Respaldo de Datos (Backup), Resguardo de Información y Continuidad del Negocio.	#2. Valor y Sostenibilidad de las Inversiones.	Garantizar que las inversiones en tecnologías digitales generen beneficios medibles en eficiencia, productividad, ahorro y valor público.
4	MP-PGD-021	OGTI	OGTD2	Mejoramiento y Renovación de Equipos Multifuncionales por Obsolescencia.	#7. Infraestructura Tecnológica Resiliente.	Implementar una infraestructura tecnológica que soporte adecuadamente el proceso de transformación digital y servicios digitales.
5	MP-PGD-004	IML	OGTD3	Implementación de equipos de sala de entrevista única (10 sala).	#2. Valor y Sostenibilidad de las Inversiones.	Garantizar que las inversiones en tecnologías digitales generen beneficios medibles en eficiencia, productividad, ahorro y valor público.
6	MP-PGD-012	OGTI	OGTD2	Fortalecimiento y Renovación de la Infraestructura de Servidores y Software Base.	#7. Infraestructura Tecnológica Resiliente.	Implementar una infraestructura tecnológica que soporte adecuadamente el proceso de transformación digital y servicios digitales.
7	MP-PGD-013	OGTI	OGTD2	Repotenciación de Servidores para Servicios Institucionales.	#7. Infraestructura Tecnológica Resiliente.	Implementar una infraestructura tecnológica que soporte adecuadamente el proceso de transformación digital y servicios digitales.
8	MP-PGD-019	OGTI	OGTD2	Modernización de equipamiento de cómputo para optimizar los servicios administrativos y operativos de la Fiscalía de la Nación.	#7. Infraestructura Tecnológica Resiliente.	Implementar una infraestructura tecnológica que soporte adecuadamente el proceso de transformación digital y servicios digitales.
9	MP-PGD-014	OGTI	OGTD3	Implementación de Ventilación en los Cuartos de Telecomunicaciones en Lima (Aires Acondicionados).	#2. Valor y Sostenibilidad de las Inversiones.	Implementar una infraestructura tecnológica que soporte adecuadamente el proceso de transformación digital y servicios digitales.
10	MP-PGD-015	OGTI	OGTD3	Implementación de Sistemas de Control de Acceso, Videovigilancia para el Centro de Datos.	#2. Valor y Sostenibilidad de las Inversiones.	Implementar una infraestructura tecnológica que soporte adecuadamente el proceso de transformación digital y servicios digitales.
11	MP-PGD-016	OGTI	OGTD3	Fortalecimiento de la Interconexión Inalámbrica (WLAN) para Sedes de Lima Centro.	#2. Valor y Sostenibilidad de las Inversiones.	Garantizar que las inversiones en tecnologías digitales generen beneficios medibles en eficiencia, productividad, ahorro y valor público.
12	MP-PGD-009	OGTI	OGTD1	GEOFISCAL (Sistema de Georreferenciación para toma de decisiones: Fiscalías especializadas).	#4. Digitalización de Procesos y Servicios.	Gestionar la digitalización integral de los procesos, servicios e información de nuestra entidad.

N°	Código Proy.	ÁREA	OBJETIVOS DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION	NOMBRE DEL PROYECTO	DESAFIO	OBJETIVOS DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL
13	MP-PGD-022	OGTI	OGTD3	Mejoramiento y Estabilización del Suministro Eléctrico para Equipos Informáticos.	#2. Valor y Sostenibilidad de las Inversiones.	Implementar una infraestructura tecnológica que soporte adecuadamente el proceso de transformación digital y servicios digitales.
14	MP-PGD-005	IML	OGTD1	Implementación de un Sistema de Agenda Fiscal para Cámara Gesell.	#4. Digitalización de Procesos y Servicios.	Gestionar la digitalización integral de los procesos, servicios e información de nuestra entidad.
15	MP-PGD-006	IML	OGTD1	Integración de sistemas fiscales con sistemas médico legales.	#4. Digitalización de Procesos y Servicios.	Gestionar la digitalización integral de los procesos, servicios e información de nuestra entidad.
16	MP-PGD-001	FEMA	OGTD1	Sistema de análisis de información de imágenes generadas por los drones de la entidad (Sistema IA-DRON).	#4. Digitalización de Procesos y Servicios.	Gestionar la digitalización integral de los procesos, servicios e información de nuestra entidad.
17	MP-PGD-023	OGTI	OGTD3	Servicio de Mantenimiento Constante y Suministro de Consumibles para Multifuncionales-Escáner a Nivel Nacional.	#2. Valor y Sostenibilidad de las Inversiones.	Garantizar que las inversiones en tecnologías digitales generen beneficios medibles en eficiencia, productividad, ahorro y valor público.
18	MP-PGD-007	OGFIN	OGTD4	Implementación de la Plataforma de Servicios TUPA Digital del Ministerio Público.	#3. Experiencia del Ciudadano.	Asegurar que los servicios digitales del Ministerio Público sean accesibles, operables y centrados en las necesidades de los ciudadanos.
19	MP-PGD-024	OGTI	OGTD1	Implementación de App para la Gestión y Archivo de Documentos Fiscales.	#4. Digitalización de Procesos y Servicios.	Gestionar la digitalización integral de los procesos, servicios e información de nuestra entidad.
20	MP-PGD-003	IML	OGTD4	Sistema de Gestión de Espera por Tickets (34).	#3. Experiencia del Ciudadano.	Asegurar que los servicios digitales del Ministerio Público sean accesibles, operables y centrados en las necesidades de los ciudadanos.
21	MP-PGD-017	OGTI	OGTD1	Implementación de un Sistema de Gestión de Servicios Tecnológicos (Mesa de Ayuda).	#4. Digitalización de Procesos y Servicios.	Gestionar la digitalización integral de los procesos, servicios e información de nuestra entidad.
22	MP-PGD-020	OGTI	OGTD1	Implementación de un Chatbot para la Mesa de Ayuda de TI.	#4. Digitalización de Procesos y Servicios.	Gestionar la digitalización integral de los procesos, servicios e información de nuestra entidad.
23	MP-PGD-018	OGTI	OGTD1	Sistema de Gestión de Inventario del Parque Informático.	#4. Digitalización de Procesos y Servicios.	Gestionar la digitalización integral de los procesos, servicios e información de nuestra entidad.
24	MP-PGD-002	IML	OGTD1	Sistema de Inventario de Insumos Químicos.	#4. Digitalización de Procesos y Servicios.	Gestionar la digitalización integral de los procesos, servicios e información de nuestra entidad.

Tabla 7: Objetivos de Gobierno y Transformación Digital

Código	Objetivo	Indicador	Método de cálculo	Meta			Frecuencia
				2025	2026	2027	
OGTD1	Gestionar la digitalización integral de los procesos, servicios e información de nuestra entidad. Desafío 4	Porcentaje de servicios digitalizados implementados.	(Número de servicios digitalizados implementados en el año/ Total de servicios digitalizados programados) x 100	22%	67%	100%	Anual
OGTD2	Implementar una infraestructura tecnológica que soporte adecuadamente el proceso de transformación digital y servicios digitales. Desafío 7	Porcentaje de infraestructura tecnológica modernizada	(Número de componentes tecnológicos modernizados en el año / Número Total de componentes tecnológicos priorizados en el periodo) x 100	0%	50%	100%	Anual
OGTD3	Garantizar que las inversiones en tecnologías digitales generen beneficios medibles en eficiencia, productividad, ahorro y valor público. Desafío 2	Porcentaje de proyectos tecnológicos informáticos Desplegados	(Número Proyectos desplegados al año / Total de proyectos programados en periodo) x 100	0%	44%	100%	Anual
OGTD4	Asegurar que los servicios digitales del Ministerio Público sean accesibles, operables y centrados en las necesidades de los ciudadanos. Desafío 3	Porcentaje de satisfacción ciudadana de los servicios digitales desplegados	(Número de usuarios satisfechos en el año/ Total de usuarios encuestados en el año) x 100	0%	50%	100%	Anual

VI. PORTAFOLIO DE PROYECTOS.

El portafolio de proyectos del Plan de Gobierno y Transformación Digital Plan de Gobierno y Transformación Digital del Ministerio Público está conformado por 24 proyectos. Para cada uno de los proyectos, se precisan las variables relevantes, como costo, beneficiario y nivel de prioridad, siendo ésta última el resultado del análisis de las siguientes variables de priorización: Alineamiento o vinculación con los Objetivos de Gobierno y Transformación Digital, Riesgo de no ejecutarse y Grado de impacto en el cliente o beneficiario, conforme a los criterios de la sección anterior.

Los proyectos que se muestran en el presente Plan fueron consensuados con las Unidades Orgánicas del Ministerio Público, y priorizados mediante una valorización.

Tabla 8: Cartera Proyectos

N°	Código Proy.	ÁREA	OBJETIVOS DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL	NOMBRE DEL PROYECTO
1	MP-PGD-008	OGTI	OGTD3	Implementación de Carpeta Fiscal Electrónica (con sus respectivos componentes).
2	MP-PGD-010	OGTI	OGTD3	Servicio de Interconexión de la Red de Comunicaciones para las Sedes del Ministerio Público a Nivel Nacional (Red WAN).
3	MP-PGD-011	OGTI	OGTD3	Implementación del Sistema de Respaldo de Datos (Backup), Resguardo de Información y Continuidad del Negocio.
4	MP-PGD-021	OGTI	OGTD2	Mejoramiento y Renovación de Equipos Multifuncionales por Obsolescencia.
5	MP-PGD-004	IML	OGTD3	Implementación de equipos de sala de entrevista única (10 sala).
6	MP-PGD-012	OGTI	OGTD2	Fortalecimiento y Renovación de la Infraestructura de Servidores y Software Base.
7	MP-PGD-013	OGTI	OGTD2	Repotenciación de Servidores para Servicios Institucionales.
8	MP-PGD-019	OGTI	OGTD2	Modernización de equipamiento de cómputo para optimizar los servicios administrativos y operativos de la Fiscalía de la Nación.
9	MP-PGD-014	OGTI	OGTD3	Implementación de Ventilación en los Cuartos de Telecomunicaciones en Lima (Aires Acondicionados).
10	MP-PGD-015	OGTI	OGTD3	Implementación de Sistemas de Control de Acceso, Videovigilancia para el Centro de Datos.
11	MP-PGD-016	OGTI	OGTD3	Fortalecimiento de la Interconexión Inalámbrica (WLAN) para Sedes de Lima Centro.
12	MP-PGD-009	OGTI	OGTD1	GEOFISCAL (Sistema de Georreferenciación para toma de decisiones: Fiscalías especializadas).

13	MP-PGD-022	OGTI	OGTD3	Mejoramiento y Estabilización del Suministro Eléctrico para Equipos Informáticos.
14	MP-PGD-005	IML	OGTD1	Implementación de un Sistema de Agenda Fiscal para Cámara Gesell.
15	MP-PGD-006	IML	OGTD1	Integración de sistemas fiscales con sistemas médico legales.
16	MP-PGD-001	FEMA	OGTD1	Sistema de análisis de información de imágenes generadas por los drones de la entidad (Sistema IA-DRON).
17	MP-PGD-023	OGTI	OGTD3	Servicio de Mantenimiento Constante y Suministro de Consumibles para Multifuncionales-Escáner a Nivel Nacional.
18	MP-PGD-007	OGFIN	OGTD4	Implementación de la Plataforma de Servicios TUPA Digital del Ministerio Público.
19	MP-PGD-024	OGTI	OGTD1	Implementación de App para la Gestión y Archivo de Documentos Fiscales.
20	MP-PGD-003	IML	OGTD4	Sistema de Gestión de Espera por Tickets (34).
21	MP-PGD-017	OGTI	OGTD1	Implementación de un Sistema de Gestión de Servicios Tecnológicos (Mesa de Ayuda).
22	MP-PGD-020	OGTI	OGTD1	Implementación de un Chatbot para la Mesa de Ayuda de TI.
23	MP-PGD-018	OGTI	OGTD1	Sistema de Gestión de Inventario del Parque Informático.
24	MP-PGD-002	IML	OGTD1	Sistema de Inventario de Insumos Químicos.

VI. 1Priorización del Portafolio de Proyectos de Gobierno y Transformación Digital.

La priorización de los proyectos se basa en la valorización de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 9: Valoración

CRITERIO			
NIVEL	PESO	VALOR	PUNTAJE TOTAL POR NIVEL
Tipo	Administrativo	1	Mínimo 1 Máximo 4
	Soporte	2	
	Misional	3	
	Estratégico	4	
Alcance	Oficina	1	Mínimo 1 Máximo 3
	Transversal / Sede Central	2	
	Sectorial / Nacional	3	
Información	Oficina	1	Mínimo 1 Máximo 4
	Transversal	2	
	Sectorial	3	
	Ciudadano	4	
Obligatoriedad por Norma Legal	Sin Norma	1	Mínimo 1

	Norma Institucional	2	Máximo 3
	Norma Nacional	3	
Estado de Proyecto	Sin iniciar	1	Mínimo 1
	Iniciado	2	Máximo 3
	Avance mayor al 50%	3	
Presupuesto	Sin presupuesto	1	Mínimo 1
	Presupuesto Parcial	2	Máximo 3
	Con presupuesto	3	

Si el valor resultante de la suma de los 6 niveles se encuentra en cierto rango, le corresponde un nivel de prioridad, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 10: Rango de Prioridades

RANGO	PRIORIDAD
De 0 a 9	Baja
De 10 a 14	Media
De 15 a 20	Alta

Tabla 11: Cartera Proyectos Priorizados

Nº	Codigo Proy.	AREA	OBJETIVO DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL	NOMBRE DEL PROYECTO	PUNTAJE TOTAL	PRIORIDAD
1	MP-PGD-008	OGTI	OGTD3	Implementacion de Carpeta Fiscal Electronica (con sus respectivos componentes).	18	ALTA
2	MP-PGD-010	OGTI	OGTD3	Servicio de Interconexión de la Red de Comunicaciones para las Sedes del Ministerio Público a Nivel Nacional (Red WAN).	16	ALTA
3	MP-PGD-011	OGTI	OGTD3	Implementación del Sistema de Respaldo de Datos (Backup), Resguardo de Información y Continuidad del Negocio.	16	ALTA
4	MP-PGD-021	OGTI	OGTD2	Mejoramiento y Renovación de Equipos Multifuncionales por Obsolescencia.	16	ALTA
5	MP-PGD-004	IML	OGTD3	Implementación de equipos de sala de entrevista única (10 sala).	16	ALTA
6	MP-PGD-012	OGTI	OGTD2	Fortalecimiento y Renovación de la Infraestructura de Servidores y Software Base.	15	ALTA
7	MP-PGD-013	OGTI	OGTD2	Repotenciación de Servidores para Servicios Institucionales.	15	ALTA
8	MP-PGD-019	OGTI	OGTD2	Modernización de equipamiento de computo para optimizar los servicios administrativos y operativos de la Fiscalía de la Nación.	15	ALTA
9	MP-PGD-014	OGTI	OGTD3	Implementación de Ventilación en los Cuartos de Telecomunicaciones en Lima (Aires Acondicionados).	14	MEDIA
10	MP-PGD-015	OGTI	OGTD3	Implementación de Sistemas de Control de Acceso, Videovigilancia para el Centro de Datos.	14	MEDIA
11	MP-PGD-016	OGTI	OGTD3	Fortalecimiento de la Interconexión Inalámbrica (WLAN) para Sedes de Lima Centro.	14	MEDIA
12	MP-PGD-009	OGTI	OGTD1	GEOFISCAL (Sistema de Georeferenciación para toma de decisiones: Fiscalías especializadas).	14	MEDIA
13	MP-PGD-022	OGTI	OGTD3	Mejoramiento y Estabilización del Suministro Eléctrico para Equipos Informáticos.	14	MEDIA
14	MP-PGD-005	IML	OGTD1	Implementación de un Sistema de Agenda Fiscal para Cámara Gesell.	14	MEDIA
15	MP-PGD-006	IML	OGTD1	Integración de sistemas fiscales con sistemas médico legales.	14	MEDIA
16	MP-PGD-001	FEMA	OGTD1	Sistema de análisis de información de imágenes generadas por los drones de la entidad (Sistema IA-DRON).	13	MEDIA
17	MP-PGD-023	OGTI	OGTD3	Servicio de Mantenimiento Constante y Suministro de Consumibles para Multifuncionales-Escáner a Nivel Nacional.	13	MEDIA
18	MP-PGD-007	OGFIN	OGTD4	Implementación de la Plataforma de Servicios TUPA Digital del Ministerio Público.	12	MEDIA
19	MP-PGD-024	OGTI	OGTD1	Implementación de App para la Gestión y Archivo de Documentos Fiscales.	12	MEDIA
20	MP-PGD-003	IML	OGTD4	Sistema de Gestión de Espera por Tickets (34).	12	MEDIA
21	MP-PGD-017	OGTI	OGTD1	Implementación de un Sistema de Gestión de Servicios Tecnológicos (Mesa de Ayuda).	11	MEDIA
22	MP-PGD-020	OGTI	OGTD1	Implementación de un Chatbot para la Mesa de Ayuda de TI.	11	MEDIA
23	MP-PGD-018	OGTI	OGTD1	Sistema de Gestión de Inventario del Parque Informático .	10	MEDIA
24	MP-PGD-002	IML	OGTD1	Sistema de Inventario de Insumos Químicos.	10	MEDIA

Nota: El detalle de los proyectos podrán ser revisados en el Anexo I

Tabla 12: Cronograma de Implementación de Portafolio de Proyectos

N°	Codigo Proy.	AREA	NOMBRE DEL PROYECTO	2025				2026				2027			
				Tri. I	Tri. II	Tri. III	Tri. IV	Tri. I	Tri. II	Tri. III	Tri. IV	Tri. I	Tri. II	Tri. III	Tri. IV
1	MP-PGD-008	OGTI	Implementación de Carpeta Fiscal Electrónica (con sus respectivos componentes).												
2	MP-PGD-010	OGTI	Servicio de Interconexión de la Red de Comunicaciones para las Sedes del Ministerio Público a Nivel Nacional (Red WAN).												
3	MP-PGD-011	OGTI	Implementación del Sistema de Respaldo de Datos (Backup), Resguardo de Información y Continuidad del Negocio.												
4	MP-PGD-021	OGTI	Mejoramiento y Renovación de Equipos Multifuncionales por Obsolescencia.												
5	MP-PGD-004	IML	Implementación de equipos de sala de entrevista única (10 sala).												
6	MP-PGD-012	OGTI	Fortalecimiento y Renovación de la Infraestructura de Servidores y Software Base.												
7	MP-PGD-013	OGTI	Repotenciación de Servidores para Servicios Institucionales.												
8	MP-PGD-019	OGTI	Modernización de equipamiento de computo para optimizar los servicios administrativos y operativos de la Fiscalía de la Nación.												
9	MP-PGD-014	OGTI	Implementación de Ventilación en los Cuartos de Telecomunicaciones en Lima (Aires Acondicionados).												
10	MP-PGD-015	OGTI	Implementación de Sistemas de Control de Acceso, Videovigilancia para el Centro de Datos.												
11	MP-PGD-016	OGTI	Fortalecimiento de la Interconexión Inalámbrica (WLAN) para Sedes de Lima Centro.												
12	MP-PGD-009	OGTI	GEOFISCAL (Sistema de Georeferenciación para toma de decisiones: Fiscalías especializadas).												
13	MP-PGD-022	OGTI	Mejoramiento y Estabilización del Suministro Eléctrico para Equipos Informáticos.												
14	MP-PGD-005	IML	Implementación de un Sistema de Agenda Fiscal para Cámara Gesell.												
15	MP-PGD-006	IML	Integración de sistemas fiscales con sistemas médico legales.												
16	MP-PGD-001	FEMA	Sistema de análisis de información de imágenes generadas por los drones de la entidad (Sistema IA-DRON).												
17	MP-PGD-023	OGTI	Servicio de Mantenimiento Constante y Suministro de Consumibles para Multifuncionales-Escáner a Nivel Nacional.												
18	MP-PGD-007	OGFIN	Implementación de la Plataforma de Servicios TUPA Digital del Ministerio Público.												
19	MP-PGD-024	OGTI	Implementación de App para la Gestión y Archivo de Documentos Fiscales.												
20	MP-PGD-003	IML	Sistema de Gestión de Espera por Tickets (34).												
21	MP-PGD-017	OGTI	Implementación de un Sistema de Gestión de Servicios Tecnológicos (Mesa de Ayuda).												
22	MP-PGD-020	OGTI	Implementación de un Chatbot para la Mesa de Ayuda de TI.												
23	MP-PGD-018	OGTI	Sistema de Gestión de Inventario del Parque Informático .												
24	MP-PGD-002	IML	Sistema de Inventario de Insumos Químicos.												

VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGTD

El siguiente cronograma tentativo presenta la planificación de las principales etapas y actividades para la implementación del Plan de Gobierno y Transformación Digital del Ministerio Público 2025-2027.

Se muestra en formato tipo Gantt simplificado, donde las celdas sombreadas representan los años de ejecución.

Tabla 13: Cronograma de Implementación del plan

Actividad / Proceso	Responsable Principal	2025	2026	2027	Observaciones
Formulación y aprobación del PGTD	Comité de Gobierno y Transformación Digital	■			Aprobación en 2025
Difusión y socialización del PGTD	Secretaría Técnica	■	■	■	Reuniones y capacitaciones anuales
Ejecución del portafolio de proyectos	Oficinas Responsables (OGTI)	■	■	■	Implementación progresiva
Supervisión y seguimiento anual	Comité de Gobierno y Transformación Digital		■	■	Informes de seguimiento
Evaluación y retroalimentación al PEI/POI	Titular de la Entidad / Comité de Gobierno y Transformación Digital		■	■	Actualización anual
Actualización del PGTD	Comité de Gobierno y Transformación Digital		■	■	Según resultados de evaluación

Nota aclaratoria: El presente cronograma es de carácter tentativo y se encuentra sujeto a ajustes en función de:

- La disponibilidad de recursos humanos, financieros y tecnológicos.
- Las prioridades estratégicas del Ministerio Público.
- Los resultados obtenidos en cada etapa de implementación.

VIII. SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGD

La supervisión de la implementación del PGD estará a cargo del Comité de Gobierno Digital, el cual evaluará anualmente el grado de cumplimiento de los objetivos y proyectos planteados.

Se establecen los siguientes mecanismos de supervisión:

- Elaboración de informes anuales de seguimiento.
- Medición de indicadores de cumplimiento (ejemplo: % de proyectos implementados, madurez digital, satisfacción ciudadana).
- Actualización anual del PGD con base en los resultados alcanzados.
- Retroalimentación a los instrumentos de gestión institucional (PEI y POI).

El Comité de Gobierno Digital coordinará con las oficinas responsables la actualización de metas y actividades para asegurar la sostenibilidad del proceso de transformación digital.

MATRIZ DE COMUNICACIONES

La implementación efectiva, el monitoreo y la evaluación del Plan de Gobierno y Transformación Digital (PGTD) 2025-2027 demandan una gestión de la comunicación estratégica, formal y oportuna. El éxito del PGTD depende de la correcta articulación de los esfuerzos de sus diversos actores clave: el Titular de la Entidad, el Comité de Gobierno y Transformación Digital (CGTD), las Oficinas Responsables y el personal en general.

En este contexto, la Matriz de Comunicaciones se establece como el instrumento formal para:

1. **Estandarizar los flujos de información** críticos a lo largo de las fases de ejecución, seguimiento y supervisión del Plan.
2. **Garantizar la toma de decisiones informada** al asegurar que los indicadores de avance, los resultados de los proyectos y las alertas de riesgos sean reportados con la periodicidad establecida.
3. **Promover la transparencia y la adopción del cambio cultural** necesario para la transformación digital en el Ministerio Público.

MATRIZ DE COMUNICACIONES					
¿Qué Comunicamos?	¿A Quién se Comunica?	¿Quién Comunica?	Frecuencia	Método	Propósito
1. Avance de Proyectos y Riesgos	El Comité de Gobierno y Transformación Digital (CGTD)	Oficinas Responsables / Responsables de Proyecto	Trimestral	Reporte formal/Reunión de seguimiento, informes	Monitorear el progreso y la gestión de riesgos de la cartera de proyectos.
2. Informe de Supervisión del PGTD	El Titular (Fiscal de la Nación/Gerente General)	El Comité de Gobierno y Transformación Digital (CGTD)	Semestral	Informe	Reportar el avance de cumplimiento de objetivos y proyectos del PGTD y presentar recomendaciones.

3. Resultados de Evaluación y Retroalimentación (Aprobación)	El Titular, El Comité, Gerencias, Oficinas de Línea y Apoyo	El Titular / El Comité	Anual	Resolución/Comunicado oficial	Formalizar la evaluación del PGTD, y retroalimentar el Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI).
4. Difusión y Socialización del PGTD	Colaboradores del Ministerio Público	Secretaría Técnica	Anual y durante la implementación	Reuniones y Capacitaciones	Comunicar el PGTD aprobado, promover la adopción del cambio y desarrollar competencias digitales.
5. Solicitud de Reportes de Avance del PGD (Datos)	Responsables de los órganos o unidades orgánicas de proyectos	El Comité (a través de la Secretaría Técnica)	Trimestral	CEA / Correo Electrónico	Recopilar datos sobre el cumplimiento de indicadores de objetivos y proyectos.

IX. ANEXO I – FICHAS TÉCNICAS INDICADORES

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR				
OGTD1	Gestionar la digitalización integral de los procesos, servicios e información de nuestra entidad.			
Nombre del indicador:	Porcentaje de servicios digitalizados implementados			
Justificación:	Mide el grado de avance en la implementación efectiva de los servicios institucionales que han sido digitalizados y se encuentran operativos en el entorno digital, en relación con el total de servicios priorizados para su digitalización. durante el periodo 2025 - 2027 La finalidad radica en medir el avance hacia el logro del objetivo OGTD1, relacionado con gestionar la digitalización integral de los procesos, servicios e información en nuestra entidad.			
Responsable del indicador:	Responsable de la medición integración de datos e información: OGTI Responsable del OGTD1: OGTI			
Limitaciones del indicador:	Cambios en la priorización institucional o ajustes en el catálogo de servicios pueden afectar la consistencia del seguimiento. Limitaciones de infraestructura tecnológica o presupuestal pueden retrasar la implementación efectiva.			
Método de cálculo:	Fórmula: A/B x100			
	Donde: A: Número de servicios digitalizados implementados en el año			
	B: Total de servicios digitalizados programados para el periodo 2025 -2027			
	Especificaciones Técnicas: El numerador se refiere a los servicios digitales implementados durante el año y es acumulativo durante los periodos 2025 al 2027 El denominador se refiere al Total de servicios digitalizados en el horizonte del PGTD 2025-2027			
Sentido esperado del indicador:	Sentido esperado:			
	X	Ascendente		
		Descendente		
		No definido		
Proceso de recolección y análisis	Registro: Cada Oficina de Línea responsable del servicio, registra el estado de avance de la digitalización de su servicio (en diseño, desarrollo, piloto o implementado) en una plantilla o sistema de seguimiento de proyectos.			
	Consolidación: La Oficina General de Tecnologías de la Información consolida la información reportada por las diferentes dependencias, verificando coherencia entre los datos y los criterios de digitalización establecidos.			
	Análisis: Se calcula el porcentaje de servicios efectivamente digitalizados e implementados, identificando brechas, causas de retrasos y buenas prácticas.			
	Validación : Los resultados son validados por el Comité de Gobierno Digital, asegurando trazabilidad y evidencia técnica del proceso.			
	Remisión: El resultado validado se remite a las instancias correspondientes (Secretaría de Gobierno Digital, PCM, o informes internos de avance del Plan de Gobierno y Transformación Digital).			
Fuente y base de datos:	Fuente: Informes de avance de digitalización de servicios remitidos por la OGTI			
	Base de Datos: Registro maestro de servicios institucionales priorizados para digitalización (catálogo institucional de servicios digitales).			
	Línea Base			
	LOGROS ESPERADOS			
AÑO	2024	2025	2026	2027
VALOR	S/I*	22%	67%	100%

* SIN INFORMACIÓN

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR				
OGTD2	Implementar una infraestructura tecnológica que soporte adecuadamente el proceso de transformación digital y servicios digitales.			
Nombre del indicador:	Porcentaje de infraestructura tecnológica modernizada			
Justificación:	Mide el grado de avance en la modernización de la infraestructura tecnológica institucional, considerando la actualización de hardware, software, redes, centros de datos y servicios en la nube, respecto del total de componentes priorizados en el plan de modernización tecnológica. durante el periodo 2025 - 2027 La finalidad radica en evaluar objetivamente el avance de la institución hacia una infraestructura tecnológica moderna, confiable y alineada con los estándares del Gobierno Digital y la Política Nacional de Transformación Digital.			
Responsable del indicador:	Responsable de la medición integración de datos e información: OGTI Responsable del OGTD2: OGTI			
Limitaciones del indicador:	Cambios en la priorización o alcance del PGTD 2025-2027, que pueden alterar la base de cálculo. Limitaciones presupuestales o de contratación pueden afectar la ejecución de los proyectos tecnológicos. Dificultades para medir componentes intangibles como resiliencia, interoperabilidad o escalabilidad.			
Método de cálculo:	Fórmula: $A/B \times 100$			
	Donde: A: Número de componentes tecnológicos modernizados en el año B: Número Total de componentes tecnológicos priorizados en el periodo			
	Especificaciones Técnicas:			
	El numerador es acumulativo durante los periodos 2025 y 2027, y los componentes tecnológicos modernizados se refiere a los equipos adquiridos durante el año.			
	El denominador se refiere al Total de componentes tecnologicos priorizados en el horizonte del PGTD 2025-2027 Llamese componentes a todo equipo informatico (Pcs, Impresoras, multifuncionales, servidores, Hw)			
Sentido esperado del indicador:	Sentido esperado:			
	X	Ascendente		
		Descendente		
		No definido		
Proceso de recolección y análisis	Registro: Cada unidad de TI o dependencia responsable de la OGTI reporta los avances en la modernización de equipos, redes, servidores, software y sistemas.			
	Consolidación: La Oficina General de Tecnologías de la Información recopila los reportes de todas las áreas, verificando consistencia en los criterios de “modernización” (por ejemplo: reemplazo de equipos obsoletos, actualización de sistemas).			
	Análisis: Se calcula el porcentaje de componentes modernizados, comparando con la meta programada. Se analizan causas de retraso, factores críticos de éxito y brechas tecnológicas.			
	Validación : Los resultados son validados por el Comité de Gobierno Digital, asegurando trazabilidad y evidencia técnica del proceso.			
	Remisión: El resultado validado se remite a las instancias correspondientes (Secretaría de Gobierno Digital, PCM, o informes internos de avance del Plan de Gobierno Digital).			
Fuente y base de datos:	Fuente: Informes técnicos de modernización de infraestructura emitidos por las áreas de TI. Reportes del Sistema de Inventario de Activos Tecnológicos, Plan de Modernización Tecnológica Institucional.			
	Base de Datos: Registro institucional de activos tecnológicos y componentes priorizados para modernización.			
	Línea Base			
	LOGROS ESPERADOS			
AÑO	2024	2025	2026	2027
VALOR	S/I*	0%	50%	100%

* SIN INFORMACIÓN

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR				
OGTD3	Garantizar que las inversiones en tecnologías digitales generen beneficios medibles en eficiencia, productividad, ahorro y valor público.			
Nombre del indicador:	Porcentaje de proyectos tecnológicos informáticos desplegados.			
Justificación:	Garantizar que las inversiones en tecnologías digitales se traduzcan efectivamente en proyectos de TI desplegados y operativos, que generen valor institucional y contribuyan a la mejora de los servicios digitales del Ministerio Público durante el periodo 2025 - 2027 La finalidad radica en medir de manera objetiva la capacidad institucional para convertir las inversiones en tecnologías digitales en resultados concretos, reflejados en proyectos efectivamente desplegados y operativos.			
Responsable del indicador:	Responsable de la medición integración de datos e información: OGTI Responsable del OGTD3: OGTI			
Limitaciones del indicador:	Cambios en el presupuesto o en las prioridades institucionales pueden modificar el total de proyectos desplegados. La dependencia de factores externos como adquisiciones, contrataciones o proveedores podría generar retraso en el despliegue de los proyectos.			
Método de cálculo:	Fórmula: A/B x100			
	Donde: A: Número Proyectos desplegados en el año B: Total de proyectos programados en periodo 2025 -2027			
	Especificaciones Técnicas:			
	El numerador se refiere a los Proyectos desplegados (proyectos en producción o en piloto) durante el año y es acumulativo durante los periodos 2025 al 2027.			
	El denominador se refiere al Total de proyectos programados en el horizonte del PGTD 2025-2027. El término desplegado, se refiere a los proyectos tecnológicos informáticos que se encuentran en uso.			
Sentido esperado del indicador:	Sentido esperado:			
	X	Ascendente		
		Descendente		
		No definido		
Proceso de recolección y análisis	Registro: Cada Coordinador de proyectos TI (gerencias) registra el estado de avance de sus proyectos en el sistema de seguimiento institucional o plantillas de control de proyectos, indicando si se encuentran planificados, en ejecución, desplegados o cerrados. Consolidación: La Oficina General de Tecnologías de la Información consolida la información remitida por las diferentes unidades, verificando que los proyectos considerados como “desplegados” cuenten con evidencias de implementación y actas de conformidad. Análisis: Se calcula el porcentaje de proyectos desplegados frente al total planificado, identificando brechas de ejecución, causas de retraso y factores de éxito. Se realiza un análisis comparativo con periodos anteriores y metas establecidas. Validación : Los resultados obtenidos son revisados y validados por el Comité de Gobierno Digital, asegurando coherencia con los reportes financieros y técnicos de ejecución. Remisión: Los datos validados son remitidos mediante informes de avance institucional, reportes de gestión del Plan de Gobierno y Transformación Digital 2025-2027 o a la Secretaría de Gobierno Digital (PCM), según el marco normativo.			
Fuente y base de datos:	Fuente: Informes de seguimiento de proyectos TI elaborados por las unidades de línea de la OGTI.			
	Base de Datos: Cartera institucional de proyectos TI priorizados y sus cronogramas de ejecución.			
	Línea Base LOGROS ESPERADOS			
AÑO	2024	2025	2026	2027
VALOR	S/I*	0%	44%	100%

* SIN INFORMACIÓN



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR				
OGTD4	Asegurar que los servicios digitales del Ministerio Público sean accesibles, operables y centrados en las necesidades de los ciudadanos.			
Nombre del indicador:	Porcentaje de satisfacción ciudadana de los servicios digitales desplegados.			
Justificación:	Mide la percepción ciudadana sobre la calidad y pertinencia de los servicios digitales del Ministerio Público, reflejando el grado en que las soluciones tecnológicas responden a las necesidades reales de los usuarios durante el periodo 2025 - 2027.			
	La finalidad radica en asegurar que los servicios digitales del Ministerio Público sean accesibles, operables y centrados en las necesidades de los ciudadanos.			
Responsable del indicador:	Responsable de la medición integración de datos e información: OGTI			
	Responsable del OGTD4: OGTI			
Limitaciones del indicador:	La cantidad de respuesta de las encuestas puede ser baja, afectando la representatividad.			
	Posible sesgo en las respuestas (usuarios más satisfechos o insatisfechos tienden a responder con mayor frecuencia).			
	Dificultad para medir la satisfacción en servicios que aún no cuentan con canales digitales de retroalimentación.			
	La dificultad en el acceso y habilidades digitales del ciudadano podrían generar una insatisfacción al usar el servicio digital.			
Método de cálculo:	Fórmula:			
	A/B x100			
	Donde:			
	A: Número de usuarios satisfechos en el año.			
	B: Total de usuarios encuestados en el año.			
	Especificaciones Técnicas:			
	El numerador se refiere a los usuarios que respondieron en la escala de LIKERT de 5 puntos y se consideran como respuestas positivas (satisfechas) aquellas que tienen una calificación de 4 (Satisfecho/a) y 5 (Muy Satisfecho/a).			
	El denominador se refiere al Total de usuarios encuestados en el año.			
Sentido esperado del indicador:	Sentido esperado:			
	X	Ascendente		
		Descendente		
		No definido		
Proceso de recolección y análisis	Registro: Se recopilan los datos de satisfacción a través de encuestas en línea, formularios integrados a los servicios digitales, buzones virtuales de opinión o mecanismos de retroalimentación ciudadana. Los resultados son registrados por cada unidad responsable del servicio.			
	Consolidación: La Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) consolida los resultados de satisfacción de todos los servicios digitales desplegados, garantizando la homogeneidad en la escala de medición.			
	Análisis: Se calcula el porcentaje de satisfacción general, así como resultados desagregados por tipo de servicio. Se identifican causas de insatisfacción, oportunidades de mejora y patrones de percepción ciudadana.			
	Validación : La información consolidada y analizada se valida por el Comité de Gobierno y Transformación Digital, garantizando consistencia y respaldo técnico.			
	Remisión: Los resultados validados se remiten mediante informes de seguimiento del Plan de Gobierno y Transformación Digital, reportes institucionales de desempeño o comunicaciones a la Secretaría de Gobierno Digital (PCM).			
Fuente y base de datos:	Fuente: Encuestas de satisfacción aplicadas a usuarios de los servicios digitales del Ministerio Público.			
	Base de Datos: Consolidado de resultados de encuestas de satisfacción por servicio digital (base de datos institucional o sistema de seguimiento de servicios digitales).			
	Línea Base			
	LOGROS ESPERADOS			
AÑO	2024	2025	2026	2027
VALOR	S/I*	0%	50%	100%

* SIN INFORMACIÓN

X. ANEXO 2 – FICHAS TECNICAS DE PROYECTOS

FICHA DE PROYECTO 1

Proyecto: Sistema de Análisis de Información de Imágenes de Drones para la Investigación Fiscal (Sistema IA-DRON).

Código de Proyecto: MP-PGD-001

Fecha de última actualización: 15/08/2024.

1. Identificación y Alineamiento Estratégico.

- **Nombre del Proyecto:** Sistema de Análisis de Información de Imágenes de Drones para la Investigación Fiscal (Sistema IA-DRON).
- **Área/Unidad Responsable:** Gerencia Central de Tecnologías de la Información, en coordinación con las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA).
- **Justificación del Proyecto (Problema o Necesidad):** Existe una creciente dificultad para procesar y analizar de manera oportuna el gran volumen de imágenes generadas por drones. Esto retrasa la capacidad de respuesta en la investigación de delitos ambientales. Se necesita una herramienta tecnológica que automatice el análisis de estas imágenes para fortalecer la labor fiscal a nivel nacional.
- **Objetivo Estratégico del Plan de Gobierno y Transformación Digital al que se alinea:** Fortalecer la capacidad de investigación del Ministerio Público mediante el uso de tecnologías emergentes para una persecución penal más eficiente y eficaz.
- **Brecha de Capacidad/Servicio que cierra:** El proyecto cierra la brecha actual de no contar con una herramienta automatizada e inteligente para el análisis de evidencia visual aérea, lo que limita la celeridad y efectividad en la lucha contra la deforestación, minería ilegal y otros delitos ambientales.

2. Alcance y Objetivos del Proyecto.

- **Objetivo General:** Implementar un sistema de alcance nacional que, mediante inteligencia artificial, analice imágenes capturadas por drones para generar pruebas y reportes automatizados que apoyen la investigación fiscal en materia ambiental.
- **Objetivos Específicos:**
 - Desarrollar y entrenar algoritmos de IA para detectar patrones de deforestación ilegal, minería ilegal, tráfico de vida silvestre y contaminación ambiental.
 - Automatizar la generación de reportes periciales preliminares con evidencia fotográfica georreferenciada.
 - Proveer una plataforma para el análisis pericial asistido, permitiendo a los expertos validar y enriquecer los hallazgos de la IA.
 - Garantizar la integridad y seguridad de la información procesada.
- **Principales Entregables:**
 - Plataforma de software para el análisis de imágenes.
 - Módulos de IA entrenados para la detección de ilícitos ambientales.
 - Módulo de generación de reportes automáticos.
 - Manuales de usuario y programa de capacitación para fiscales y peritos.
- **Fuera del Alcance (Exclusiones):**

- La adquisición, mantenimiento y operación de la flota de drones.
- El análisis legal o la toma de decisiones fiscales (el sistema es una herramienta de apoyo).
- Investigaciones en materias distintas a la ambiental.

3. Impacto y Beneficiarios.

- **Descripción del Impacto Esperado:** Se espera agilizar y fortalecer la investigación de delitos ambientales, mejorando la capacidad del Estado para proteger el ecosistema y sancionar a los infractores. El sistema proveerá evidencia más robusta y en menor tiempo.
- **Impacto Cuantitativo:**
 - Reducción estimada del 50% en el tiempo de análisis de imágenes por caso.
 - Aumento del 30% en la capacidad de cobertura y monitoreo de zonas críticas.
- **Impacto Cualitativo:**
 - Mejora en la calidad y estandarización de las pruebas periciales.
 - Fortalecimiento de la imagen institucional como entidad que usa tecnología de vanguardia.
- **Beneficiarios Directos:** Fiscales de las FEMA y peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que utilizan la herramienta para sus investigaciones.
- **Beneficiarios Indirectos:** La ciudadanía (por la protección del medio ambiente), comunidades nativas afectadas por delitos ambientales y el sistema de justicia en general.

4. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs).

- **Indicadores de Gestión (Durante el proyecto):**
 - **% de Avance del Cronograma (SPI):** Medición quincenal > 0.95.
 - **% de Ejecución Presupuestal (CPI):** Medición mensual < 1.05.
 - **Nº de Hitos Completados vs. Planificados:** Cumplimiento del 100% de los hitos mensuales.
- **Indicadores de Resultado (Post-implementación):**
 - **KPI 1:** Reducción del tiempo promedio de análisis pericial de imágenes de drones en un 50% tras 6 meses de uso.
 - **KPI 2:** Tasa de precisión del sistema en la detección de ilícitos superior al 85%.
 - **KPI 3:** Nivel de satisfacción de los usuarios (fiscales y peritos) superior al 80% en encuestas anuales.

5. Cronograma y Presupuesto.


● Fases del Proyecto:

Nº	DESCRIPCIÓN	COMIENZO	FIN
1	PLANIFICACIÓN	lun 6/10/25	vie 5/12/25
2	Levantamiento de requerimientos funcionales y técnicos	lun 6/10/25	vie 28/11/25
3	Conformación de equipo técnico	lun 6/10/25	vie 31/10/25

4	Análisis normativo legal	lun 3/11/25	vie 7/11/25
5	Definición de arquitectura de sistema	lun 10/11/25	vie 5/12/25
6	DISEÑO Y PROTOTIPADO	lun 8/12/25	vie 13/03/26
7	Diseño de experiencia (UX/UI) Y BD	lun 8/12/25	vie 16/01/26
8	Prototipo navegable y validación	lun 19/01/26	vie 13/02/26
9	Especificaciones funcionales finales	lun 16/02/26	vie 13/03/26
10	DESARROLLO E INTEGRACIÓN	lun 16/03/26	vie 5/02/27
11	Desarrollo de la solución	lun 16/03/26	vie 15/01/27
12	Optimización de código	lun 2/11/26	vie 29/01/27
13	Desarrollo de la documentación	lun 18/01/27	vie 5/02/27
14	PRUEBAS	lun 8/02/27	vie 12/03/27
15	Revisión de QA	lun 8/02/27	vie 26/02/27
16	Pruebas de Usuario	lun 1/03/27	vie 12/03/27
17	IMPLEMENTACIÓN	lun 15/03/27	mar 1/06/27
18	Elaboración de pase a producción	lun 15/03/27	mar 30/03/27
19	Pase a producción	mié 31/03/27	mar 11/05/27
20	Informe de cierre	mié 12/05/27	mar 1/06/27

- **Presupuesto Total Asignado:** S/. 734,800.00
- **Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios.

GRÁFICA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

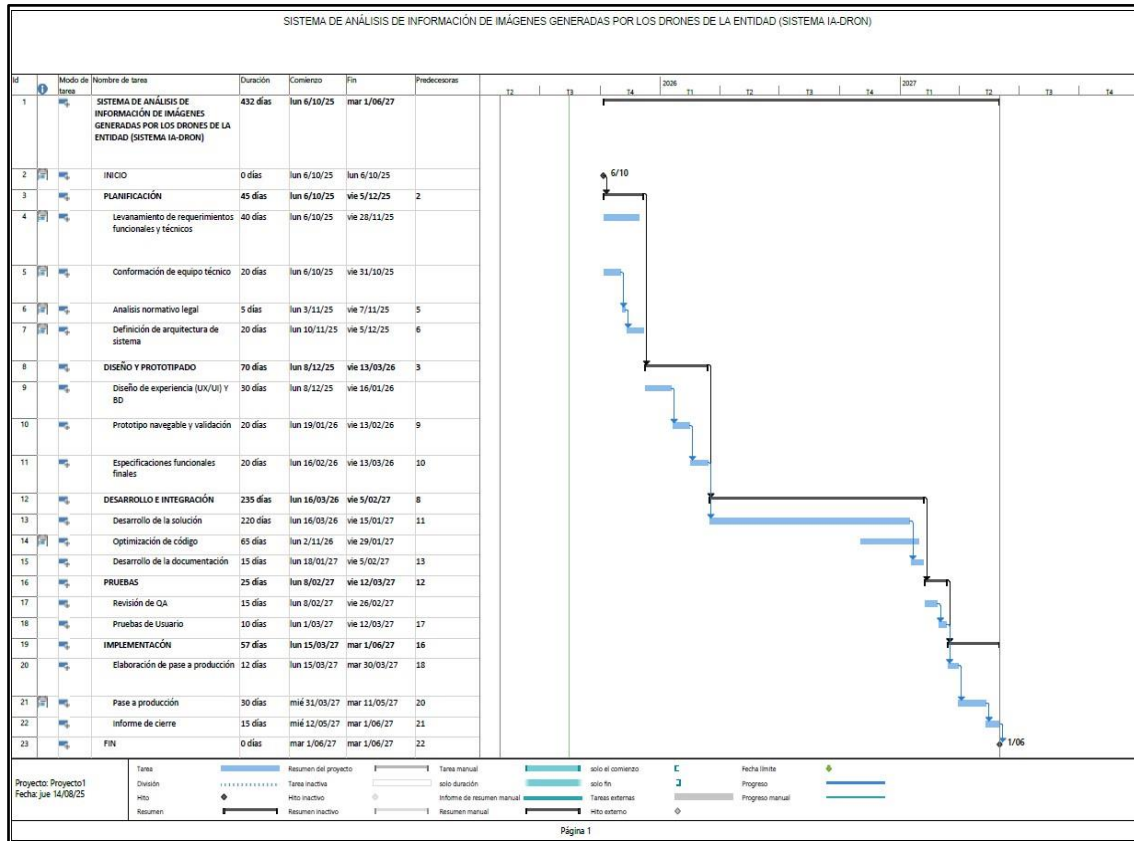

FICHA DE PROYECTO 2

Proyecto: Sistema de Inventario de Insumos Químicos

Código de Proyecto: MP-PGD-002

Fecha de última actualización: 15/08/2025

1. Identificación y Alineamiento Estratégico.

- **Nombre del Proyecto:** Sistema de Inventario de Insumos Químicos.
- **Área/Unidad Responsable:** Gerencia de Tecnologías de la Información, en coordinación con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
- **Justificación del Proyecto (Problema o Necesidad):** Actualmente, no se cuenta con información integrada ni un control eficiente sobre los insumos químicos, lo que genera un uso irracional de recursos. La falta de comunicación entre los sistemas de la fiscalía y los de medicina legal dificulta la planificación y retrasa la emisión de pericias, afectando la oportuna administración de justicia.
- **Objetivo Estratégico del Plan de Gobierno y Transformación Digital al que se alinea:** Modernizar la gestión institucional mediante la transformación digital para asegurar el uso eficiente de los recursos del Estado y mejorar la interoperabilidad entre entidades.
- **Brecha de Capacidad/Servicio que cierra:** El proyecto elimina la falta de un sistema tecnológico moderno y centralizado para la gestión de inventarios, permitiendo una planificación de recursos adecuada y garantizando la disponibilidad de insumos para los servicios periciales.

2. Alcance y Objetivos del Proyecto.

- **Objetivo General:** Implementar un sistema de inventario moderno que permita el uso eficiente y racional de los insumos químicos, garantizando su disponibilidad oportuna, interoperando con los sistemas de medicina legal para agilizar la emisión de pericias técnico-científicas.
- **Objetivos Específicos:**
 - Desarrollar una plataforma para el control de stock en tiempo real.
 - Asegurar la interoperabilidad con sistemas existentes para vincular el uso de insumos con los expedientes y peritados.
 - Crear un catálogo de servicios periciales para estandarizar los requerimientos de insumos.
 - Optimizar la comunicación y el flujo de información entre las áreas forenses y fiscales.
- **Principales Entregables:**
 - Software de gestión de inventarios.
 - Módulo de interoperabilidad con sistemas legados.
 - Catálogo de servicios digitales.
 - Programa de capacitación para personal de laboratorio y administrativo.
- **Fuera del Alcance (Exclusiones):**
 - El proceso de compra y adquisición de los insumos químicos.
 - La ejecución de los análisis periciales.
 - El desarrollo de los sistemas externos a los que se conectará.

3. Impacto y Beneficiarios.

- **Descripción del Impacto Esperado:** Optimizar el uso de insumos, reducir el desperdicio por vencimiento y evitar demoras en las pericias, lo cual contribuye directamente a acelerar los procesos judiciales.
- **Impacto Cuantitativo:**
 - Reducción del 20% en el gasto por mermas de insumos químicos.
 - Disminución del 30% en los tiempos de atención de solicitudes de laboratorio.
- **Impacto Cualitativo:**
 - Mayor confiabilidad y trazabilidad en el uso de recursos.
 - Mejora en la planificación y la toma de decisiones gerenciales.
 - Fortalecimiento de la colaboración interinstitucional.
- **Beneficiarios Directos:** Personal de laboratorio, peritos y administradores del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
- **Beneficiarios Indirectos:** Fiscales, jueces, partes procesales y la sociedad en general, que se beneficia de una justicia más ágil y eficiente.

4. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs).

- **Indicadores de Gestión (Durante el proyecto):**
 - **% de Avance del Cronograma (SPI):** > 0.95.
 - **% de Ejecución Presupuestal (CPI):** < 1.05.
 - **Nº de Hitos Completados vs. Planificados:** 100% de cumplimiento mensual.
- **Indicadores de Resultado (Post-implementación):**
 - **KPI 1:** Reducción de la tasa de insumos vencidos en un 25% durante el primer año de operación.
 - **KPI 2:** Aumento al 98% en la tasa de disponibilidad de insumos críticos para pericias urgentes.
 - **KPI 3:** Nivel de satisfacción de los usuarios del sistema superior al 90%.

5. Cronograma y Presupuesto.

- **Fases del Proyecto:**


Nº	DESCRIPCIÓN	COMIENZO	FIN
1	PLANIFICACIÓN	mié 1/04/26	lun 11/05/26
2	Levantamiento de requerimientos funcionales y técnicos	mié 1/04/26	lun 4/05/26
3	Análisis normativo legal	mié 1/04/26	mar 7/04/26
4	Definición de la arquitectura del sistema	mar 5/05/26	lun 11/05/26
5	Conformación del equipo técnico y de gestión	mar 5/05/26	vie 8/05/26
6	DISEÑO Y PROTOTIPADO	mar 12/05/26	mié 24/06/26
7	Diseño de experiencia de usuario (UX/UI)	mar 12/05/26	lun 1/06/26
8	Prototipo navegable y validación	mar 2/06/26	lun 8/06/26



9	Especificaciones funcionales finales	mar 9/06/26	mié 24/06/26
10	DESARROLLO E INTEGRACIÓN	jue 25/06/26	mié 28/10/26
11	Desarrollo de módulos	jue 25/06/26	mié 28/10/26
12	PRUEBAS Y VALIDACIÓN	jue 29/10/26	mié 9/12/26
13	Pruebas unitarias de integración y de sistema	jue 29/10/26	mié 9/12/26
14	Auditoría de seguridad y validación legal	lun 30/11/26	mar 8/12/26
15	CAPACITACIÓN Y DESPLIEGUE	jue 10/12/26	mié 30/12/26
16	Capacitación de operadores y usuarios administrativos	jue 10/12/26	mié 30/12/26
17	Lanzamiento progresivo con plan de contingencia	jue 10/12/26	mié 30/12/26

- **Presupuesto Total Asignado:** S/. 92,400.00.
- **Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios.

GRÁFICA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

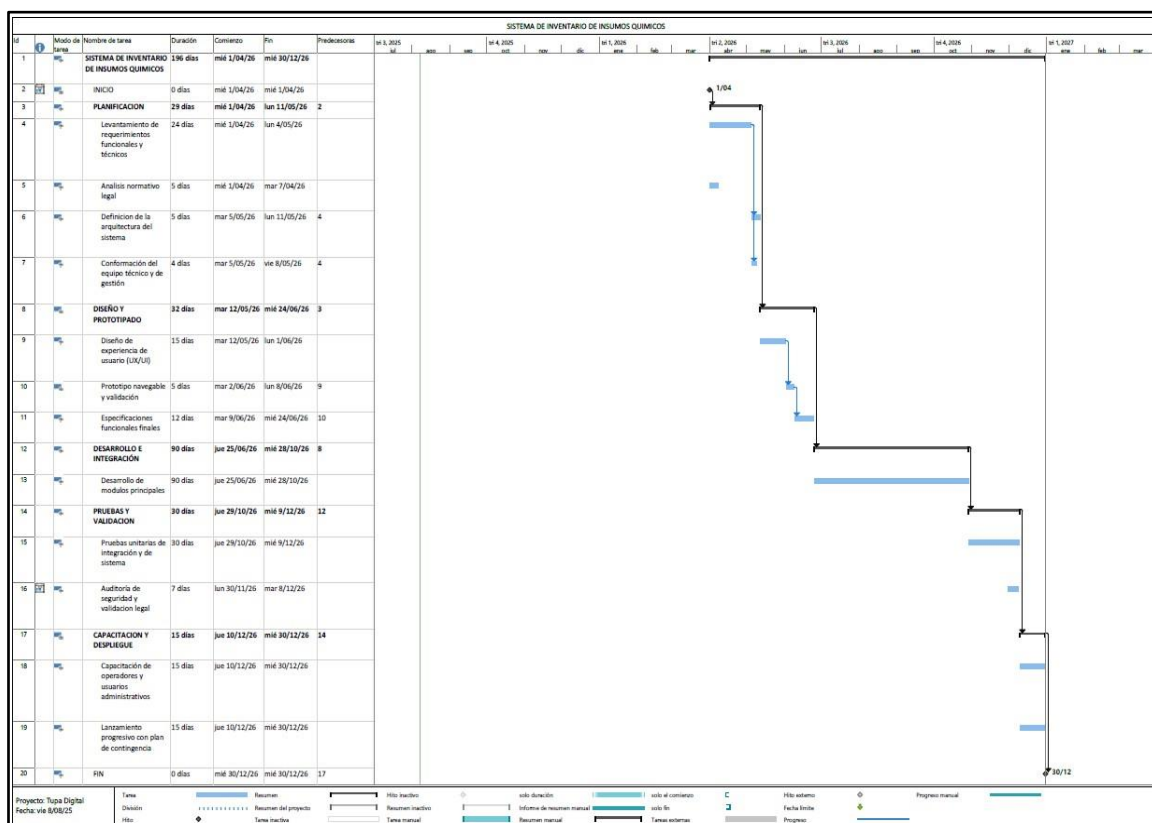

FICHA DE PROYECTO 3

Proyecto: Sistema de Gestión de Espera por Tickets

Código de Proyecto: MP-PGD-003

Fecha de última actualización: 14/08/2025

1. Identificación y Alineamiento Estratégico.

- **Nombre del Proyecto:** Sistema de Gestión de Espera por Tickets para Atención en Unidades Médico Legales.
- **Área/Unidad Responsable:** Gerencia de Tecnologías de la Información en coordinación con las Unidades de Atención al Usuario del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
- **Justificación del Proyecto (Problema o Necesidad):** Se ha identificado un tiempo de espera muy alto para la atención a usuarios y ciudadanos en las dependencias del Instituto de Medicina Legal. Esta situación genera desorden, insatisfacción y una percepción negativa del servicio. Se requiere una solución tecnológica para gestionar el flujo de personas de manera eficiente.
- **Objetivo Estratégico del Plan de Gobierno y Transformación Digital al que se alinea:** Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano mediante la implementación de tecnologías que optimicen los procesos de atención y la experiencia del usuario.
- **Brecha de Capacidad/Servicio que cierra:** El proyecto cierra la brecha de no contar con un sistema automatizado para la gestión de colas, lo que actualmente provoca falta de organización, inequidad en el orden de atención y carencia de métricas para la optimización del servicio.

2. Alcance y Objetivos del Proyecto.

- **Objetivo General:** Implementar un sistema de gestión de espera por tickets para organizar, controlar y dar celeridad a la atención en las Unidades Médico Legales, reduciendo significativamente los tiempos de espera y mejorando la experiencia de los usuarios.
- **Objetivos Específicos:**
 - Automatizar la asignación de turnos de atención mediante la expedición de tickets.
 - Monitorear en tiempo real los tiempos de espera y de atención por cada servicio.
 - Generar reportes y estadísticas para la toma de decisiones y la mejora continua de los procesos de atención.
 - Proveer a los usuarios un sistema de llamado por pantallas claro y ordenado.
- **Principales Entregables:**
 - Software para la administración de colas y turnos.
 - Equipos dispensadores de tickets (quioscos).
 - Pantallas para el llamado de turnos en las salas de espera.
 - Tablero de control (dashboard) con estadísticas de atención en tiempo real.
 - Personal capacitado en el uso y gestión del sistema.
- **Fuera del Alcance (Exclusiones):**
 - La ejecución del trámite o servicio médico-legal en sí mismo.
 - La gestión de citas programadas previamente.
 - La remodelación de las infraestructuras de las salas de espera (más allá de la instalación de equipos).

3. Impacto y Beneficiarios.

- **Descripción del Impacto Esperado:** Se espera una mejora radical en el orden y la eficiencia de la atención, lo que resultará en una mayor satisfacción de los usuarios y un ambiente de trabajo menos estresante para el personal. La institución podrá tomar decisiones basadas en datos para optimizar sus recursos.
- **Impacto Cuantitativo:**
 - Reducción del tiempo de espera promedio en al menos un 40%.
 - Aumento de la capacidad de atención de usuarios por hora.
- **Impacto Cualitativo:**
 - Mejora significativa en la percepción de la calidad del servicio.
 - Mayor transparencia y equidad en el proceso de atención.
 - Disminución de conflictos y quejas por demoras.
- **Beneficiarios Directos:**
 - Ciudadanos y usuarios que acuden a las Unidades Médico Legales.
 - Personal de atención y administrativos del Instituto de Medicina Legal.
- **Beneficiarios Indirectos:** El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses como organización, al proyectar una imagen de eficiencia y modernidad.

4. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs).

- **Indicadores de Gestión (Durante el proyecto):**
 - **% de Avance del Cronograma (SPI):** Medición quincenal > 0.95.
 - **% de Ejecución Presupuestal (CPI):** Medición mensual < 1.05.
 - **Nº de Hitos Completados vs. Planificados:** Cumplimiento del 100%.
- **Indicadores de Resultado (Post-implementación):**
 - **KPI 1:** Tiempo de espera promedio por usuario, con una meta de reducción del 40% a los 3 meses de la implementación.
 - **KPI 2:** Nivel de satisfacción del usuario (medido por encuestas rápidas en el punto de atención) superior al 85%.
 - **KPI 3:** Tiempo de atención promedio por tipo de servicio, para identificar cuellos de botella.

5. Cronograma y Presupuesto.


- **Fases del Proyecto:**

Nº	DESCRIPCIÓN	COMIENZO	FIN
1	PLANIFICACIÓN	mié 1/10/25	vie 13/02/26
3	Levantamiento de requerimientos funcionales y técnicos	mié 1/10/25	vie 30/01/26
4	Conformación del equipo técnico y de gestión	mié 22/10/25	vie 6/02/26
5	Análisis normativo legal	mar 28/10/25	vie 13/02/26
6	Definición de la arquitectura del sistema	mar 4/11/25	jue 12/02/26
7	DISEÑO Y PROTOTIPADO	mar 11/11/25	jue 19/03/26
8	Diseño de experiencia de usuario (UX/UI)	mar 11/11/25	vie 27/02/26

9	Prototipo navegable y validación	mar 25/11/25	mar 3/03/26
10	Especificaciones funcionales finales	jue 27/11/25	jue 19/03/26
11	DESARROLLO E INTEGRACIÓN	jue 11/12/25	jue 16/07/26
12	Desarrollo de módulos principales	jue 11/12/25	jue 16/07/26
13	Mejora de la decodificación	lun 9/03/26	vie 22/05/26
14	PRUEBAS Y VALIDACIÓN	vie 27/03/26	jue 27/08/26
15	Pruebas unitarias de integración y de sistema	vie 27/03/26	jue 27/08/26
16	Auditoría de seguridad y validación legal	lun 27/04/26	lun 27/07/26
17	CAPACITACIÓN Y DESPLIEGUE	vie 8/05/26	jue 24/09/26
18	Capacitación de operadores y usuarios administrativos	vie 8/05/26	jue 24/09/26
19	Lanzamiento progresivo con plan de contingencia	vie 5/06/26	jue 24/09/26
		mar 30/06/26	

- **Presupuesto Total Asignado:** S/.549,600.00
- **Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios.

GRÁFICA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

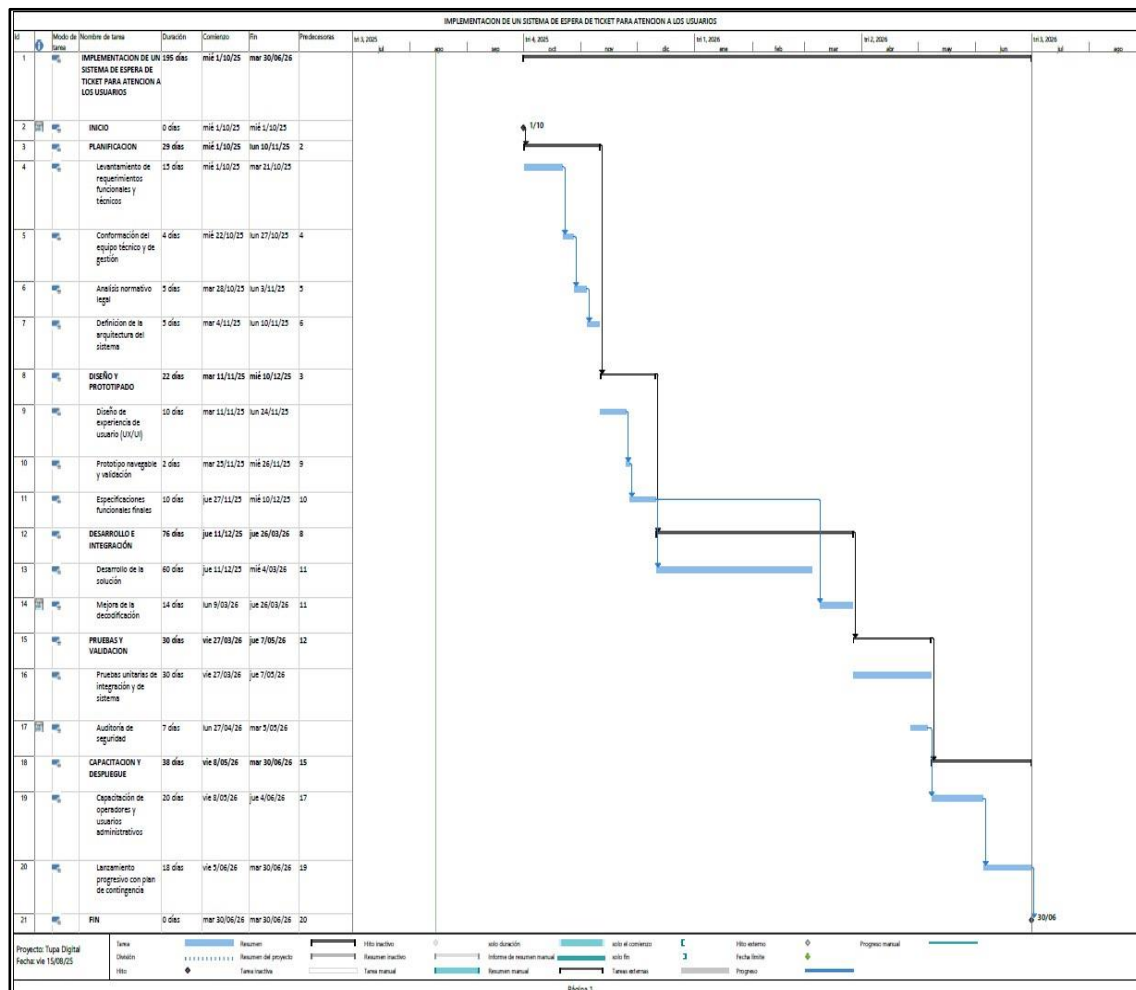

FICHA DE PROYECTO 4

Proyecto: Implementación de Salas de Entrevista Única

Código de Proyecto: MP-PGD-004

Fecha de última actualización: 14/08/2025

1. Identificación y Alineamiento Estratégico.

- **Nombre del Proyecto:** Implementación de Salas de Entrevista Única y Sistema de Agendamiento.
- **Área/Unidad Responsable:** Gerencia de Infraestructura y Gerencia de TI, en coordinación con la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (UDAVIT).
- **Justificación del Proyecto (Problema o Necesidad):** Existe una **demandas insatisfechas** para la realización de entrevistas únicas debido a una capacidad instalada insuficiente y un **manejo poco adecuado de la agenda** de las Cámaras Gesell existentes. Esta situación provoca constantes

reprogramaciones de los procedimientos, lo que retrasa los procesos judiciales y, más importante aún, causa la revictimización de personas vulnerables.

- **Objetivo Estratégico del Plan de Gobierno y Transformación Digital al que se alinea:** Fortalecer la capacidad del sistema de justicia para proteger a las víctimas y testigos vulnerables, asegurando la celeridad procesal mediante infraestructura y tecnología adecuadas.
- **Brecha de Capacidad/Servicio que cierra:** El proyecto cierra una brecha crítica de infraestructura (falta de salas) y de gestión (carencia de un sistema de agendamiento eficiente), lo cual es fundamental para garantizar un trato adecuado y digno a las víctimas y la obtención oportuna de pruebas.

2. Alcance y Objetivos del Proyecto.

- **Objetivo General:** Implementar diez (10) Salas de Entrevista Única completamente equipadas y un sistema centralizado de agendamiento para cubrir la demanda, eliminar las reprogramaciones y asegurar la ejecución oportuna de los procedimientos de entrevista.
- **Objetivos Específicos:**
 - Adecuar la infraestructura física para las 10 nuevas salas.
 - Adquirir e instalar el equipamiento audiovisual especializado requerido.
 - Desarrollar e implementar una plataforma digital para la gestión centralizada de agendas.
 - Capacitar al personal (psicólogos, fiscales) en el uso de los nuevos equipos y del sistema de agendamiento.
- **Principales Entregables:**
 - Diez (10) Salas de Entrevista Única operativas y equipadas.
 - Sistema de agendamiento digital implementado y funcionando.
 - Protocolos y manuales de usuario para el uso de las salas y la gestión de agendas.
- **Fuera del Alcance (Exclusiones):**
 - La contratación de nuevo personal para realizar las entrevistas.
 - La definición de la metodología psicológica o legal de la entrevista.
 - La construcción de nuevas sedes (se adecuarán espacios existentes).

3. Impacto y Beneficiarios.

- **Descripción del Impacto Esperado:** Se espera una reducción drástica de las reprogramaciones, lo que agilizará los procesos judiciales y evitará la revictimización de testigos y víctimas. La institución podrá satisfacer la demanda de este procedimiento crítico de manera eficiente y humana.
- **Impacto Cuantitativo:**
 - Incremento de la capacidad para realizar entrevistas en un 100% (o más, según la base actual).
 - Reducción de la tasa de reprogramaciones a menos del 5%.
- **Impacto Cualitativo:**
 - Mejora sustancial en la protección y el trato a víctimas.
 - Fortalecimiento de la imagen del sistema de justicia como una entidad eficiente y empática.
 - Estandarización de la calidad técnica de las entrevistas.
- **Beneficiarios Directos:** Víctimas y testigos de delitos (especialmente niños, niñas y adolescentes), fiscales, psicólogos y abogados.
- **Beneficiarios Indirectos:** El Poder Judicial y la sociedad en su conjunto, al contar con un sistema más eficaz para la persecución del delito.

4. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs).

- **Indicadores de Gestión (Durante el proyecto):**
 - **% de Avance del Cronograma (SPI):** Medición mensual > 0.9.
 - **% de Ejecución Presupuestal (CPI):** Medición mensual < 1.1.
 - **Nº de Hitos Completados vs. Planificados:** 100% de cumplimiento.
- **Indicadores de Resultado (Post-implementación):**
 - **KPI 1:** Tasa de reprogramación de entrevistas. Meta: < 5% a los 3 meses.
 - **KPI 2:** Porcentaje de solicitudes de entrevista atendidas. Meta: 100%.
 - **KPI 3:** Nivel de satisfacción de fiscales y psicólogos con el nuevo sistema de agendamiento y la calidad de las salas. Meta: > 90%.

5. Cronograma y Presupuesto.


- **Fases del Proyecto:**



N°	DESCRIPCIÓN	COMIENZO	FIN
1	PLANIFICACIÓN	mar 1/07/25	lun 18/08/25
2	Levantamiento de requerimientos funcionales y técnicos	mar 1/07/25	lun 28/07/25
3	Análisis normativo legal	mar 1/07/25	lun 21/07/25
4	Definición de la arquitectura del sistema	mar 29/07/25	lun 18/08/25
5	Conformación del equipo técnico y de gestión	mar 29/07/25	vie 1/08/25
6	DISEÑO Y PROTOTIPADO	mar 19/08/25	lun 20/10/25
7	Diseño de experiencia de usuario (UX/UI)	mar 19/08/25	lun 8/09/25
8	Prototipo navegable y validación	mar 9/09/25	lun 29/09/25
9	Especificaciones funcionales finales	mar 30/09/25	lun 20/10/25
10	DESARROLLO E INTEGRACIÓN	mar 21/10/25	lun 16/03/26
11	Desarrollo de módulos principales	mar 21/10/25	lun 23/02/26
12	Generación de notificaciones y paneles de monitoreo	mar 24/02/26	lun 16/03/26
13	PRUEBAS Y VALIDACIÓN	mar 17/03/26	mié 6/05/26
14	Pruebas unitarias de integración y de sistema	mar 17/03/26	lun 27/04/26
15	Auditoría de seguridad y validación legal	mar 28/04/26	mié 6/05/26
16	CAPACITACIÓN Y DESPLIEGUE	jue 7/05/26	mar 30/06/26
17	Capacitación de operadores y usuarios administrativos	jue 7/05/26	mar 30/06/26
18	Lanzamiento progresivo con plan de contingencia	jue 7/05/26	mar 30/06/26

- **Presupuesto Total Asignado:** S/. 127,600.00
- **Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios.

GRÁFICA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

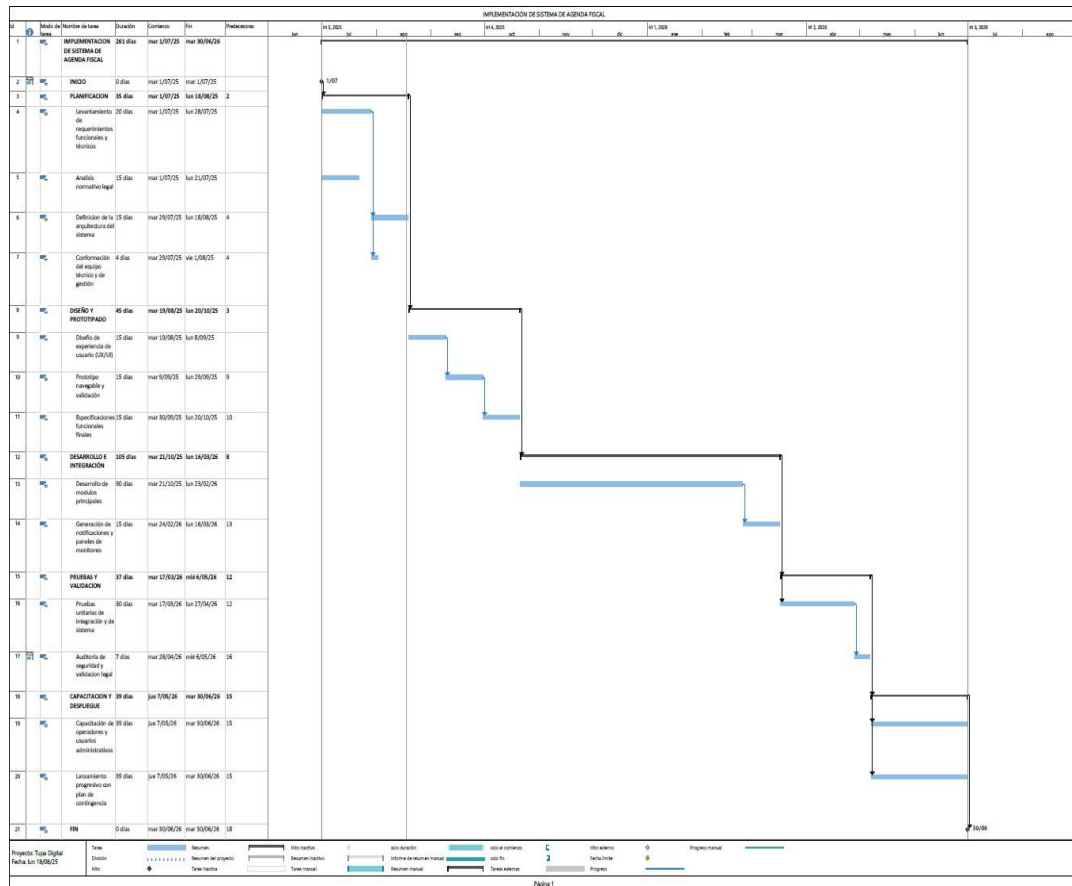

FICHA DE PROYECTO 5

Proyecto: Implementación de un Sistema de Agenda Fiscal para Cámara Gesell.

Código de Proyecto: MP-PGD-005

Fecha de última actualización: 14/08/2025

1. Identificación y Alineamiento Estratégico.

- **Nombre del Proyecto:** Implementación de un Sistema de Agenda Fiscal para Cámara Gesell.
- **Área/Unidad Responsable:** Gerencia de Tecnologías de la Información, en coordinación con las Fiscalías y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
- **Justificación del Proyecto (Problema o Necesidad):** La problemática principal es la **demandas insatisfechas** y las **constantes reprogramaciones** de los procedimientos de entrevista única. Esto se origina por un **manejo poco adecuado y no centralizado de la agenda** de las Cámaras Gesell, lo que causa demoras críticas en los procesos judiciales y la revictimización de personas vulnerables.
- **Objetivo Estratégico del Plan de Gobierno y Transformación Digital al que se alinea:** Mejorar la eficiencia de los servicios de justicia mediante la aplicación de herramientas digitales que optimicen los procesos críticos y aseguren la protección de los derechos de los ciudadanos.
- **Brecha de Capacidad/Servicio que cierra:** El proyecto cierra la brecha de gestión y coordinación, reemplazando un sistema de agendamiento manual o desarticulado por una plataforma centralizada que permite optimizar el uso de la infraestructura existente y garantizar la atención oportuna.

2. Alcance y Objetivos del Proyecto.

- **Objetivo General:** Implementar un sistema informático centralizado para la gestión de la agenda fiscal que optimice la programación de las Cámaras Gesell existentes, con el fin de eliminar las reprogramaciones y satisfacer la demanda de entrevistas únicas de manera eficiente.
- **Objetivos Específicos:**
 - Desarrollar una plataforma web para la solicitud, asignación y consulta de turnos en las Cámaras Gesell.
 - Establecer un protocolo digital estandarizado para la reserva y confirmación de los procedimientos.
 - Proveer visibilidad en tiempo real de la disponibilidad de las salas a todos los actores autorizados.
 - Capacitar a fiscales, psicólogos y personal administrativo en el uso del nuevo sistema de agenda.
- **Principales Entregables:**
 - Software de Agenda Fiscal en producción.
 - Manual de usuario y protocolo de agendamiento oficial.
 - Dashboard con estadísticas de uso, ocupabilidad y reprogramaciones de las salas.
 - Registro de personal capacitado.
- **Fuera del Alcance (Exclusiones):**
 - La adquisición de equipamiento o adecuación física de nuevas Cámaras Gesell.
 - La contratación de personal adicional para la realización de las entrevistas.

3. Impacto y Beneficiarios.

- **Descripción del Impacto Esperado:** Optimizar el uso de las Cámaras Gesell, resultando en una disminución drástica de las cancelaciones y reprogramaciones. Esto acelerará los procesos de investigación y, fundamentalmente, protegerá a las víctimas y testigos de la revictimización asociada a las postergaciones.
- **Impacto Cuantitativo:**
 - Reducción de la tasa de reprogramaciones en más de un 90%.
 - Incremento en el índice de ocupabilidad de las salas existentes en al menos un 30%.
- **Impacto Cualitativo:**
 - Proceso de agendamiento transparente, equitativo y ordenado.
 - Mejora en la coordinación entre las áreas fiscales y los equipos técnicos de las Cámaras Gesell.
 - Fortalecimiento de la percepción de una justicia más ágil y humana.
- **Beneficiarios Directos:** Fiscales, psicólogos, personal administrativo, y principalmente, las víctimas y testigos vulnerables que participan en los procedimientos.
- **Beneficiarios Indirectos:** El sistema de justicia en su conjunto, que se beneficia de una mayor celeridad procesal y una obtención de pruebas más eficiente.

4. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs).

- **Indicadores de Gestión (Durante el proyecto):**
 - **% de Avance del Cronograma (SPI):** Cumplimiento mensual > 0.95.
 - **% de Ejecución Presupuestal (CPI):** Ejecución mensual < 1.05.
 - **Nº de Hitos Completados vs. Planificados:** 100% de cumplimiento.
- **Indicadores de Resultado (Post-implementación):**
 - **KPI 1:** Tasa de reprogramación de entrevistas. Meta: 5% a los 3 meses de la implementación.
 - **KPI 2:** Tasa de ocupabilidad de las Cámaras Gesell. Meta: > 85%.
 - **KPI 3:** Nivel de satisfacción de los usuarios (fiscales, psicólogos) con el sistema. Meta: > 90%.

5. Cronograma y Presupuesto.

- **Fases del Proyecto:**


Nº	DESCRIPCIÓN	COMIENZO	FIN
1	IMPLEMENTACIÓN DE SALA DE ENTREVISTA ÚNICA	mié 1/10/25	mar 9/11/27
2	DIAGNÓSTICO Y DISEÑO	mié 1/10/25	mar 25/11/25
3	Evaluación de requisitos del proyecto	mié 1/10/25	mar 28/10/25
4	Evaluación de costos del proyecto	mié 29/10/25	mar 25/11/25
5	Especificación del prototipo del proyecto	mié 29/10/25	mar 25/11/25
6	SELECCIÓN DE SEDES	mié 26/11/25	mar 13/01/26

7	Validación de las sedes a implementar	mié 26/11/25	mar 23/12/25
8	Elaboración de cronograma de implementación	mié 24/12/25	mar 13/01/26
9	IMPLEMENTACIÓN PILOTO	mié 14/01/26	mar 31/03/26
10	Acondicionamiento	mié 14/01/26	mar 3/02/26
11	Instalación	mié 4/02/26	mar 17/03/26
12	Capacitación	mié 18/03/26	mar 31/03/26
13	EVALUACIÓN	mié 1/04/26	mar 5/05/26
14	Feedback	mié 1/04/26	mar 21/04/26
15	Ajustes	mié 22/04/26	mar 5/05/26
16	ESCALAMIENTO	mié 6/05/26	mar 21/09/27
17	Despliegue por regiones	mié 6/05/26	mar 21/09/27
18	Seguimiento	mié 6/05/26	mar 21/09/27
19	CIERRE	mié 22/09/27	mar 9/11/27
20	Evaluación del impacto	mié 22/09/27	mar 19/10/27
21	Informe Final	mié 20/10/27	mar 9/11/27
22	Propuesta para sostenibilidad	lun 18/10/27	vie 29/10/27

- **Presupuesto Total Asignado:** S/. 33,956.00
- **Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios.



GRÁFICA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

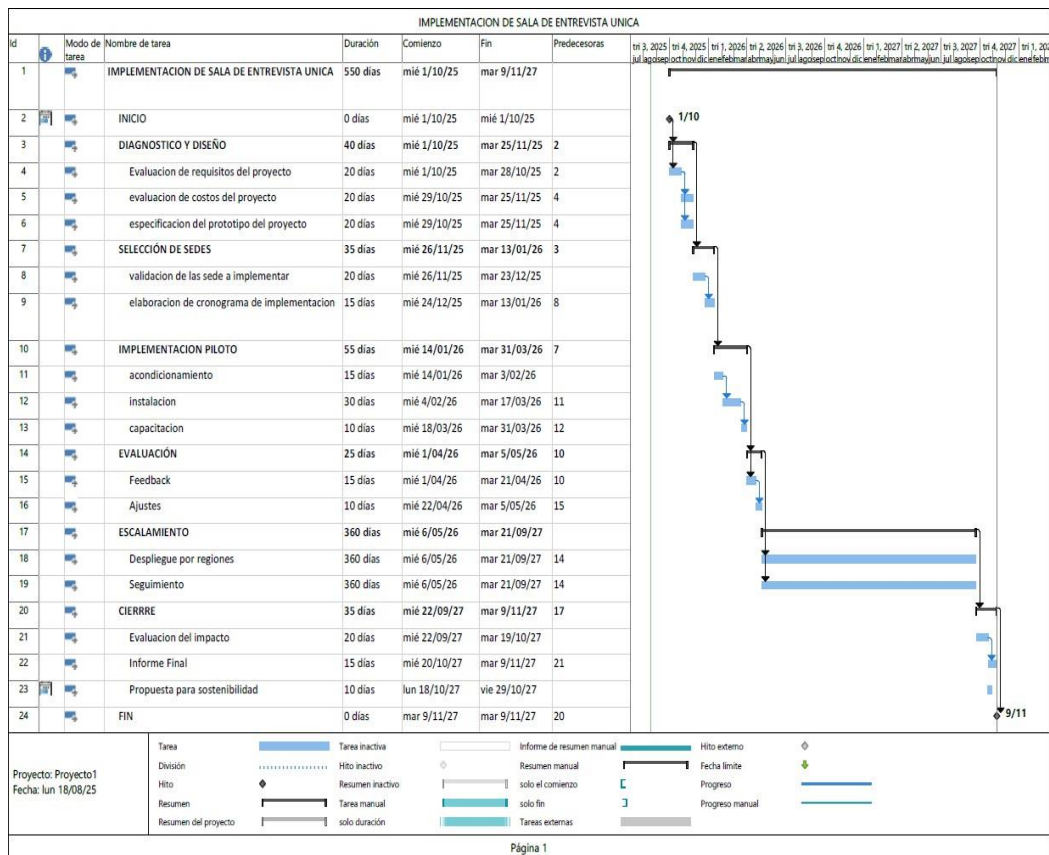

FICHA DE PROYECTO 6

Proyecto: Integración de sistemas fiscales con sistemas médico legales

Código de Proyecto: MP-PGD-006

Fecha de última actualización: 14/08/2025

1. Identificación y Alineamiento Estratégico.

- **Nombre del Proyecto:** Plataforma de Interoperabilidad entre Sistemas Fiscales y Médico Legales.
- **Área/Unidad Responsable:** Gerencia de Tecnologías de la Información, en coordinación con las Fiscalías y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
- **Justificación del Proyecto (Problema o Necesidad):** Actualmente, la falta de integración entre los sistemas fiscales y los sistemas médico legales genera silos de información. Esto obliga a realizar un intercambio manual de datos, lo que provoca demoras significativas en el acceso a pericias y resultados. Esta ineficiencia impide que los despachos fiscales cuenten con **información en tiempo real**, ralentizando las investigaciones y la administración de justicia.
- **Objetivo Estratégico del Plan de Gobierno y Transformación Digital al que se alinea:** Fomentar la transformación digital y el intercambio de información entre entidades para lograr un sistema de justicia integrado, eficiente y ágil.
- **Brecha de Capacidad/Servicio que cierra:** El proyecto cierra la brecha tecnológica de no contar con un canal automatizado, seguro y en tiempo real para el intercambio de información entre dos actores fundamentales del proceso penal, reemplazando procesos manuales lentos por un flujo de trabajo digital y eficiente.

2. Alcance y Objetivos del Proyecto.

- **Objetivo General:** Desarrollar e implementar una plataforma de interoperabilidad que garantice a los fiscales el acceso seguro y en tiempo real a la información y resultados de las pericias médico legales, con el fin de **generar una pronta respuesta** y acelerar la investigación penal para una justicia más rápida y eficaz.
- **Objetivos Específicos:**
 - Definir los estándares técnicos y modelos de datos para el intercambio de información entre los sistemas.
 - Desarrollar los servicios (APIs, middleware) necesarios para conectar las plataformas existentes.
 - Implementar protocolos de seguridad para garantizar la autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos transmitidos.
 - Integrar los flujos de trabajo para permitir solicitudes de pericias y recepción de resultados de forma digital.
- **Principales Entregables:**
 - Plataforma de interoperabilidad (software).
 - Documentación técnica de los servicios (APIs) para la integración.
 - Protocolos de seguridad y de intercambio de información.
 - Manuales de usuario y programa de capacitación para los nuevos flujos de trabajo integrados.
- **Fuera del Alcance (Exclusiones):**
 - El rediseño o reemplazo completo de los sistemas fiscales o médico legales existentes.
 - La ejecución de los procedimientos periciales físicos.
 - Modificaciones al marco normativo de los procedimientos.

3. Impacto y Beneficiarios.

- **Descripción del Impacto Esperado:** Una aceleración significativa en los tiempos de investigación. Los fiscales podrán tomar decisiones más informadas y rápidas al tener la información pericial crítica disponible de inmediato en sus sistemas de trabajo, resultando en una administración de justicia más efectiva.
- **Impacto Cuantitativo:**
 - Reducción del tiempo promedio para la recepción digital de un informe pericial en un 50%.
 - Eliminación del 100% de los errores asociados a la transcripción manual de datos.
- **Impacto Cualitativo:**
 - Mejora en la calidad de la toma de decisiones fiscales.
 - Mayor trazabilidad y auditoría de las solicitudes y respuestas de información.
 - Fortalecimiento de la colaboración entre fiscales y peritos.
- **Beneficiarios Directos:** Fiscales, personal administrativo de los despachos fiscales y personal técnico del Instituto de Medicina Legal.
- **Beneficiarios Indirectos:** La ciudadanía (víctimas, investigados) que se beneficia de procesos judiciales más rápidos, y el sistema de justicia en su conjunto.

4. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs).

- **Indicadores de Gestión (Durante el proyecto):**
 - **% de Avance del Cronograma (SPI):** Cumplimiento mensual > 0.95.
 - **% de Ejecución Presupuestal (CPI):** Ejecución mensual < 1.05.
 - **Nº de Hitos Completados vs. Planificados:** 100% de cumplimiento.
- **Indicadores de Resultado (Post-implementación):**
 - **KPI 1:** Tiempo promedio desde la solicitud fiscal hasta la recepción digital del resultado pericial.
 - **KPI 2:** Porcentaje de solicitudes y envíos de resultados realizados a través de la plataforma. Meta: 100%.
 - **KPI 3:** Nivel de satisfacción de los fiscales con la oportunidad y accesibilidad de la información. Meta: > 90%.

5. Cronograma y Presupuesto.


Nº	DESCRIPCIÓN	COMIENZO	FIN
1	PLANIFICACIÓN	mar 1/04/25	lun 28/07/25
2	Levantamiento de requerimientos funcionales y técnicos	mar 1/04/25	lun 19/05/25
3	Conformación del equipo técnico y de gestión	mar 1/04/25	lun 7/04/25
4	Análisis normativo legal	mar 20/05/25	lun 30/06/25



5	Definición de la arquitectura del sistema	mar 1/07/25	lun 28/07/25
6	DISEÑO Y PROTOTIPADO	mar 29/07/25	lun 29/09/25
7	Diseño de experiencia de usuario (UX/UI)	mar 29/07/25	lun 18/08/25
8	Prototipo navegable y validación	mar 19/08/25	lun 1/09/25
9	Especificaciones funcionales finales	mar 2/09/25	lun 29/09/25
10	DESARROLLO E INTEGRACIÓN	mar 30/09/25	mar 8/12/26
11	Desarrollo de módulos principales	mar 30/09/25	lun 6/07/26
12	Generación de notificaciones y paneles de monitoreo	mar 7/07/26	mar 8/12/26
13	PRUEBAS Y VALIDACIÓN	mié 9/12/26	jue 28/01/27
14	Pruebas unitarias de integración y de sistema	mié 9/12/26	mar 19/01/27
15	Auditoría de seguridad y validación legal	mié 20/01/27	jue 28/01/27
16	CAPACITACIÓN Y DESPLIEGUE	vie 29/01/27	jue 25/03/27
17	Capacitación de operadores y usuarios administrativos	vie 29/01/27	jue 25/03/27
18	Lanzamiento progresivo con plan de contingencia	vie 29/01/27	jue 25/03/27

- **Presupuesto Total Asignado:** S/. 777,600.00
- **Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios.

GRÁFICA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

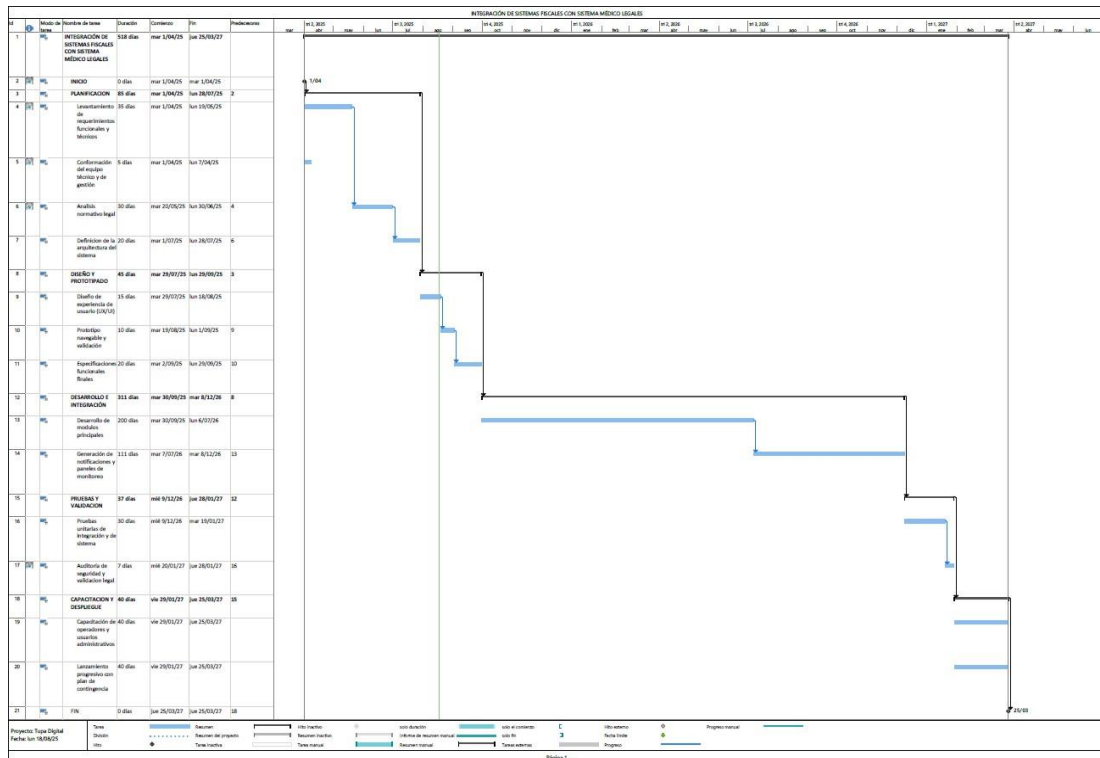

FICHA DE PROYECTO 7

Proyecto: Implementación de la Plataforma de Servicios TUPA Digital del Ministerio Público.

Código de Proyecto: MP-PGD-007

Fecha de última actualización: 14/08/2025

1. Identificación y Alineamiento Estratégico.

- **Nombre del Proyecto:** Implementación de la Plataforma de Servicios TUPA Digital del Ministerio Público.
- **Área/Unidad Responsable:** Gerencia de Tecnologías de la Información, en coordinación con la Gerencia de Atención al Ciudadano y las unidades orgánicas responsables de los procedimientos TUPA.
- **Justificación del Proyecto (Problema o Necesidad):** La problemática actual es que **los ciudadanos tienen que desplazarse físicamente** a las sedes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) y a los Despachos Fiscales para solicitar y gestionar los servicios del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). Esto genera costos de tiempo y dinero para los usuarios, congestión en las sedes y representa una barrera de acceso.
- **Objetivo Estratégico del Plan de Gobierno y Transformación Digital al que se alinea:** Modernizar la administración pública a través de la creación de servicios digitales accesibles, centrados en el ciudadano y que simplifiquen los trámites administrativos, conforme a la política de Gobierno y Transformación Digital.
- **Brecha de Capacidad/Servicio que cierra:** El proyecto cierra la brecha de **acceso digital**, transformando un modelo de atención presencial a uno digital. Esto permite que los servicios administrativos estén disponibles para cualquier ciudadano con acceso a internet, sin importar su ubicación geográfica, 24 horas al día.

2. Alcance y Objetivos del Proyecto.

- **Objetivo General:** Implementar una plataforma digital centralizada (Ventanilla Única Digital) que permita a los ciudadanos solicitar, pagar, y dar seguimiento en línea a los servicios TUPA del Ministerio Público, eliminando la necesidad de realizar trámites presenciales.
- **Objetivos Específicos:**
 - Desarrollar un portal web público, intuitivo y accesible para la gestión de todos los trámites TUPA.
 - Integrar la plataforma con una pasarela de pagos en línea segura.
 - Digitalizar y automatizar los flujos de trabajo internos para la atención de las solicitudes.
 - Implementar un sistema de notificaciones digitales para mantener informado al ciudadano sobre el estado de su trámite.
- **Principales Entregables:**
 - Portal web de "Servicios TUPA Digital" operativo.
 - Integración funcional con una plataforma de pagos en línea.
 - Módulo de gestión interna para el personal del Ministerio Público.
 - Campaña de difusión y manuales para guiar a los ciudadanos en el uso de la plataforma.
- **Fuera del Alcance (Exclusiones):**
 - La modificación de los requisitos o costos de los procedimientos TUPA existentes.
 - La digitalización de servicios que no estén incluidos en el TUPA institucional.
 - Procedimientos que, por mandato legal expreso, requieran la presencia física del ciudadano.

3. Impacto y Beneficiarios.

- **Descripción del Impacto Esperado:** Se espera una mejora radical en el acceso de la ciudadanía a los servicios administrativos, generando un ahorro significativo de tiempo y costos para el público. Además, se reducirá la carga de trabajo administrativo en las sedes físicas y se proyectará una imagen de una institución moderna y transparente.
- **Impacto Cuantitativo:**
 - Reducción de los trámites TUPA presenciales en un 90%.
 - Disminución del tiempo promedio de atención por trámite en un 50%.
 - Disponibilidad de la plataforma para iniciar trámites 24/7.
- **Impacto Cualitativo:**
 - Incremento notable en la satisfacción ciudadana.
 - Mayor transparencia y trazabilidad de los expedientes administrativos.
 - Mayor equidad en el acceso a los servicios para ciudadanos de zonas rurales o alejadas.
- **Beneficiarios Directos:** Todos los ciudadanos y personas jurídicas que requieran realizar trámites administrativos ante el Ministerio Público.
- **Beneficiarios Indirectos:** El personal administrativo del Ministerio Público, cuyo trabajo será más ordenado y eficiente, y la institución en su conjunto, por la optimización de recursos y la mejora de su imagen pública.

4. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs).

- **Indicadores de Gestión (Durante el proyecto):**
 - **% de Avance del Cronograma (SPI):** Cumplimiento mensual > 0.95.
 - **% de Ejecución Presupuestal (CPI):** Ejecución mensual < 1.05.
 - **Nº de Hitos Completados vs. Planificados:** 100% de cumplimiento.
- **Indicadores de Resultado (Post-implementación):**
 - **KPI 1:** Porcentaje de trámites TUPA iniciados por el canal digital. Meta: > 90%.
 - **KPI 2:** Nivel de satisfacción del ciudadano con la plataforma digital. Meta: > 85%.
 - **KPI 3:** Tiempo promedio de resolución de un trámite TUPA digital. Meta: Reducción del 50% respecto al trámite presencial.

5. Cronograma y Presupuesto.

- **Fases del Proyecto:**


Nº	DESCRIPCIÓN	COMIENZO	FIN
1	PLANIFICACIÓN	lun 5/01/26	vie 19/06/26
2	Levantamiento de requerimientos funcionales y técnicos	lun 5/01/26	vie 13/02/26
3	Conformación del equipo técnico y de gestión	lun 5/01/26	vie 9/01/26
4	Estudio de servicios brindados por el Ministerio Público	lun 16/02/26	vie 27/03/26
5	Análisis normativo legal	lun 30/03/26	vie 8/05/26



6	Definición de la arquitectura del sistema	lun 11/05/26	vie 19/06/26
7	DISEÑO Y PROTOTIPADO	lun 22/06/26	vie 28/08/26
8	Diseño de experiencia de usuario (UX/UI)	lun 22/06/26	vie 10/07/26
9	Prototipo navegable y validación	lun 13/07/26	vie 31/07/26
10	Especificaciones funcionales finales	lun 3/08/26	vie 28/08/26
11	DESARROLLO E INTEGRACIÓN	lun 31/08/26	jue 1/07/27
12	Desarrollo de módulos principales	lun 31/08/26	vie 18/06/27
13	Integración con sistemas del Ministerio	lun 28/09/26	vie 12/02/27
14	Generación de notificaciones y paneles de monitoreo	lun 21/06/27	jue 1/07/27
15	PRUEBAS Y VALIDACIÓN	vie 2/07/27	jue 29/07/27
16	Pruebas unitarias de integración y de sistema	vie 2/07/27	jue 29/07/27
17	Auditoría de seguridad y validación legal	vie 2/07/27	jue 29/07/27
18	CAPACITACIÓN Y DESPLIEGUE	vie 30/07/27	jue 23/09/27
19	Capacitación de operadores y usuarios administrativos	vie 30/07/27	jue 23/09/27
20	Lanzamiento progresivo con plan de contingencia	vie 30/07/27	jue 23/09/27

- **Presupuesto Total Asignado:** S/. 288,000.00
- **Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios.

GRÁFICA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

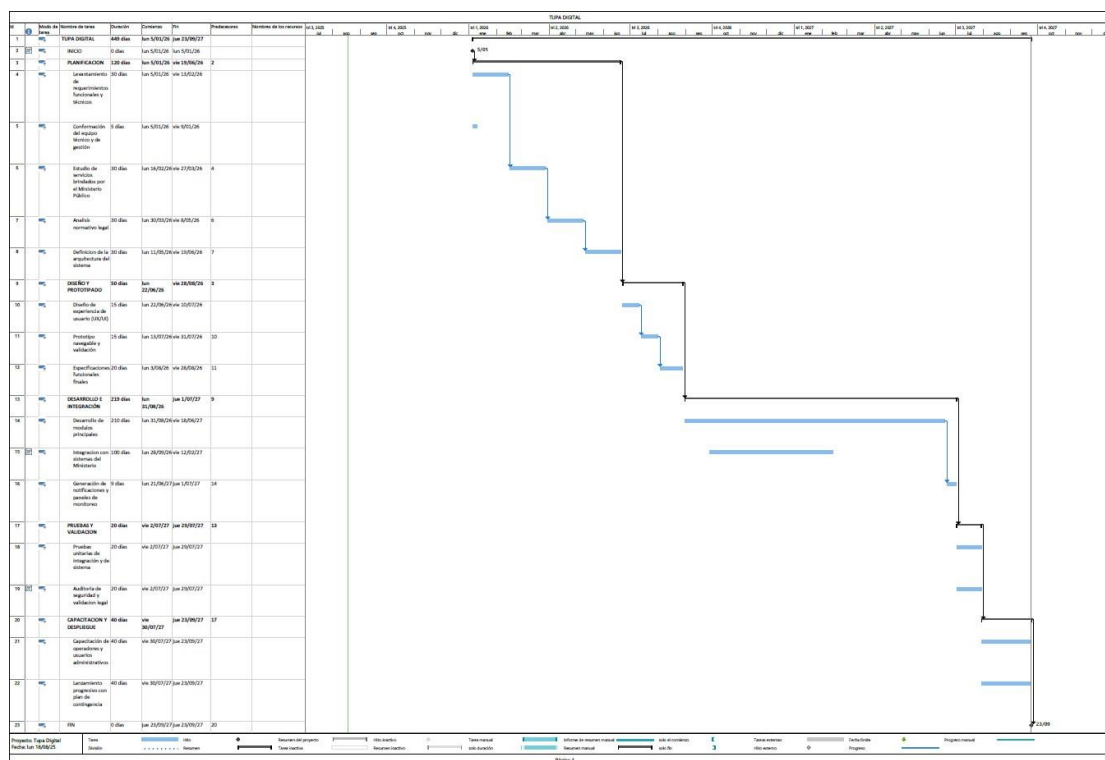

FICHA DE PROYECTO 8

Proyecto: Implementación de la Carpeta Fiscal Electrónica

Código de Proyecto: MP-PGD-008

Fecha de última actualización: 14/08/2025

1. Identificación y Alineamiento Estratégico.

- **Nombre del Proyecto:** Implementación de la Carpeta Fiscal Electrónica.
- **Área/Unidad Responsable:** Gerencia de Tecnologías de la Información, en coordinación con la Unidad Ejecutora N°11 y los Despachos Fiscales.
- **Justificación del Proyecto (Problema o Necesidad):** La gestión de la carpeta fiscal en formato físico es un proceso obsoleto que genera lentitud, altos costos operativos y graves riesgos de seguridad. Para superar esta barrera, se requiere una solución integral que no solo desarrolle un software, sino que también establezca la infraestructura, la seguridad y la gestión del cambio necesarias para una transformación digital exitosa.
- **Objetivo Estratégico del Plan de Gobierno y Transformación Digital al que se alinea:** Liderar la transformación digital del sistema de justicia con una política de "cero papel" en los procesos misionales, garantizando la eficiencia, seguridad y transparencia de la labor fiscal.
- **Brecha de Capacidad/Servicio que cierra:** El proyecto cierra brechas críticas en múltiples frentes: **software** (carencia de una plataforma centralizada), **infraestructura** (hardware insuficiente), **digitalización** (documentos en físico), **seguridad** (riesgos de la gestión manual) y **cultura organizacional** (resistencia al cambio).

2. Alcance y Objetivos del Proyecto.

- **Objetivo General:** Implementar una solución integral y segura para la Carpeta Fiscal Electrónica que permita la gestión completamente digital de las investigaciones, abarcando el desarrollo de software, la adecuación de la infraestructura tecnológica y de data center, la digitalización de documentos, un marco de seguridad robusto y una efectiva gestión del cambio.
- **Objetivos Específicos por Componente:**
 - **a) Componente SW:** Desarrollar y desplegar la plataforma de software de la Carpeta Fiscal Electrónica con todas las funcionalidades requeridas para el ciclo de vida de la investigación.
 - **b) Componente Infraestructura Tecnológica:** Adquirir, configurar e implementar la infraestructura de servidores, comunicaciones y equipamiento de usuario final necesario para el correcto funcionamiento del sistema a nivel nacional.
 - **c) Componente Infraestructura para Data Center:** Implementar y/o adecuar la infraestructura del centro de datos para garantizar la alta disponibilidad, escalabilidad y rendimiento que requiere el sistema.
 - **d) Componente Digitalización:** Diseñar y ejecutar el proceso masivo de digitalización de las carpetas fiscales en trámite para su migración a la nueva plataforma.
 - **e) Componente Framework de Seguridad:** Establecer un marco de seguridad de la información que proteja los activos de información del proyecto, incluyendo políticas, controles y monitoreo.
 - **f) Componente Gestión del Cambio:** Planificar y ejecutar estrategias de comunicación, sensibilización y capacitación para asegurar la correcta adopción de la nueva herramienta y procesos por parte de los usuarios.
- **Principales Entregables:**
 - Plataforma de Carpeta Fiscal Electrónica operativa.

- Infraestructura tecnológica y Data Center implementados y funcionando.
- Centro de digitalización operativo y un volumen definido de carpetas migradas.
- Marco de Seguridad de la Información implementado.
- Programa nacional de capacitación y comunicación ejecutado.
- **Fuera del Alcance (Exclusiones):**
 - El desarrollo del Expediente Judicial Electrónico (Poder Judicial).
 - La digitalización del archivo histórico de casos cerrados.

3. Impacto y Beneficiarios.

- **Descripción del Impacto Esperado:** Una transformación completa de la gestión fiscal, logrando procesos más rápidos, seguros y transparentes. Se espera una optimización radical de los recursos y un fortalecimiento de las capacidades de investigación.
- **Impacto Cuantitativo:**
 - Reducción de costos de papel, impresión y almacenamiento cercanos al 100%.
 - Disminución del tiempo de acceso a un expediente de días a segundos.
- **Impacto Cualitativo:**
 - Aumento exponencial de la seguridad, integridad y confidencialidad de la información.
 - Facilitación del teletrabajo para el personal fiscal con acceso seguro a sus casos.
- **Beneficiarios Directos:** Fiscales, fiscales adjuntos y personal administrativo de todos los despachos fiscales.
- **Beneficiarios Indirectos:** Abogados, el Poder Judicial, la Policía Nacional, y la ciudadanía que se beneficia de una justicia más moderna y eficaz.

4. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs).

- **Indicadores de Gestión (Durante el proyecto):**
 - **% de Avance del Cronograma (SPI):** Cumplimiento mensual > 0.9.
 - **% de Ejecución Presupuestal (CPI):** Ejecución mensual < 1.1.
 - **Nº de Hitos Completados vs. Planificados:** 100% de cumplimiento.
- **Indicadores de Resultado (Post-implementación):**
 - **KPI 1:** Porcentaje de nuevas investigaciones gestionadas 100% en formato digital. Meta: 95% a los 6 meses del despliegue.
 - **KPI 2:** Nivel de adopción y satisfacción del personal fiscal con la plataforma. Meta: > 90%.
 - **KPI 3:** Disponibilidad del servicio (Uptime) del Data Center. Meta: 99.9%.

5. Cronograma y Presupuesto.

- **Fases del Proyecto:**

Nº	DESCRIPCIÓN	COMIENZO	FIN
1	PRODUCTO 1. IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	mié 1/01/25	jue 31/12/26
2	Construcción de centro tecnologías y comunicación: Construcción Data Center de Sede Principal.	mié 1/01/25	jue 31/12/26



3	Construcción de centro de tecnologías y comunicación: Implementación de data center de contingencia.	mié 1/01/25	jue 31/12/26
4	Construcción de centro de tecnologías y comunicación: Adecuación física de un data center de nodos.	mié 1/01/25	jue 31/12/26
5	Otras acciones de infraestructura: Implementación de infraestructura de sedes remotas.	mié 1/01/25	jue 31/12/26
6	PRODUCTO 2. IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	mié 1/01/25	jue 31/12/26
7	Adquisición de estación de trabajo: Adquisición de equipamiento informático (Equipos para fiscales KIT: Computadora personal portátil, Docking station, teclado y mouse inalámbrico y monitor LED 23.8).	mié 1/01/25	jue 31/12/26
8	Adquisición de equipo de otros activos complementarios: Computadoras de escritorio, monitor 27 pulgadas, teclado, mouse y Token Criptográfico.	mié 1/01/25	jue 31/12/26
9	Adquisición de equipo de otros activos complementarios: Adquisición de otro equipamiento informático (UPS, impresoras térmicas, escáner OCR, ticketero, televisores, huellero y repuestos).	mié 1/01/25	jue 31/12/26
10	Otras acciones de equipamiento: Implementación de Infraestructura de Red.	mié 1/01/25	jue 31/12/26
11	PRODUCTO 3. IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE DIGITALIZACIÓN DE CERTIFICADOS	mié 1/01/25	jue 31/12/26
12	Implementación de centro de tecnologías y comunicación: Acondicionamiento e implementación de centros de digitalización.	mié 1/01/25	jue 31/12/26
13	PRODUCTO 4. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE INTEGRACIÓN DE LA CARPETA FISCAL ELECTRÓNICA	mié 1/01/25	jue 31/12/26
14	Implementación de sistema: Implementación de mesa de partes electrónica y procesos fiscales comunes y especializados, así como de las áreas de apoyo al trabajo fiscal.	mié 1/01/25	jue 31/12/26
15	Implementación de sistema: Desarrollo e implementación a nivel de piloto del	mié 1/01/25	jue 31/12/26



	componente del sistema de notificación electrónica y de mesa de partes electrónica.		
16	Implementación de sistema: Desarrollo e implementación de los demás componentes de la carpeta fiscal electrónica e interoperabilidad.	mié 1/01/25	jue 31/12/26
17	Implementación de sistema: Implementación de Software Especializado (Implementación de Software de Base de Datos y Software Base tipo Middleware - Etapa I)	mié 1/01/25	jue 31/12/26
18	Implementación de infraestructura de almacenamiento: Implementación de Infraestructura de Procesamiento y Almacenamiento	mié 1/01/25	jue 31/12/26
19	Otras acciones de intangibles: Mapeo de procesos de alto nivel de la mesa de partes electrónica	mié 1/01/25	jue 31/12/26
20	Implementación de sistema: Implementación de Software Especializado (Implementación de Otros Softwares Especializados - Etapa II)	mié 1/01/25	jue 31/12/26
21	PRODUCTO 5. FRAMEWORK DE SEGURIDAD	mié 1/01/25	jue 31/12/26
22	Implementación de sistema: Implementación de un sistema de seguridad de información.	mié 1/01/25	jue 31/12/26
23	Capacitación, concientización y simulación de ataques de Phishing y Ransomware	mié 1/01/25	jue 31/12/26
24	Implementación de auditoría interna y externa de certificación	mié 1/01/25	jue 31/12/26
25	PRODUCTO 6. IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE CAMBIOS	mié 1/01/25	jue 31/12/26
26	Capacitación de gestión institucional: Capacitación de gestión de cambio del Sistema Fiscal.	mié 1/01/25	jue 31/12/26
27	Otras acciones de intangibles: Capacitación en transformación digital	mié 1/01/25	jue 31/12/26

- **Presupuesto Total Asignado:** S/. 456,602,589.65

- **Fuente de Financiamiento:** FINANCIAMIENTO

FICHA DE PROYECTO 9

Proyecto: Sistema de Georreferenciación para Toma de Decisiones

Código de Proyecto: MP-PGD-009

Fecha de última actualización: 14/08/2025

1. Identificación y Alineamiento Estratégico.

- **Nombre del Proyecto:** Sistema de Georreferenciación y Visualización de Datos para la Toma de Decisiones.
- **Área/Unidad Responsable:** Gerencia de Tecnologías de la Información, en coordinación con la Oficina de Racionalización y Estadística, y los Despachos Fiscales.
- **Justificación del Proyecto (Problema o Necesidad):** La información crítica para la toma de decisiones se encuentra dispersa en diferentes sistemas y se presenta en formatos estáticos (reportes, tablas). Esto dificulta la capacidad de los directivos para analizar datos de manera integrada, identificar patrones geográficos (mapas del delito), y comprender tendencias de forma intuitiva, limitando una gestión estratégica basada en evidencia.
- **Objetivo Estratégico del Plan de Gobierno y Transformación Digital al que se alinea:** Impulsar una cultura de toma de decisiones basada en datos mediante la implementación de herramientas de inteligencia de negocio y analítica que mejoren la planificación estratégica y la eficiencia operativa.
- **Brecha de Capacidad/Servicio que cierra:** El proyecto cierra la brecha analítica, pasando de un modelo de reportería reactiva a uno de análisis proactivo. Provee la capacidad de transformar datos crudos en visualizaciones interactivas (mapas, gráficos) que facilitan la comprensión y el análisis para usuarios no técnicos.

2. Alcance y Objetivos del Proyecto.

- **Objetivo General:** Implementar un **sistema de visualización de datos interactivo** y georreferenciado que integre información de múltiples fuentes para **facilitar la toma de decisiones basada en datos**, mejorar la accesibilidad a la información y fomentar la transparencia en la gestión.
- **Objetivos Específicos:**
 - Desarrollar un tablero de control (dashboard) interactivo con un componente central de visualización geográfica (mapas).
 - Integrar la plataforma con las principales fuentes de datos institucionales (sistemas de casos, estadísticas delictivas, datos de recursos, etc.).
 - Proveer herramientas de consulta y filtrado que permitan a los usuarios **identificar tendencias y analizar el rendimiento** de manera autónoma.
 - Capacitar a directivos y equipos operativos en el uso de la herramienta para fomentar su aplicación en la gestión diaria.
- **Principales Entregables:**
 - Plataforma de Inteligencia de Negocios (BI) con capacidades geoespaciales (GIS).
 - Tableros de control interactivos con mapas delictivos, indicadores de rendimiento y asignación de recursos.
 - Procesos de extracción, transformación y carga (ETL) desde los sistemas de origen.
 - Programa de capacitación y manuales de usuario.
- **Fuera del Alcance (Exclusiones):**
 - La generación de los datos primarios (el sistema consume información ya existente).
 - La toma de decisiones final (la plataforma es una herramienta de apoyo).
 - La modificación de los sistemas de origen de donde se extraen los datos.

3. Impacto y Beneficiarios.

- **Descripción del Impacto Esperado:** Una mejora sustancial en la calidad y agilidad de las decisiones estratégicas y operativas. Los directivos podrán identificar focos delictivos (hotspots), asignar recursos de manera más eficiente, monitorear el desempeño de los despachos y comunicar resultados de forma clara, promoviendo la transparencia.
- **Impacto Cuantitativo:**
 - Reducción del tiempo necesario para generar informes analíticos complejos en un 70%.
 - Optimización en la asignación de recursos fiscales basada en la incidencia delictiva georreferenciada.
- **Impacto Cualitativo:**
 - Mejora de la planificación estratégica y la gestión de recursos.
 - Aumento de la transparencia sobre el desempeño institucional.
 - Fomento de una cultura organizacional orientada a los datos.
- **Beneficiarios Directos:** Altos directivos (Fiscal de la Nación, Gerentes), Presidentes de Junta de Fiscales, jefes de equipos operativos y analistas de información.
- **Beneficiarios Indirectos:** Fiscales (cuya carga y recursos serán mejor gestionados) y la ciudadanía (que se beneficia de una persecución del delito más eficaz y estratégica).

4. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs).

- **Indicadores de Gestión (Durante el proyecto):**
 - **% de Avance del Cronograma (SPI):** Cumplimiento mensual > 0.95.
 - **% de Ejecución Presupuestal (CPI):** Ejecución mensual < 1.05.
 - **Nº de Hitos Completados vs. Planificados:** 100% de cumplimiento.
- **Indicadores de Resultado (Post-implementación):**
 - **KPI 1:** Frecuencia de uso de los tableros por parte de los directivos. Meta: 80% de los directivos objetivo utilizan la herramienta semanalmente.
 - **KPI 2:** Nivel de satisfacción del usuario con la utilidad e intuición de la plataforma. Meta: > 85%.
 - **KPI 3:** Número de decisiones estratégicas (ej. creación de fiscalías, planes de prevención), sustentadas formalmente con datos del sistema.

5. Cronograma y Presupuesto.

- **Fases del Proyecto:**


Nº	DESCRIPCIÓN	COMIENZO	FIN
1	RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y DEFINICIÓN DE ALCANCE	mar 1/04/25	lun 14/04/25
2	Evaluación de necesidad y análisis del proyecto	mar 1/04/25	lun 14/04/25
3	DESARROLLO	mar 15/04/25	lun 20/04/26



4	Generación de data para generación de mapas y cuadros	mar 15/04/25	lun 9/06/25
5	Modificación del mapa de calor, mostrado por porcentajes, número de denuncias y delito denunciado	mar 15/04/25	lun 12/05/25
6	Gráficos de calor, frecuencias absolutas, porcentaje y tasas en gráficos de pastel, barras, tendencias y delito denunciado	mar 13/05/25	lun 9/06/25
7	Tabla de los datos del mapa en frecuencias absolutas, porcentaje y tasas en tablas	mar 13/05/25	lun 9/06/25
8	Generación de archivo exportable para cada dashboard	mar 13/05/25	lun 9/06/25
9	PRESENTACIÓN DE VERSIÓN 01	mar 10/06/25	lun 14/07/25
10	Presentación de la versión 1	mar 10/06/25	lun 23/06/25
11	Levantamiento de Observaciones y entrega del producto	mar 24/06/25	lun 14/07/25
12	PRESENTACIÓN VERSIÓN 02	mar 15/07/25	lun 11/08/25
13	presentación de la versión 2	mar 15/07/25	mié 16/07/25
14	Levantamiento de Observaciones y entrega del producto	mar 15/07/25	lun 11/08/25
15	Desarrollo de módulos posteriores	mar 12/08/25	lun 23/03/26
16	Desarrollo de módulos posteriores	mar 12/08/25	lun 23/03/26
17	Capacitación	mar 24/03/26	lun 20/04/26
18	Desarrollo de capacitación	mar 24/03/26	lun 20/04/26
19	FASE DE CIERRE	mar 21/04/26	lun 1/06/26
20	Acta de cierre y entrega del producto, recomendaciones y buenas prácticas	mar 21/04/26	lun 1/06/26

- **Presupuesto Total Asignado:** S/.520,000.00
- **Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios.

GRÁFICA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

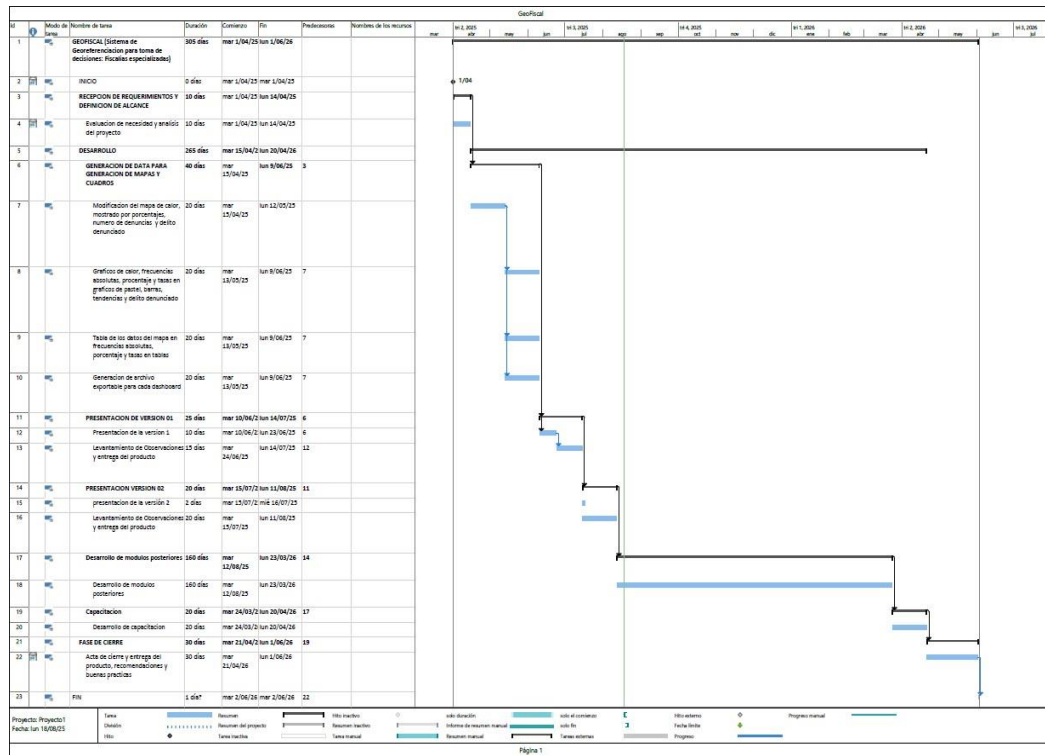

FICHA DE PROYECTO 10

Proyecto: Servicio de Interconexión de la Red de Comunicaciones para las Sedes del Ministerio Público a nivel nacional

Código de Proyecto: MP-PGD-010

Fecha de última actualización: 14/08/2025.

1. Identificación y Alineamiento Estratégico.

- **Nombre del Proyecto:** Servicio de Interconexión de la Red de Comunicaciones para las Sedes del Ministerio Público a Nivel Nacional (Red WAN).
- **Área/Unidad Responsable:** Gerencia de Tecnologías de la Información.
- **Justificación del Proyecto (Problema o Necesidad):** La Red WAN es un servicio crítico que habilita todas las operaciones digitales del Ministerio Público. El contrato de servicio actual está próximo a vencer. Este proyecto es indispensable para **mantener la continuidad** de los servicios de transmisión de datos, voz e internet, sin los cuales los sistemas fiscales, el correo electrónico, y las comunicaciones colapsarían. La no ejecución de este proyecto resultaría en la desconexión total de las sedes, paralizando las operaciones de la entidad a nivel nacional.
- **Objetivo Estratégico del Plan de Gobierno y Transformación Digital al que se alinea:** Garantizar la continuidad operativa y la resiliencia de la plataforma tecnológica institucional, la cual soporta todos los servicios digitales que se brindan al personal y a la ciudadanía.
- **Brecha de Capacidad/Servicio que cierra:** Este proyecto previene que se genere una brecha crítica en el servicio de conectividad. Asegura la continuidad de la "autopista digital" que interconecta a toda la institución, evitando el riesgo de un retroceso a sedes aisladas e incomunicadas.

2. Alcance y Objetivos del Proyecto.

- **Objetivo General:** Asegurar la continuidad del servicio de interconexión de la Red de Comunicaciones (WAN) para todas las sedes del Ministerio Público a nivel nacional, mediante la contratación de una **plataforma tecnológica que utilice protocolos estándares de la industria** para la transmisión segura y eficiente de datos, voz e internet.
- **Objetivos Específicos:**
 - Realizar el proceso de contratación para la renovación del servicio WAN.
 - Asegurar que el nuevo servicio cumpla o supere los estándares actuales de disponibilidad, ancho de banda y seguridad.
 - Gestionar la transición o migración hacia el nuevo servicio garantizando una afectación mínima o nula a los usuarios.
 - Establecer un Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS/SLA) que garantice alta disponibilidad y tiempos de respuesta óptimos ante incidentes.
- **Principales Entregables:**
 - Contrato del servicio de interconexión firmado con el proveedor adjudicado.
 - Plan de migración y transición ejecutado exitosamente.
 - Servicio WAN operativo bajo las nuevas condiciones contractuales.
 - Documento de Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA).
- **Fuera del Alcance (Exclusiones):**
 - La gestión de las redes internas (LAN) de cada sede.
 - Las aplicaciones o sistemas que utilizan la red (el proyecto provee el medio de transporte).
 - La adquisición de equipos de cómputo o telefonía para los usuarios finales.

3. Impacto y Beneficiarios.

- **Descripción del Impacto Esperado:** El impacto fundamental es la **garantía de la continuidad operativa** del Ministerio Público. Todos los sistemas de información, herramientas de colaboración y comunicaciones seguirán estando disponibles, permitiendo que el personal fiscal y administrativo desempeñe sus funciones sin interrupciones a nivel nacional.
- **Impacto Cuantitativo:**
 - Garantizar una disponibilidad (uptime) de la red superior al 99.8% entre todas las sedes.
 - Mantener o mejorar los anchos de banda actuales para soportar la demanda de los servicios institucionales.
- **Impacto Cualitativo:**
 - Mitigación del riesgo crítico de paralización institucional por falta de conectividad.
 - Estabilidad y confianza para todos los usuarios de los servicios digitales.
 - Sostenibilidad de la colaboración y el intercambio de información en tiempo real a nivel nacional.
- **Beneficiarios Directos:** La totalidad de los colaboradores del Ministerio Público a nivel nacional, cuyo trabajo diario depende de la red de comunicaciones.
- **Beneficiarios Indirectos:** La ciudadanía y los usuarios del sistema de justicia, dado que la institución podrá seguir operando y brindando sus servicios sin interrupciones.

4. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs).

- **Indicadores de Gestión (Durante el proyecto):**
 - **% de Avance del Cronograma (SPI):** Cumplimiento mensual > 0.95 (crítico para evitar vencimiento de contrato actual).
 - **% de Ejecución Presupuestal (CPI):** Ejecución mensual < 1.05.
 - **Nº de Hitos Completados vs. Planificados:** 100% de cumplimiento.
- **Indicadores de Resultado (Post-implementación):**
 - **KPI 1:** Disponibilidad del Servicio (Uptime) medido mensualmente. Meta: ≥ 99.8%.
 - **KPI 2:** Cumplimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) por parte del proveedor.
 - **KPI 3:** Nivel de satisfacción del usuario con el rendimiento de la red. Meta: > 90%.

5. Cronograma y Presupuesto.

- **Fases del Proyecto:**


Nº	DESCRIPCIÓN	COMIENZO	FIN
1	PLANIFICACION Y ANALISIS	mié 1/10/25	mar 3/03/26
2	Comunicar cronograma a Gerencia ORECOM	mié 1/10/25	mar 7/10/25
3	Identificación de necesidad	mié 8/10/25	mar 4/11/25
4	Solicitud de Requerimientos a nivel nacional	mié 5/11/25	mar 2/12/25



5	Análisis de requerimientos y necesidades con OSIS/ OSOP/ Oficial de Seguridad /Oficial de Datos/ UE 011/ Informática a nivel nacional	mié 3/12/25	mar 30/12/25
6	Análisis de Riesgos	mié 31/12/25	mar 13/01/26
7	Evaluación de soluciones tecnológicas	mié 14/01/26	mar 27/01/26
8	Primer Borrador TDR	mié 28/01/26	mar 10/02/26
9	Segundo Borrador	mié 11/02/26	mar 17/02/26
10	Revisión Final TDR/ Matriz de Cumplimiento	mié 18/02/26	mar 3/03/26
11	ADQUISICIÓN	mié 4/03/26	mar 18/08/26
12	Estudio de Mercado	mié 4/03/26	mar 7/04/26
13	Proceso de Selección	mié 8/04/26	mar 16/06/26
14	Convocatoria de proceso	mié 17/06/26	mar 28/07/26
15	Firma de contrato	mié 29/07/26	mar 18/08/26
16	Implementación	mié 19/08/26	mar 29/12/26
17	Plan de trabajo y aprobación	mié 19/08/26	mar 8/09/26
18	Implementación del proyecto	mié 9/09/26	mar 29/12/26

- **Presupuesto Total Asignado:** S/.150,000,000.00
- **Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios.

GRÁFICA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

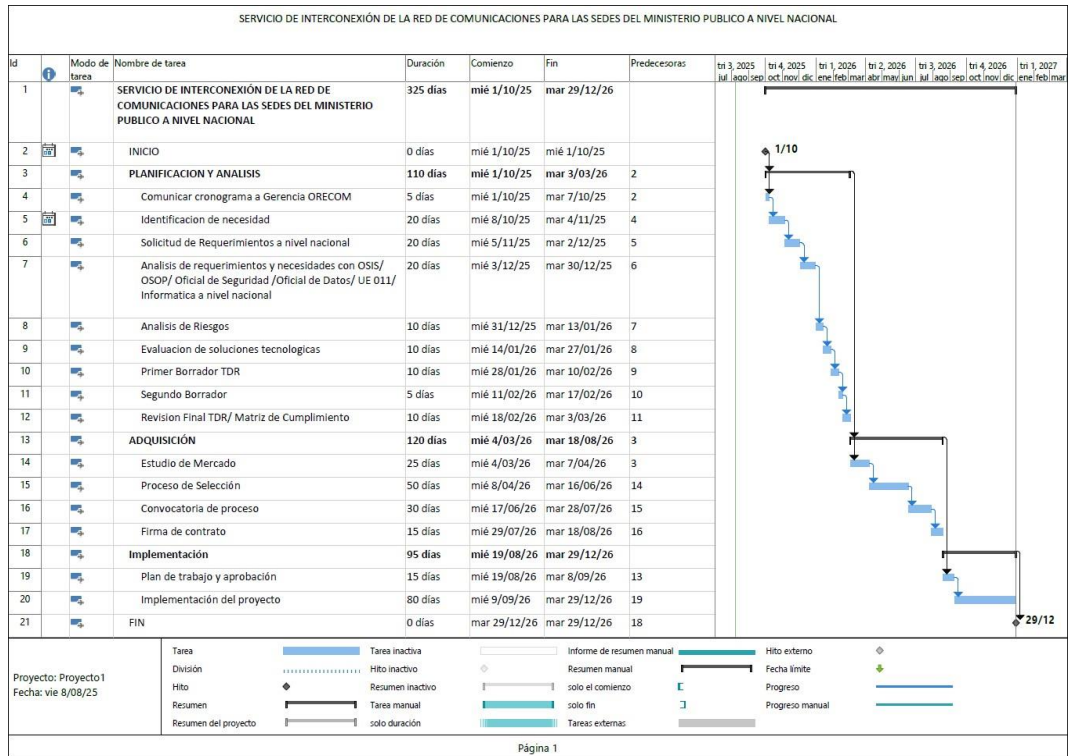

FICHA DE PROYECTO 11

Proyecto: Implementación del Sistema de Respaldo de Datos (Backup), Resguardo de Información y Continuidad del Negocio

Código de Proyecto: MP-PGD-011

Fecha de última actualización: 14/08/2025

1. Identificación y Alineamiento Estratégico

- **Nombre del Proyecto:** Implementación del Sistema de Respaldo de Datos (Backup), Resguardo de Información y Continuidad del Negocio.
- **Área/Unidad Responsable:** Gerencia de Tecnologías de la Información – Oficina de Redes y Comunicaciones.
- **Justificación del Proyecto (Problema o Necesidad):** La información crítica del Ministerio Público está expuesta a amenazas como **pérdidas accidentales, ataques cibernéticos y desastres físicos**. La carencia de un sistema de respaldo y recuperación robusto y moderno representa un riesgo inaceptable para la continuidad de las operaciones. Un incidente mayor podría paralizar servicios esenciales, comprometer investigaciones y afectar la confianza pública en la administración de justicia.
- **Objetivo Estratégico del Plan de Gobierno y Transformación Digital al que se alinea:** Fortalecer la ciberseguridad, la resiliencia y la continuidad operativa de la plataforma tecnológica institucional para salvaguardar los activos de información críticos del Estado.
- **Brecha de Capacidad/Servicio que cierra:** El proyecto cierra la brecha de **resiliencia tecnológica**. Proporciona la capacidad técnica y procedimental para recuperarse ante un evento de pérdida de datos, garantizando que la institución pueda reanudar sus operaciones críticas en tiempos predefinidos y protegiendo la información vital para su funcionamiento.

2. Alcance y Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Implementar un sistema integral de respaldo de datos y resguardo de información para **garantizar la integridad, disponibilidad y seguridad** de la información crítica del Ministerio Público, asegurando una rápida recuperación de las operaciones ante cualquier contingencia y la **continuidad del negocio**.
- **Objetivos Específicos:**
 - Adquirir e implementar una solución tecnológica moderna de backup para los servidores y bases de datos críticas.
 - Definir y documentar los Objetivos de Tiempo de Recuperación (RTO) y Objetivos de Punto de Recuperación (RPO) para los servicios esenciales.
 - Desarrollar, documentar y probar un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP).
 - Establecer un sitio seguro, preferiblemente alternativo, para el resguardo de las copias de seguridad críticas.
- **Principales Entregables:**
 - Plataforma de hardware y software de backup implementada y configurada.
 - Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) aprobado y socializado.
 - Informes de ejecución exitosa de pruebas periódicas de recuperación.
 - Personal de TI capacitado en la operación del sistema y los procedimientos de recuperación.
- **Fuera del Alcance (Exclusiones):**
 - El respaldo de información en equipos de cómputo de usuarios finales (salvo que se definan como críticos).

- La infraestructura de producción primaria (el proyecto implementa la infraestructura de respaldo).

3. Impacto y Beneficiarios

- **Descripción del Impacto Esperado:** Un incremento significativo en la resiliencia institucional frente a incidentes de pérdida de datos. Esto asegura que, ante un desastre, el Ministerio Público pueda recuperar sus sistemas críticos y reanudar sus operaciones, minimizando la interrupción de los servicios a la ciudadanía y de la labor fiscal.
- **Impacto Cuantitativo:**
 - Alcanzar un Objetivo de Tiempo de Recuperación (RTO) menor a 4 horas para sistemas críticos.
 - Lograr un Objetivo de Punto de Recuperación (RPO) menor a 15 minutos para bases de datos críticas.
 - Reducir el riesgo de pérdida permanente de información a un nivel cercano a cero.
- **Impacto Cualitativo:**
 - Aumento de la confianza en la integridad y disponibilidad de la información institucional.
 - Fortalecimiento de la postura de ciberseguridad y la capacidad de respuesta ante incidentes.
 - Garantía de cumplimiento de buenas prácticas en protección de datos.
- **Beneficiarios Directos:** La institución en su totalidad, cuya continuidad operativa queda resguardada. El área de TI, que contará con herramientas robustas para la gestión y recuperación de la información.
- **Beneficiarios Indirectos:** La ciudadanía, cuyos datos y expedientes están protegidos, y que tiene la garantía de que los servicios de justicia no se verán interrumpidos por contingencias tecnológicas.

4. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

- **Indicadores de Gestión (Durante el proyecto):**
 - **% de Avance del Cronograma (SPI):** Cumplimiento mensual > 0.9.
 - **% de Ejecución Presupuestal (CPI):** Ejecución mensual < 1.1.
 - **Nº de Hitos Completados vs. Planificados:** 100% de cumplimiento.
- **Indicadores de Resultado (Post-implementación):**
 - **KPI 1:** Tasa de éxito de los trabajos de respaldo programados. Meta: > 99.5%.
 - **KPI 2:** Tiempo real medido en las pruebas de recuperación completa de un servicio crítico. Meta: Cumplimiento del RTO definido.
 - **KPI 3:** Porcentaje de datos recuperados de forma íntegra en las pruebas. Meta: 100%.

5. Cronograma y Presupuesto

- **Fases del Proyecto:**


Nº	DESCRIPCIÓN	COMIENZO	FIN
1	PLANIFICACION Y ANALISIS	lun 5/01/26	vie 6/03/26
2	Identificación de necesidad	lun 5/01/26	vie 16/01/26



3	Evaluación de la capacidad actual y crecimiento proyectado	lun 19/01/26	vie 30/01/26
4	Plan de trabajo	lun 2/02/26	vie 13/02/26
5	Elaboración de TDR	lun 16/02/26	vie 27/02/26
6	Aprobación de TDR	lun 2/03/26	vie 6/03/26
7	ADQUISICIÓN	lun 9/03/26	vie 4/09/26
8	Estudio de Mercado	lun 9/03/26	vie 10/04/26
9	Proceso de Selección	lun 13/04/26	vie 3/07/26
10	Convocatoria de proceso	lun 6/07/26	vie 14/08/26
11	Firma de contrato	lun 17/08/26	vie 4/09/26
12	IMPLEMENTACIÓN	lun 7/09/26	vie 8/01/27
13	Implementación del proyecto	lun 7/09/26	vie 27/11/26
14	Inicio de Servicio y puesta en marcha	lun 30/11/26	vie 8/01/27
15	CIERRE	lun 11/01/27	vie 22/01/27
16	Informe final	lun 11/01/27	vie 22/01/27

- **Presupuesto Total Asignado: S/2,100,000.00**
- **Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios.

GRÁFICA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

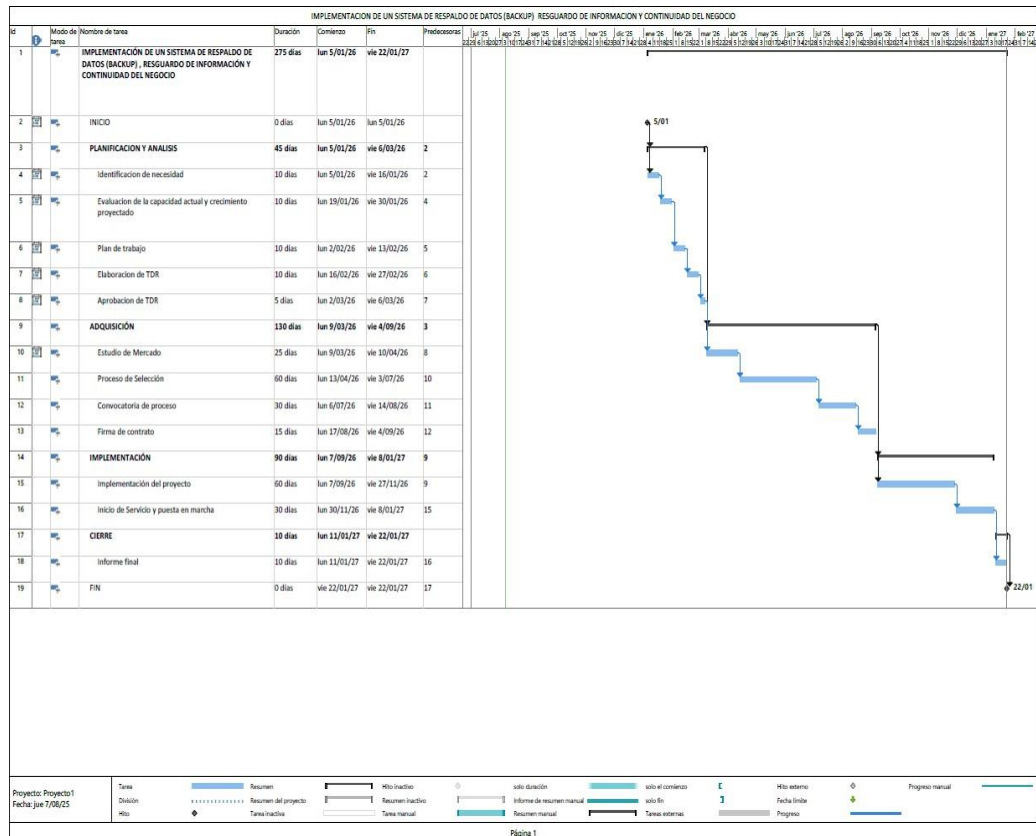

FICHA DE PROYECTO 12

Proyecto: Fortalecimiento y Renovación de la Infraestructura de Servidores y Software Base

Código de Proyecto: MP-PGD-012

Fecha de última actualización: 14/08/2025

1. Identificación y Alineamiento Estratégico

- **Nombre del Proyecto:** Fortalecimiento y Renovación de la Infraestructura de Servidores y Software Base.
- **Área/Unidad Responsable:** Gerencia de Tecnologías de la Información – Oficina de Redes y Comunicaciones.
- **Justificación del Proyecto (Problema o Necesidad):** La infraestructura actual de servidores, almacenamiento y software base se está volviendo obsoleta, lo que genera riesgos significativos como bajo rendimiento de las aplicaciones críticas, vulnerabilidades de seguridad y una alta probabilidad de fallas de hardware. Para evitar interrupciones del servicio y garantizar la capacidad de soportar las operaciones actuales y futuras, es imperativa una renovación tecnológica.
- **Objetivo Estratégico del Plan de Gobierno y Transformación Digital al que se alinea:** Modernizar la infraestructura tecnológica central para proveer una plataforma estable, segura y de alto rendimiento que sirva de base para todos los servicios digitales institucionales.
- **Brecha de Capacidad/Servicio que cierra:** El proyecto cierra la brecha de **obsolescencia tecnológica**. Reemplaza equipos y software con capacidad, rendimiento y seguridad limitados por una infraestructura moderna que garantiza la escalabilidad, velocidad y confiabilidad que demandan las operaciones del Ministerio Público.

2. Alcance y Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Renovar la tecnología de servidores, sistemas de almacenamiento y herramientas de monitoreo en el Ministerio Público para mejorar el **rendimiento, capacidad y seguridad** de la infraestructura, asegurando una gestión eficiente y una supervisión proactiva para **garantizar la continuidad operativa y la protección de datos críticos**.
- **Objetivos Específicos:**
 - Adquirir e implementar nuevos servidores (físicos o virtuales) de alto rendimiento.
 - Implementar una solución de almacenamiento centralizado moderna, con mayor capacidad y velocidad.
 - Actualizar y regularizar el licenciamiento de software base, como Windows Server, y fortalecer servicios clave como el Directorio Activo.
 - Implementar una herramienta de monitoreo centralizado para la supervisión proactiva del estado de la infraestructura.
- **Principales Entregables:**
 - Nuevos servidores y sistema de almacenamiento instalados y configurados en el centro de datos.
 - Plataforma de monitoreo implementada y generando alertas.
 - Licenciamiento de software base actualizado y regularizado.
 - Plan de migración de servicios y datos de la infraestructura antigua a la nueva, ejecutado exitosamente.
- **Fuera del Alcance (Exclusiones):**
 - Las aplicaciones de negocio que se ejecutan sobre la infraestructura (el proyecto provee la plataforma).
 - La infraestructura de redes de datos (LAN/WAN).

- Los equipos de cómputo de los usuarios finales.

3. Impacto y Beneficiarios

- **Descripción del Impacto Esperado:** Una infraestructura tecnológica central mucho más rápida, confiable y segura. Esto se traducirá directamente en un mejor rendimiento de todos los sistemas institucionales, una drástica reducción del riesgo de caídas del servicio y una mayor capacidad para detectar problemas técnicos antes de que afecten a los usuarios.
- **Impacto Cuantitativo:**
 - Incremento en la velocidad de procesamiento de datos y en los tiempos de respuesta de las aplicaciones.
 - Aumento significativo de la capacidad de almacenamiento disponible.
 - Reducción del número de incidentes por fallas de hardware en la infraestructura de servidores.
- **Impacto Cualitativo:**
 - Mejora de la postura de seguridad gracias a hardware y software modernos y actualizados.
 - Mayor estabilidad y confiabilidad de todos los servicios digitales.
 - Eficiencia operativa para el equipo de TI mediante el monitoreo proactivo.
- **Beneficiarios Directos:** El personal del área de TI, que administrará una plataforma más moderna y estable, y todos los usuarios de los sistemas institucionales, que experimentarán un mejor rendimiento.
- **Beneficiarios Indirectos:** La institución en su conjunto, al reducir su riesgo operativo, y la ciudadanía, que recibe servicios soportados por una plataforma tecnológica robusta.

4. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

- **Indicadores de Gestión (Durante el proyecto):**
 - **% de Avance del Cronograma (SPI):** Cumplimiento mensual > 0.9.
 - **% de Ejecución Presupuestal (CPI):** Ejecución mensual < 1.1.
 - **Nº de Hitos Completados vs. Planificados:** 100% de cumplimiento.
- **Indicadores de Resultado (Post-implementación):**
 - **KPI 1:** Tiempo de respuesta promedio de las aplicaciones críticas alojadas en la nueva infraestructura.
 - **KPI 2:** Porcentaje de alertas críticas de salud de servidores detectadas proactivamente por la nueva herramienta de monitoreo.
 - **KPI 3:** Número de caídas de servicio no planificadas originadas en la infraestructura de servidores. Meta: Reducción del 80%.

5. Cronograma y Presupuesto


- **Fases del Proyecto:**

Nº	DESCRIPCIÓN	COMIENZO	FIN
1	PLANIFICACION Y ANALISIS	lun 5/01/26	lun 16/03/26
2	Identificación de necesidad	lun 5/01/26	lun 19/01/26
3	Evaluación de la capacidad actual y crecimiento proyectado	lun 19/01/26	lun 2/02/26

4	Plan de trabajo	lun 2/02/26	lun 23/02/26
5	Elaboración de TDR	lun 23/02/26	lun 9/03/26
6	Aprobación de TDR	lun 9/03/26	lun 16/03/26
7	ADQUISICIÓN	lun 16/03/26	lun 7/09/26
8	Estudio de Mercado	lun 16/03/26	lun 27/04/26
9	Proceso de Selección	lun 27/04/26	lun 20/07/26
10	Convocatoria de proceso	lun 20/07/26	lun 17/08/26
11	Firma de contrato	lun 17/08/26	lun 7/09/26
12	IMPLEMENTACIÓN	lun 7/09/26	lun 16/11/26
13	Implementación del proyecto	lun 7/09/26	lun 19/10/26
14	Inicio de Servicio y puesta en marcha	lun 19/10/26	lun 16/11/26
15	CIERRE	lun 16/11/26	lun 7/12/26
16	Informe final	lun 16/11/26	lun 7/12/26

- **Presupuesto Total Asignado: S/. 2,100,000.00**
- **Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios.

GRÁFICA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

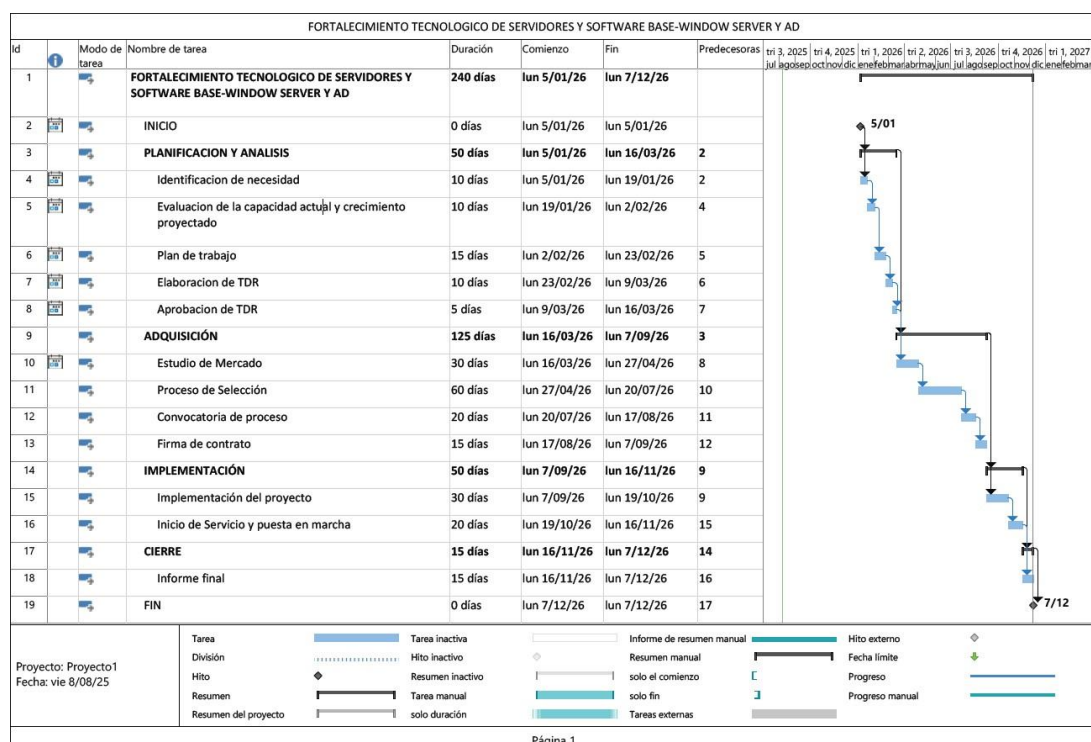

FICHA DE PROYECTO 13

Proyecto: Repotenciación de Servidores para Servicios Institucionales.

Código de Proyecto: MP-PGD-013

Fecha de última actualización: 14/08/2025

1. Identificación y Alineamiento Estratégico

- **Nombre del Proyecto:** Repotenciación de Servidores para Servicios Institucionales.
- **Área/Unidad Responsable:** Gerencia de Tecnologías de la Información – Oficina de Redes y Comunicaciones.
- **Justificación del Proyecto (Problema o Necesidad):** Los servidores que alojan servicios institucionales críticos presentan limitaciones de rendimiento y capacidad. Específicamente, la falta de espacio en disco y la memoria RAM insuficiente provocan lentitud en las aplicaciones y un riesgo elevado de interrupciones del servicio. Es necesario repotenciar estos equipos para evitar fallos y asegurar que puedan manejar el volumen de datos y tareas actuales.
- **Objetivo Estratégico del Plan de Gobierno y Transformación Digital al que se alinea:** Optimizar la infraestructura tecnológica existente para garantizar el rendimiento, la disponibilidad y la fiabilidad de los servicios digitales que son esenciales para las operaciones del Ministerio Público.
- **Brecha de Capacidad/Servicio que cierra:** El proyecto cierra la brecha de **rendimiento y fiabilidad** de la infraestructura de servidores actual. Atiende cuellos de botella específicos de hardware (discos y memoria) para extender la vida útil de los activos y asegurar que cumplan con los requerimientos de desempeño sin necesidad de una renovación completa.

2. Alcance y Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Repotenciar la infraestructura de servidores mediante el incremento de la capacidad de almacenamiento y la memoria del sistema, con el fin de mejorar el rendimiento general, reducir el riesgo de fallos y optimizar la gestión de recursos para los servicios institucionales.
- **Objetivos Específicos:**
 - **Incrementar la Capacidad de Almacenamiento:** Reemplazar los discos duros actuales con unidades de mayor capacidad para permitir el almacenamiento de mayores volúmenes de datos.
 - **Mejorar el rendimiento del Sistema:** Actualizar las memorias RAM de los servidores para aumentar la velocidad de procesamiento y la capacidad multitarea.
 - **Reducir el Riesgo de Fallos:** Sustituir discos duros y memorias obsoletas para disminuir la probabilidad de fallos y aumentar la fiabilidad de la infraestructura.
 - **Optimizar la Gestión de Recursos:** Implementar componentes de alto rendimiento para facilitar un procesamiento de datos más eficiente y efectivo.
- **Principales Entregables:**
 - Nuevos discos duros de alta capacidad instalados y configurados.
 - Nuevos módulos de memoria RAM de alto rendimiento instalados.
 - Informe de pruebas de rendimiento (antes y después de la repotenciación).
 - Componentes obsoletos retirados y documentados.
- **Fuera del Alcance (Exclusiones):**
 - La sustitución completa de los servidores (chasis, CPU).
 - La actualización de sistemas operativos o software base.
 - Modificaciones en las aplicaciones que se alojan en los servidores.

3. Impacto y Beneficiarios

- **Descripción del Impacto Esperado:** Una mejora notoria en la velocidad y estabilidad de los servicios institucionales alojados en los servidores repotenciados. Los usuarios experimentarán tiempos de respuesta más rápidos, y el riesgo de interrupciones por fallas de hardware o falta de espacio se reducirá drásticamente.
- **Impacto Cuantitativo:**
 - Incremento del espacio de almacenamiento total disponible.
 - Disminución del tiempo promedio de respuesta de las aplicaciones.
 - Reducción a cero de los incidentes por fallas de los componentes actualizados.
- **Impacto Cualitativo:**
 - Mayor fiabilidad y estabilidad de los servicios institucionales.
 - Extensión de la vida útil de los activos de servidores existentes.
 - Mejora en la experiencia del usuario final debido a un mejor rendimiento.
- **Beneficiarios Directos:** Todos los usuarios de los servicios institucionales alojados en los servidores repotenciados y el personal de TI que administra la infraestructura.
- **Beneficiarios Indirectos:** La institución en su conjunto, al mejorar la eficiencia de sus operaciones y reducir el riesgo tecnológico.

4. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

- **Indicadores de Gestión (Durante el proyecto):**
 - **% de Avance del Cronograma (SPI):** Cumplimiento mensual > 0.95.
 - **% de Ejecución Presupuestal (CPI):** Ejecución mensual < 1.05.
 - **Nº de Hitos Completados vs. Planificados:** 100% de cumplimiento.
- **Indicadores de Resultado (Post-implementación):**
 - **KPI 1:** Porcentaje de utilización del disco en los servidores actualizados.
 - **KPI 2:** Porcentaje de utilización de la memoria RAM durante horas pico. Meta: Mantenerse en un rango óptimo (<80%).
 - **KPI 3:** Número de incidentes de hardware relacionados con discos o memorias en los servidores repotenciados. Meta: 0.

5. Cronograma y Presupuesto

- **Fases del Proyecto:**


Nº	DESCRIPCIÓN	COMIENZO	FIN
1	PLANIFICACION Y ANALISIS	lun 5/01/26	jue 19/03/26
2	Identificación de necesidad	lun 5/01/26	vie 16/01/26
3	Evaluación de incremento de la demanda de procesamiento y almacenamiento	lun 19/01/26	vie 30/01/26
4	Identificación de lentitud o cuellos de botella	lun 2/02/26	mar 3/02/26
5	Identificación de limitaciones de hardware	mié 4/02/26	jue 5/02/26

6	Informe de área técnica coordinaciones con las oficinas de OSIS Y OSOP	vie 6/02/26	jue 12/02/26
7	Planeamiento	vie 13/02/26	jue 26/02/26
8	Elaboración de TDR	vie 27/02/26	jue 12/03/26
9	Aprobación de TDR	vie 13/03/26	jue 19/03/26
10	ADQUISICIÓN	vie 20/03/26	jue 3/09/26
11	Estudio de Mercado	vie 20/03/26	jue 23/04/26
12	Proceso de Selección	vie 24/04/26	jue 16/07/26
13	Convocatoria de proceso	vie 17/07/26	jue 13/08/26
14	Firma de contrato	vie 14/08/26	jue 3/09/26
15	IMPLEMENTACIÓN	vie 4/09/26	jue 12/11/26
16	Implementación del proyecto	vie 4/09/26	jue 15/10/26
17	Inicio de Servicio y puesta en marcha	vie 16/10/26	jue 12/11/26
18	CIERRE	vie 13/11/26	jue 26/11/26
19	Informe final	vie 13/11/26	jue 26/11/26

- **Presupuesto Total Asignado:** S/. 1,500,000.00
- **Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios.



GRÁFICA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

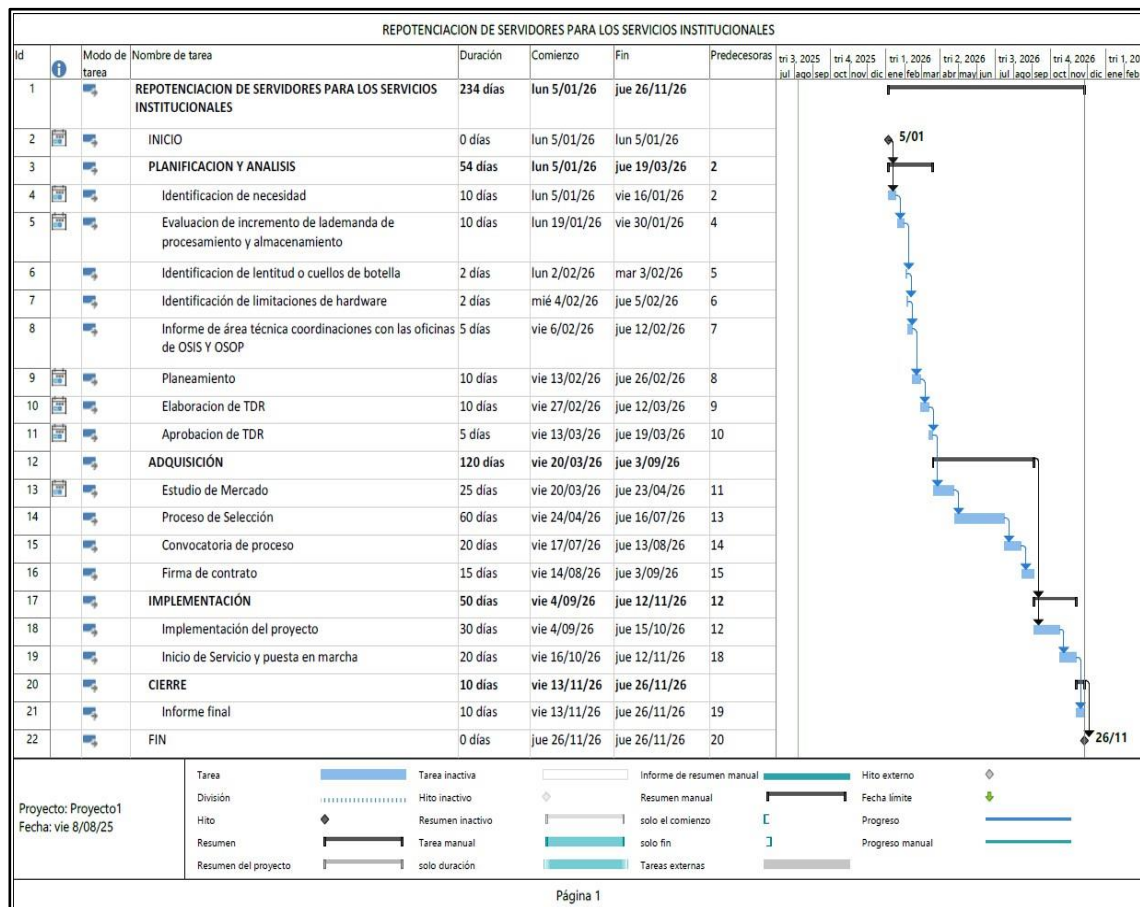

FICHA DE PROYECTO 14

Proyecto: Implementación de Ventilación en los Cuartos de Telecomunicaciones en Lima (Aires Acondicionados)

Código de Proyecto: MP-PGD-014

Fecha de última actualización: 14/08/2025

1. Identificación y Alineamiento Estratégico

- **Nombre del Proyecto:** Implementación de Ventilación en los Cuartos de Telecomunicaciones en Lima (Aires Acondicionados).
- **Área/Unidad Responsable:** Gerencia de Tecnologías de la Información, en coordinación con la Gerencia de Infraestructura y Servicios Generales.
- **Justificación del Proyecto (Problema o Necesidad):** Los equipos de telecomunicaciones críticos, ubicados en cuartos sin una climatización adecuada en las sedes de Lima, generan altas temperaturas que amenazan su funcionamiento. El sobrecalentamiento provoca fallas intermitentes, interrupciones del servicio de red y reduce drásticamente la vida útil de los equipos, poniendo en riesgo la conectividad y las operaciones diarias de la institución.
- **Objetivo Estratégico del Plan de Gobierno y Transformación Digital al que se alinea:** Garantizar la resiliencia y la continuidad operativa de la infraestructura tecnológica fundamental que soporta todos los servicios digitales institucionales.
- **Brecha de Capacidad/Servicio que cierra:** El proyecto cierra la brecha de **control ambiental** en la infraestructura física de TI. Provee la capacidad de enfriamiento necesaria para mantener los equipos de telecomunicaciones dentro de las temperaturas operativas recomendadas por los fabricantes, un requisito básico para la fiabilidad de la infraestructura tecnológica.

2. Alcance y Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Implementar un sistema de aire acondicionado en los cuartos de telecomunicaciones del Ministerio Público en Lima para **garantizar el funcionamiento óptimo y continuo de los equipos**, asegurando un ambiente controlado que prevenga fallos, prolongue su vida útil y mantenga la eficiencia de los servicios.
- **Objetivos Específicos:**
 - Adquirir e instalar unidades de aire acondicionado con la capacidad (BTU) adecuada para cada cuarto de telecomunicaciones.
 - Realizar las adecuaciones eléctricas y civiles necesarias para la correcta instalación y funcionamiento de los equipos.
 - Establecer un ambiente con una temperatura estable y controlada dentro del rango óptimo para los equipos de red (ej. 18-22 °C).
 - Definir un plan de mantenimiento preventivo para los nuevos sistemas de climatización.
- **Principales Entregables:**
 - Equipos de aire acondicionado instalados y operativos.
 - Trabajos de adecuación eléctrica finalizados.
 - Reporte de monitoreo de temperatura que certifique el ambiente controlado.
 - Plan de mantenimiento preventivo documentado.
- **Fuera del Alcance (Exclusiones):**
 - La adquisición o mantenimiento de los equipos de telecomunicaciones (switches, routers, etc.).
 - La climatización de áreas de oficina u otros ambientes que no sean los cuartos de telecomunicaciones.

- La implementación de sistemas de detección y extinción de incendios.

3. Impacto y Beneficiarios

- **Descripción del Impacto Esperado:** Un aumento significativo en la fiabilidad y la vida útil del equipamiento crítico de telecomunicaciones. Se eliminará el riesgo de interrupciones del servicio de red por sobrecalentamiento, asegurando una conectividad estable y continua para todos los usuarios de las sedes de Lima.
- **Impacto Cuantitativo:**
 - Reducción a cero de los incidentes de falla de equipos por sobrecalentamiento.
 - Mantenimiento de la temperatura ambiente de los cuartos dentro del rango óptimo (ej. < 22 °C) el 100% del tiempo.
 - Extensión de la vida útil de los activos de red, protegiendo la inversión.
- **Impacto Cualitativo:**
 - Mayor estabilidad y fiabilidad de la red de comunicaciones institucional.
 - Mitigación de un riesgo operativo crítico para las sedes de Lima.
 - Mejora de las condiciones para la conservación de la infraestructura tecnológica.
- **Beneficiarios Directos:** El área de TI que gestiona la infraestructura de red, y todos los colaboradores de las sedes de Lima, cuyo trabajo depende de una conexión de red estable.
- **Beneficiarios Indirectos:** La institución en su conjunto, al mejorar la continuidad de sus operaciones, lo que contribuye a una administración de justicia más eficaz.

4. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

- **Indicadores de Gestión (Durante el proyecto):**
 - **% de Avance del Cronograma (SPI):** Cumplimiento mensual > 0.9.
 - **% de Ejecución Presupuestal (CPI):** Ejecución mensual < 1.1.
 - **Nº de Hitos Completados vs. Planificados:** 100% de cumplimiento.
- **Indicadores de Resultado (Post-implementación):**
 - **KPI 1:** Registros de temperatura de los cuartos de telecomunicaciones. Meta: Mantenerse consistentemente en el rango de 18-22 °C.
 - **KPI 2:** Número de incidentes de red atribuidos al sobrecalentamiento de equipos. Meta: 0.
 - **KPI 3:** Cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado. Meta: 100%.

5. Cronograma y Presupuesto

- **Fases del Proyecto:**


Nº	DESCRIPCIÓN	COMIENZO	FIN
1	PLANIFICACION Y ANALISIS	lun 5/01/26	vie 20/03/26
2	Identificación de necesidad	lun 5/01/26	vie 16/01/26
3	Detección de problemas y visitas técnicas	lun 19/01/26	vie 30/01/26
4	Plan de trabajo	lun 2/02/26	vie 13/02/26
5	Estimación de requerimientos técnicos	lun 16/02/26	vie 27/02/26

6	Elaboración de TDR	lun 2/03/26	vie 13/03/26
7	Aprobación de TDR	lun 16/03/26	vie 20/03/26
8	ADQUISICIÓN	lun 23/03/26	vie 18/09/26
9	Estudio de Mercado	lun 23/03/26	vie 24/04/26
10	Proceso de Selección	lun 27/04/26	vie 17/07/26
11	Convocatoria de proceso	lun 20/07/26	vie 28/08/26
12	Firma de contrato	lun 31/08/26	vie 18/09/26
13	IMPLEMENTACIÓN	lun 21/09/26	vie 27/11/26
14	Implementación del proyecto	lun 21/09/26	vie 30/10/26
15	Inicio de Servicio y puesta en marcha	lun 2/11/26	vie 27/11/26
16	CIERRE	lun 30/11/26	vie 18/12/26
17	Informe final	lun 30/11/26	vie 18/12/26

- **Presupuesto Total Asignado:** S/.100,000.00
- **Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios.



GRÁFICA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

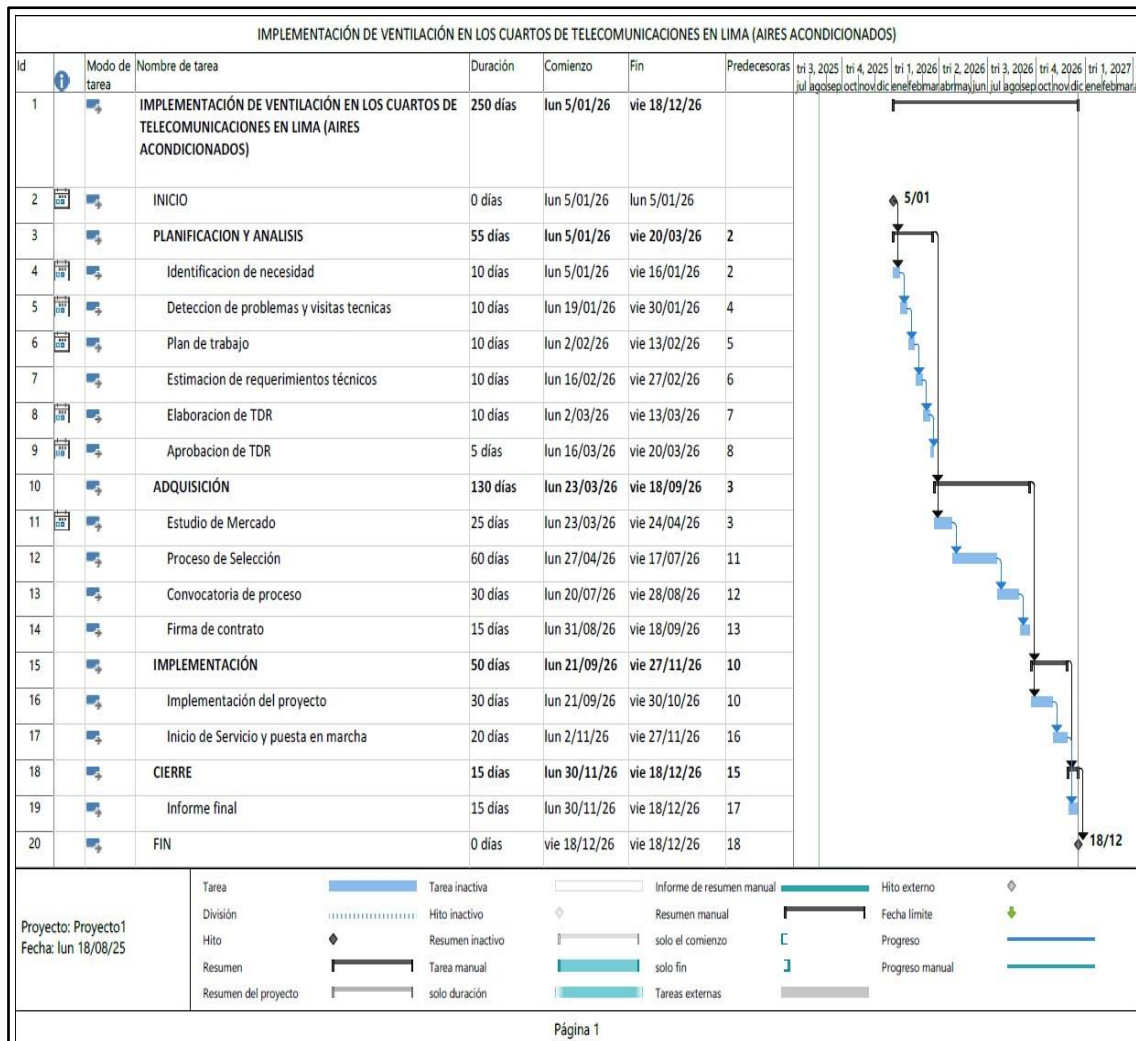

FICHA DE PROYECTO 15

Proyecto: Implementación de Sistemas de Control de Acceso, Videovigilancia para el Centro de Datos.

Código de Proyecto: MP-PGD-015

Fecha de última actualización: 14/08/2025

1. Identificación y Alineamiento Estratégico

- **Nombre del Proyecto:** Implementación de Sistemas de Control de Acceso y Videovigilancia para el Centro de Datos.
- **Área/Unidad Responsable:** Gerencia de Tecnologías de la Información, en coordinación con la Oficina de Seguridad Integral.
- **Justificación del Proyecto (Problema o Necesidad):** El Centro de Datos alberga la infraestructura tecnológica más crítica de la institución, pero carece de controles de seguridad física automatizados. Esta vulnerabilidad expone los equipos y la información sensible a riesgos de **accesos no autorizados**, robo o sabotaje, lo que representa una amenaza directa para la **continuidad operativa** y la integridad de los datos del Ministerio Público.
- **Objetivo Estratégico del Plan de Gobierno y Transformación Digital al que se alinea:** Fortalecer la postura de seguridad física y lógica de la institución para proteger sus activos digitales críticos y asegurar la resiliencia de su plataforma tecnológica.
- **Brecha de Capacidad/Servicio que cierra:** El proyecto cierra la brecha de **seguridad física** del Centro de Datos. Reemplaza un modelo de seguridad potencialmente manual o básico por un sistema automatizado, centralizado y auditable que controla y registra de manera fehaciente quién accede al recinto.

2. Alcance y Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Implementar sistemas de **control de acceso y videovigilancia** en el Centro de Datos para garantizar la seguridad física de la infraestructura crítica, protegiendo los equipos y la información contra accesos no autorizados y asegurando la **integridad, confidencialidad y disponibilidad** de los datos.
- **Objetivos Específicos:**
 - Instalar un sistema de control de acceso (biométrico o por tarjeta de proximidad) en todos los puntos de ingreso al Centro de Datos.
 - Desplegar un sistema de videovigilancia IP (CCTV) de alta definición para monitorear las áreas críticas.
 - Centralizar la gestión y el monitoreo de los sistemas para una supervisión en tiempo real y la generación de registros de auditoría.
- **Principales Entregables:**
 - Sistema de control de acceso instalado y operativo.
 - Sistema de videovigilancia con capacidad de grabación y monitoreo en vivo, instalado y operativo.
 - Protocolo de seguridad y acceso al Centro de Datos, documentado y aprobado.
- **Fuera del Alcance (Exclusiones):**
 - Medidas de ciberseguridad a nivel de software (firewalls, antivirus).
 - Sistemas de detección y extinción de incendios.
 - Sistemas de monitoreo ambiental (temperatura, humedad).

3. Impacto y Beneficiarios

- **Descripción del Impacto Esperado:** Un entorno físico altamente seguro para la tecnología más crítica de la institución. El riesgo de acceso físico no autorizado será eliminado, garantizando la protección de los datos institucionales y la continuidad de los servicios que dependen del Centro de Datos.
- **Impacto Cuantitativo:**
 - Registro 100% auditable de todos los accesos al Centro de Datos.
 - Cobertura de videovigilancia 24/7 de todas las zonas críticas.
- **Impacto Cualitativo:**
 - Mejora significativa de la postura de seguridad física.
 - Mitigación de riesgos de robo, sabotaje e intrusión.
 - Mayor confianza y garantía en la protección de la información del Ministerio Público.
- **Beneficiarios Directos:** El personal de TI responsable de la operación del Centro de Datos y la Oficina de Seguridad Integral.
- **Beneficiarios Indirectos:** Toda la institución, cuyos sistemas operativos centrales estarán mejor protegidos, y la ciudadanía, cuyos datos serán gestionados de forma más segura ante amenazas físicas.

4. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

- **Indicadores de Gestión (Durante el proyecto):**
 - **% de Avance del Cronograma (SPI):** Cumplimiento mensual > 0.95.
 - **% de Ejecución Presupuestal (CPI):** Ejecución mensual < 1.05.
 - **Nº de Hitos Completados vs. Planificados:** 100% de cumplimiento.
- **Indicadores de Resultado (Post-implementación):**
 - **KPI 1:** Número de intentos de acceso no autorizado detectados y bloqueados por el sistema. Meta: 100% de los intentos bloqueados.
 - **KPI 2:** Cumplimiento del protocolo de acceso, verificado mediante auditorías mensuales a los registros. Meta: 100%.
 - **KPI 3:** Disponibilidad del servicio de grabación de videovigilancia. Meta: 99.9% de uptime.

5. Cronograma y Presupuesto


- **Fases del Proyecto:**

Nº	DESCRIPCIÓN	COMIENZO	FIN
1	PLANIFICACION Y ANALISIS	lun 5/01/26	vie 6/03/26
2	Identificación de necesidad	lun 5/01/26	vie 16/01/26
3	Evaluación de la capacidad actual y crecimiento proyectado	lun 19/01/26	vie 30/01/26
4	Plan de trabajo	lun 2/02/26	vie 13/02/26
5	Elaboración de TDR	lun 16/02/26	vie 27/02/26

6	Aprobación de TDR	lun 2/03/26	vie 6/03/26
7	ADQUISICIÓN	lun 9/03/26	vie 21/08/26
8	Estudio de Mercado	lun 9/03/26	vie 10/04/26
9	Proceso de Selección	lun 13/04/26	vie 3/07/26
10	Convocatoria de proceso	lun 6/07/26	vie 31/07/26
11	Firma de contrato	lun 3/08/26	vie 21/08/26
12	IMPLEMENTACIÓN	lun 24/08/26	vie 30/10/26
13	Implementación del proyecto	lun 24/08/26	vie 2/10/26
14	Inicio de Servicio y puesta en marcha	lun 5/10/26	vie 30/10/26
15	CIERRE	lun 2/11/26	vie 13/11/26
16	Informe final	lun 2/11/26	vie 13/11/26

- **Presupuesto Total Asignado:** S/.100,000.00
- **Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios.

GRÁFICA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

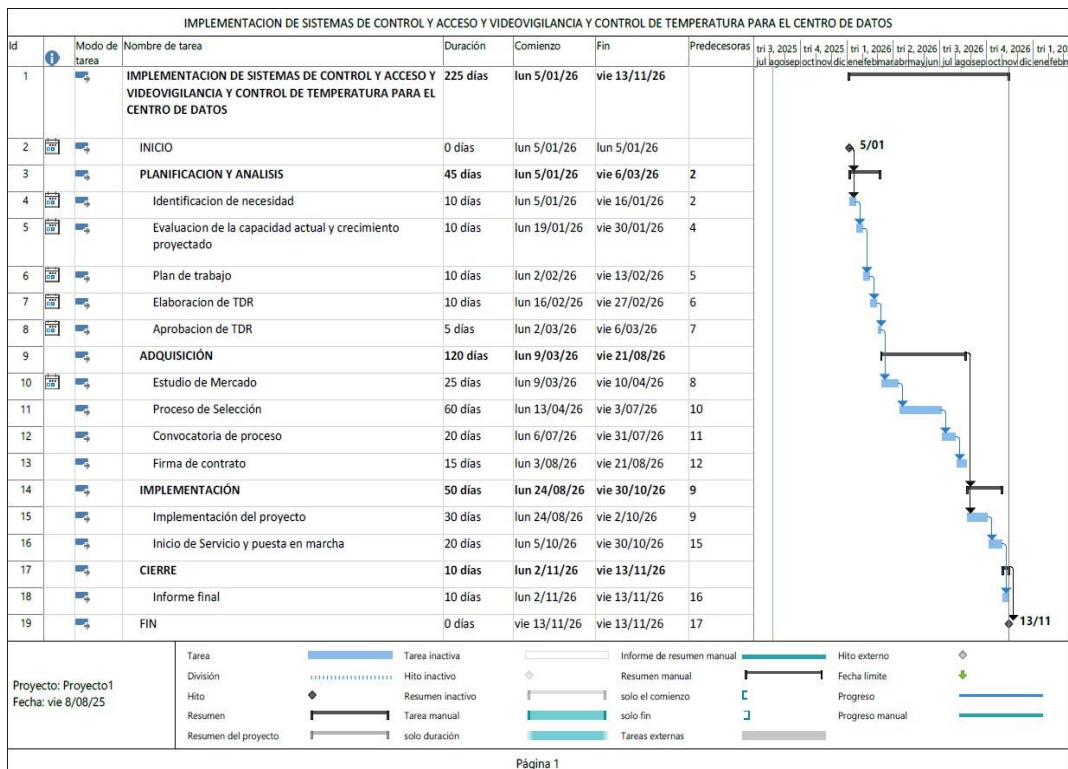

FICHA DE PROYECTO 16

Proyecto: Fortalecimiento de la Interconexión Inalámbrica (WLAN) para Sedes de Lima Centro.

Código de Proyecto: MP-PGD-016

Fecha de última actualización: 14/08/2025

1. Identificación y Alineamiento Estratégico

- **Nombre del Proyecto:** Fortalecimiento de la Interconexión Inalámbrica (WLAN) para Sedes de Lima Centro.
- **Área/Unidad Responsable:** Gerencia de Tecnologías de la Información – Oficina de Redes y Comunicaciones.
- **Justificación del Proyecto (Problema o Necesidad):** La infraestructura de red actual en las sedes de Lima Centro es insuficiente para satisfacer las necesidades de un entorno de trabajo moderno. La conectividad limitada restringe la movilidad del personal, dificulta la colaboración ágil y no permite el uso eficiente de dispositivos móviles, creando cuellos de botella en el acceso a la información.
- **Objetivo Estratégico del Plan de Gobierno y Transformación Digital al que se alinea:** Modernizar la infraestructura tecnológica del Ministerio Público para garantizar una conectividad segura, confiable y de alto rendimiento que soporte la transformación digital de sus operaciones.
- **Brecha de Capacidad/Servicio que cierra:** El proyecto cierra la brecha tecnológica de no contar con una red inalámbrica de alta capacidad, segura y gestionada centralizadamente. Esto habilitará la conectividad ubicua, que actualmente es una limitación para el trabajo flexible y la colaboración en tiempo real.

2. Alcance y Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Implementar una red de interconexión inalámbrica (WLAN) segura y de alto rendimiento en las sedes de Lima Centro para mejorar la conectividad, movilidad y flexibilidad en el acceso a la red, optimizando así la comunicación y facilitando un entorno de trabajo más eficiente y ágil.
- **Objetivos Específicos:**
 - Realizar un estudio de cobertura (site survey) para diseñar una red óptima que garantice la conectividad en todas las áreas designadas.
 - Adquirir, instalar y configurar puntos de acceso (Access Points) de última generación y controladoras WLAN.
 - Implementar protocolos de seguridad robustos para proteger la red inalámbrica y los datos de la institución.
 - Asegurar una experiencia de usuario fluida y estable para el acceso a los recursos de la red.
- **Principales Entregables:**
 - Documento de diseño de la red WLAN basado en el site survey.
 - Equipamiento de red (Access Points, controladoras, etc.) instalado y configurado.
 - Red inalámbrica 100% operativa y segura en las sedes de Lima Centro.
 - Documentación técnica, mapas de cobertura y protocolos de seguridad.
- **Fuera del Alcance (Exclusiones):**
 - La dotación de equipos terminales (laptops, tablets, smartphones) a los usuarios.
 - La contratación o ampliación del servicio del proveedor de Internet (ISP).
 - La actualización de la red de cableado estructurado, salvo puntos específicos necesarios para la conexión de los Access Points.

3. Impacto y Beneficiarios

- **Descripción del Impacto Esperado:** Los colaboradores podrán conectarse a la red institucional desde cualquier punto de las sedes con sus dispositivos, lo que fomentará la colaboración, agilizará las consultas de información y permitirá modalidades de trabajo más flexibles, como reuniones dinámicas y uso de espacios comunes.
- **Impacto Cuantitativo:**
 - Cobertura de la red inalámbrica en el 100% de las áreas de trabajo de las sedes.
 - Reducción estimada del 40% en los tickets de soporte técnico relacionados con problemas de conectividad.
- **Impacto Cualitativo:**
 - Mejora notable en la productividad y satisfacción del personal gracias a la flexibilidad y movilidad.
 - Modernización del entorno laboral, alineándolo con estándares tecnológicos actuales.
 - Fortalecimiento de la seguridad en las conexiones inalámbricas.
- **Beneficiarios Directos:** Todo el personal fiscal, administrativo y de apoyo que labora en las sedes de Lima Centro del Ministerio Público.
- **Beneficiarios Indirectos:** La institución en su conjunto, al mejorar la eficiencia operativa de sus sedes principales, y los ciudadanos, al beneficiarse de un servicio público más ágil.

4. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

- **Indicadores de Gestión (Durante el proyecto):**
 - **% de Avance del Cronograma (SPI):** Cumplimiento mensual > 0.95.
 - **% de Ejecución Presupuestal (CPI):** Ejecución mensual < 1.05.
 - **Nº de Hitos Completados vs. Planificados:** 100% de cumplimiento.
- **Indicadores de Resultado (Post-implementación):**
 - **KPI 1:** Tiempo de actividad (Uptime) de la red WLAN. Meta: 99.9%.
 - **KPI 2:** Nivel de señal promedio en áreas de cobertura. Meta: Superior a -67 dBm (considerado bueno/excelente).
 - **KPI 3:** Nivel de satisfacción de los usuarios con la nueva red. Meta: > 90%.

5. Cronograma y Presupuesto


- **Fases del Proyecto:**

Nº	DESCRIPCIÓN	COMIENZO	FIN
1	PLANIFICACION Y ANALISIS	mié 1/04/26	mar 28/07/26
2	Identificación de necesidad	mié 1/04/26	mar 28/04/26
3	Evaluación de la capacidad actual y crecimiento proyectado	mié 29/04/26	mar 12/05/26
4	Plan de trabajo	mié 13/05/26	mar 23/06/26
5	Elaboración de EETT	mié 24/06/26	mar 21/07/26
6	Aprobación de EETT	mié 22/07/26	mar 28/07/26

7	ADQUISICIÓN	mié 29/07/26	mar 12/01/27
8	Estudio de Mercado	mié 29/07/26	mar 1/09/26
9	Proceso de Selección	mié 2/09/26	mar 24/11/26
10	Convocatoria de proceso	mié 25/11/26	mar 22/12/26
11	Firma de contrato	mié 23/12/26	mar 12/01/27
12	IMPLEMENTACIÓN	mié 13/01/27	mar 15/06/27
13	Implementación del proyecto	mié 13/01/27	mar 18/05/27
14	Inicio de Servicio y puesta en marcha	mié 19/05/27	mar 15/06/27
15	CIERRE	mié 16/06/27	mar 29/06/27
16	Informe final	mié 16/06/27	mar 29/06/27

- **Presupuesto Total Asignado:** S/. 700,000.00
- **Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios.

GRÁFICA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

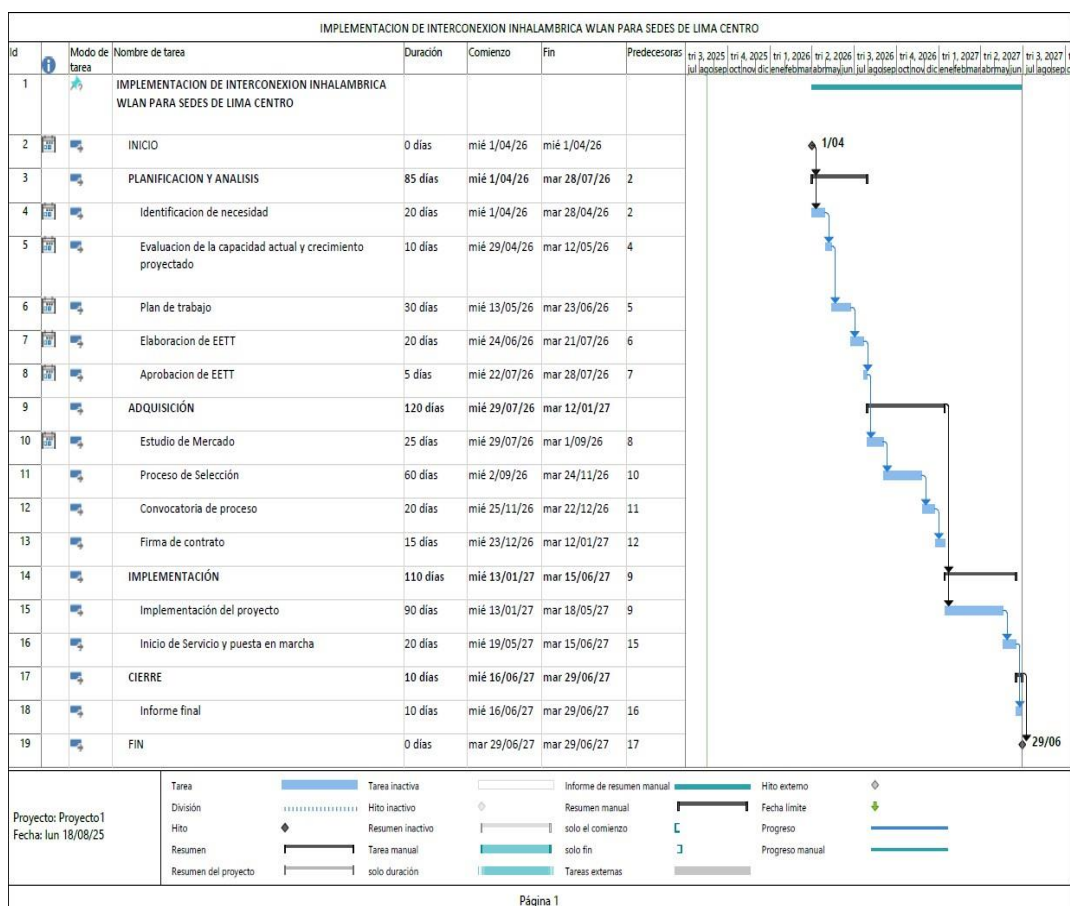

FICHA DE PROYECTO 17

Proyecto: Implementación de un Sistema de Gestión de Servicios Tecnológicos (Mesa de Ayuda).

Código de Proyecto: MP-PGD-017

Fecha de última actualización: 14/08/2025

1. Identificación y Alineamiento Estratégico

- **Nombre del Proyecto:** Implementación de un Sistema de Gestión de Servicios Tecnológicos (Mesa de Ayuda).
- **Área/Unidad Responsable:** Gerencia de Tecnologías de la Información - Oficina de Soporte.
- **Justificación del Proyecto (Problema o Necesidad):** El proceso actual de atención de soporte técnico interno no es óptimo y carece de trazabilidad. No existen métricas para evaluar el desempeño, lo que dificulta la priorización de incidentes y la optimización de los recursos, afectando la productividad general de los colaboradores de la entidad.
- **Objetivo Estratégico del Plan de Gobierno y Transformación Digital al que se alinea:** Modernizar la gestión interna y mejorar la eficiencia operativa mediante la estandarización de procesos y la implementación de soluciones tecnológicas que soporten los servicios transversales de la entidad.
- **Brecha de Capacidad/Servicio que cierra:** El proyecto cierra la brecha de no contar con una plataforma formal y centralizada para la gestión de servicios de TI (ITSM). Se transita de un modelo de soporte reactivo y desorganizado a uno proactivo, medible y basado en las mejores prácticas (como ITIL).

2. Alcance y Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Implementar un sistema de Gestión de Servicios Tecnológicos para **optimizar la atención de la mesa de ayuda** a nivel interno, estandarizando el registro y seguimiento de tickets y permitiendo una **gestión adecuada a través de indicadores** de rendimiento (KPIs).
- **Objetivos Específicos:**
 - Centralizar el registro de todas las incidencias y requerimientos de TI en una única plataforma.
 - Establecer un catálogo de servicios con Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs) definidos.
 - Automatizar el flujo de asignación, escalamiento y cierre de tickets.
 - Implementar un panel de control (dashboard) con indicadores en tiempo real para el monitoreo y la toma de decisiones.
- **Principales Entregables:**
 - Plataforma de ITSM (Mesa de Ayuda) configurada y en producción.
 - Catálogo de Servicios de TI definido y publicado.
 - Base de conocimiento inicial para autoayuda de los usuarios.
 - Reportes y dashboards de indicadores de gestión.
 - Personal de TI y usuarios finales capacitados.
- **Fuera del Alcance (Exclusiones):**
 - La contratación de nuevo personal para la mesa de ayuda.
 - El soporte tecnológico a ciudadanos o entidades externas.
 - La resolución técnica de los problemas (el sistema gestiona el proceso de atención).

3. Impacto y Beneficiarios

- **Descripción del Impacto Esperado:** Se logrará un servicio de soporte de TI ordenado, eficiente y transparente. Los usuarios tendrán un único canal para reportar incidencias y conocerán los tiempos de atención esperados. El área de TI podrá gestionar su demanda de forma eficaz, identificar problemas recurrentes y demostrar su rendimiento con datos concretos.
- **Impacto Cuantitativo:**
 - Reducción del tiempo promedio de resolución de tickets en un 30%.
 - Aumento al 95% del cumplimiento de los SLAs establecidos.
- **Impacto Cualitativo:**
 - Aumento significativo de la satisfacción del usuario interno con el soporte de TI.
 - Toma de decisiones basada en datos para la mejora continua del servicio.
 - Mayor transparencia y comunicación durante todo el ciclo de vida de un ticket.
- **Beneficiarios Directos:** Todo el personal interno del Ministerio Público (usuarios) y el equipo de la mesa de ayuda de TI.
- **Beneficiarios Indirectos:** La entidad en su conjunto, ya que un soporte de TI eficiente reduce los tiempos de inactividad y mejora la productividad general.

4. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

- **Indicadores de Gestión (Durante el proyecto):**
 - **% de Avance del Cronograma (SPI):** Cumplimiento mensual > 0.95.
 - **% de Ejecución Presupuestal (CPI):** Ejecución mensual < 1.05.
 - **Nº de Hitos Completados vs. Planificados:** 100% de cumplimiento.
- **Indicadores de Resultado (Post-implementación):**
 - **KPI 1 (Resultado):** Tiempo Promedio de Resolución (Average Time to Resolution).
 - **KPI 2 (Resultado):** Tasa de Resolución en el Primer Contacto (First Contact Resolution Rate).
 - **KPI 3 (Resultado):** Puntuación de Satisfacción del Cliente (CSAT - Customer Satisfaction Score).

5. Cronograma y Presupuesto


- **Fases del Proyecto:**

Nº	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1	PLANIFICACIÓN	mar 1/07/25	lun 22/09/25
2	Levantamiento de requerimientos funcionales y técnicos	mar 1/07/25	lun 11/08/25
3	Conformación del equipo técnico y de gestión	lun 7/07/25	vie 11/07/25
4	Análisis normativo legal	mar 1/07/25	lun 11/08/25
5	Definición de la arquitectura de la solución	mar 12/08/25	lun 22/09/25
6	DISEÑO Y PROTOTIPADO	mar 23/09/25	lun 15/12/25

7	Diseño de experiencia de usuario (UX/UI)	mar 23/09/25	lun 20/10/25
8	Prototipo navegable y validación	mar 21/10/25	lun 17/11/25
9	Especificaciones funcionales finales	mar 18/11/25	lun 15/12/25
10	DESARROLLO E INTEGRACIÓN	mar 16/12/25	lun 4/05/26
11	Desarrollo de módulos principales	mar 16/12/25	lun 4/05/26
12	Generación de notificaciones y paneles de monitoreo	mar 16/12/25	lun 12/01/26
13	PRUEBAS Y VALIDACIÓN	mar 5/05/26	lun 29/06/26
14	Pruebas unitarias de integración y de sistema	mar 5/05/26	lun 1/06/26
15	Auditoría de seguridad y validación legal	mar 2/06/26	lun 29/06/26
16	CAPACITACIÓN Y DESPLIEGUE	mar 30/06/26	lun 7/09/26
17	Capacitación de operadores y usuarios administrativos	mar 30/06/26	lun 7/09/26
18	Lanzamiento progresivo	mar 30/06/26	lun 7/09/26
19	CIERRE	mar 8/09/26	lun 28/09/26
20	Informe Final	mar 8/09/26	lun 28/09/26

- **Presupuesto Total Asignado:** S/.43,200.00
- **Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios.

GRÁFICA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

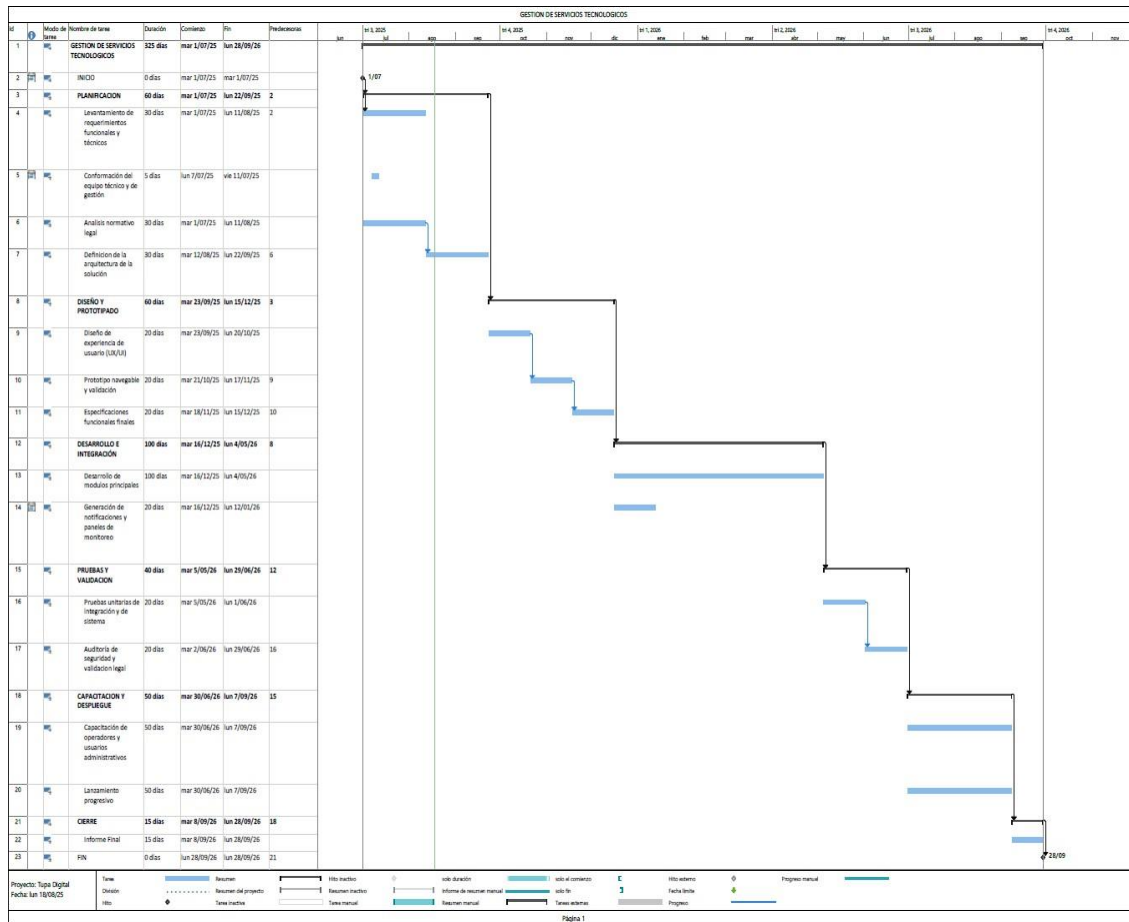

FICHA DE PROYECTO 18

Ficha de Proyecto: Sistema de Gestión de Inventario del Parque Informático

Código de Proyecto: MP-PGD-018

Fecha de última actualización: 14/08/2025

1. Identificación y Alineamiento Estratégico

- **Nombre del Proyecto:** Sistema de Gestión de Inventario del Parque Informático
- **Área/Unidad Responsable:** Gerencia de Tecnologías de la Información – Oficina de Soporte
- **Justificación del Proyecto (Problema o Necesidad):** Actualmente, la entidad carece de un sistema centralizado y automatizado para controlar sus activos de hardware y software. Este desconocimiento provoca un uso ineficiente de los recursos, riesgos de seguridad por equipos no controlados, y dificultades en la planificación de compras y renovaciones tecnológicas, impactando el presupuesto y la operatividad.
- **Objetivo Estratégico del Plan de Gobierno y Transformación Digital al que se alinea:** Optimizar el uso de los recursos del Estado mediante una gestión eficiente de los activos tecnológicos y fortalecer la postura de ciberseguridad institucional.
- **Brecha de Capacidad/Servicio que cierra:** El proyecto cierra la brecha de no contar con una capacidad de Gestión de Activos de TI (ITAM). Se pasa de un control manual, propenso a errores y desactualizado, a una gestión estratégica, automatizada y en tiempo real del ciclo de vida de los activos tecnológicos.

2. Alcance y Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Implementar un sistema de gestión de inventario para **mantener un registro actualizado de todos los activos informáticos, optimizar el uso y disponibilidad** de los mismos y **facilitar la toma de decisiones** estratégicas sobre su mantenimiento, reposición y actualización.
- **Objetivos Específicos:**
 - Implementar una plataforma que permita el descubrimiento automático y registro de todos los activos de hardware y software en la red.
 - Crear una base de datos única y confiable con el detalle de cada activo (características, ubicación, usuario, estado, etc.).
 - Automatizar la generación de reportes sobre el estado, uso y ciclo de vida del parque informático para soportar la planificación.
 - Controlar el licenciamiento de software para garantizar el cumplimiento normativo y optimizar costos.
- **Principales Entregables:**
 - Plataforma de software implementada y configurada.
 - Inventario inicial completo y auditado de todos los activos informáticos.
 - Reportes automatizados sobre distribución de activos, obsolescencia y cumplimiento de software.
 - Personal de TI capacitado en la administración del sistema.
- **Fuera del Alcance (Exclusiones):**
 - La compra o adquisición de nuevos activos informáticos.
 - La ejecución de tareas de mantenimiento físico o reparación de equipos.
 - La gestión de activos no tecnológicos (ej. mobiliario, vehículos).

3. Impacto y Beneficiarios

- **Descripción del Impacto Esperado:** El área de TI obtendrá visibilidad y control total sobre el parque informático. Esto se traducirá en ahorros de costos por la optimización de licencias y compras, una mayor seguridad al no tener equipos desconocidos en la red, y una planificación de inversiones tecnológicas mucho más precisa y efectiva.
- **Impacto Cuantitativo:**
 - Reducción del tiempo dedicado a auditorías manuales de inventario en un 80%.
 - Identificación de un potencial de ahorro del 15% en costos de licenciamiento.
 - Alcanzar una precisión del 98% en el inventario de activos.
- **Impacto Cualitativo:**
 - Mejora en la postura de seguridad al controlar todos los dispositivos conectados.
 - Decisiones de compra y renovación basadas en datos reales.
 - Mayor agilidad y eficiencia en las operaciones diarias de TI.
- **Beneficiarios Directos:** El personal de la Gerencia de Tecnologías de la Información.
- **Beneficiarios Indirectos:** Todas las áreas de la entidad, que se benefician de una gestión de recursos tecnológicos más ágil y planificada. El área de Administración y Finanzas, que contará con datos precisos para presupuestos y auditorías.

4. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

- **Indicadores de Gestión (Durante el proyecto):**
 - **% de Avance del Cronograma (SPI):** Cumplimiento mensual > 0.95.
 - **% de Ejecución Presupuestal (CPI):** Ejecución mensual < 1.05.
 - **Nº de Hitos Completados vs. Planificados:** 100% de cumplimiento.
- **Indicadores de Resultado (Post-implementación):**
 - **KPI 1 (Resultado):** Tasa de Precisión del Inventario.
 - **KPI 2 (Resultado):** Porcentaje de Licencias de Software Optimizadas (reutilizadas o dadas de baja).
 - **KPI 3 (Resultado):** Tiempo Promedio para Asignar un Activo a un nuevo usuario.

5. Cronograma y Presupuesto


- **Fases del Proyecto:**

Nº	DESCRIPCIÓN	Comienzo	Fin
1	PLANIFICACIÓN	mar 1/07/25	lun 21/07/25
2	Levantamiento de requerimientos funcionales y técnicos	mar 1/07/25	lun 14/07/25
3	Conformación del equipo técnico y de gestión	lun 7/07/25	jue 10/07/25
4	Definición de la arquitectura de la solución	mar 15/07/25	lun 21/07/25
5	DISEÑO Y PROTOTIPADO	mar 22/07/25	mié 27/08/25

6	Diseño de experiencia de usuario (UX/UI)	mar 22/07/25	lun 4/08/25
7	Prototipo navegable y validación	mar 5/08/25	lun 11/08/25
8	Especificaciones funcionales finales	mar 12/08/25	mié 27/08/25
9	DESARROLLO E INTEGRACIÓN	jue 28/08/25	mié 29/10/25
10	Desarrollo de módulos principales	jue 28/08/25	mié 29/10/25
11	PRUEBAS Y VALIDACIÓN	jue 30/10/25	mié 26/11/25
12	Pruebas unitarias de integración y de sistema	jue 30/10/25	mié 12/11/25
13	Auditoría de seguridad y validación legal	jue 13/11/25	mié 26/11/25
14	CAPACITACIÓN Y DESPLIEGUE	jue 27/11/25	mié 31/12/25
15	Capacitación de operadores y usuarios administrativos	jue 27/11/25	mié 17/12/25
16	Lanzamiento progresivo	jue 18/12/25	mié 31/12/25

- **Presupuesto Total Asignado:** S/.24,000.00
- **Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios.

GRÁFICA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

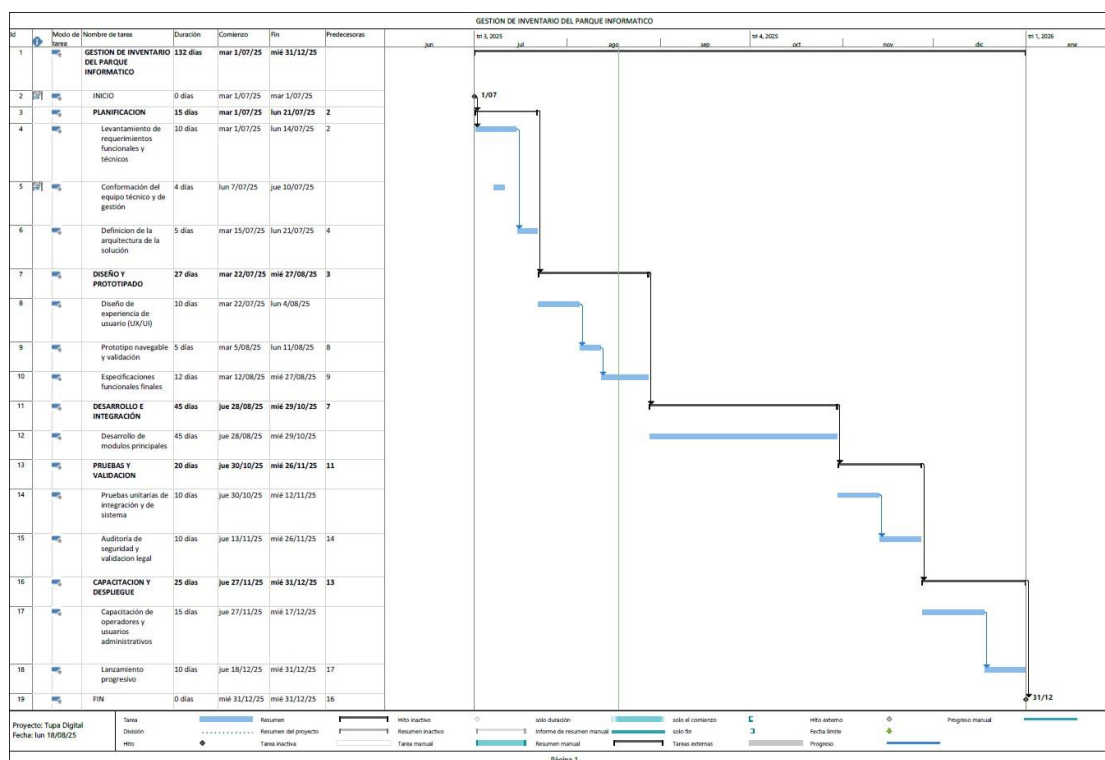

FICHA DE PROYECTO 19

Proyecto: Modernización de Equipos de Cómputo para Servicios Administrativos y Operativos

Código de Proyecto: MP-PGD-019

Fecha de última actualización: 14/08/2025

1. Identificación y Alineamiento Estratégico

- **Nombre del Proyecto:** Modernización de Equipos de Cómputo para Servicios Administrativos y Operativos.
- **Área/Unidad Responsable:** Gerencia de Tecnologías de la Información, en coordinación con la Oficina de Soporte y la Gerencia de Logística.
- **Justificación del Proyecto (Problema o Necesidad):** Gran parte del parque informático actual se encuentra obsoleto, lo que ocasiona lentitud en los procesos, fallas constantes y vulnerabilidades de seguridad. Esta obsolescencia tecnológica reduce la productividad del personal y limita la capacidad de ofrecer una atención ágil y de calidad a la ciudadanía.
- **Objetivo Estratégico del Plan de Gobierno y Transformación Digital al que se alinea:** Dotar a la institución de las herramientas tecnológicas necesarias para asegurar la continuidad operativa y la eficiencia en la prestación de servicios, mejorando directamente la atención al ciudadano.
- **Brecha de Capacidad/Servicio que cierra:** El proyecto cierra la brecha de hardware obsoleto que constituye un cuello de botella para el desempeño institucional. Proporciona la base tecnológica indispensable para ejecutar software moderno, operar de forma segura y atender las demandas actuales de servicio.

2. Alcance y Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Modernizar los equipos de cómputo de la Fiscalía de la Nación para **optimizar los servicios administrativos y operativos**, garantizando así una **mejor y más rápida atención a la ciudadanía**.
- **Objetivos Específicos:**
 - Adquirir equipos de cómputo (desktops y/o laptops) que cumplan con los estándares técnicos modernos para el alto rendimiento.
 - Reemplazar el 100% de los equipos identificados con un alto grado de obsolescencia en áreas críticas.
 - Asegurar la correcta configuración e instalación del software institucional y protocolos de seguridad en los nuevos equipos.
 - Gestionar la disposición final de los equipos antiguos de acuerdo a la normativa vigente.
- **Principales Entregables:**
 - Lote de equipos de cómputo nuevos adquiridos y recepcionados.
 - Equipos nuevos desplegados, instalados y operativos en los puestos de los usuarios finales.
 - Acta de conformidad de los usuarios que recibieron los nuevos equipos.
 - Informe de disposición final de los equipos dados de baja.
- **Fuera del Alcance (Exclusiones):**
 - La adquisición de licenciamiento de software que no venga incluido con el equipo.
 - La compra de periféricos mayores como impresoras o escáneres.
 - La mejora de la infraestructura de red o cableado.

3. Impacto y Beneficiarios

- **Descripción del Impacto Esperado:** Se espera una mejora tangible en la velocidad y fiabilidad de las tareas diarias. El personal será más productivo, los tiempos de procesamiento de trámites disminuirán y se fortalecerá la seguridad informática. Esto resultará en una mejor percepción del servicio que brinda la Fiscalía.
- **Impacto Cuantitativo:**
 - Reducción de los tiempos de inactividad por fallas de hardware en un 50%.
 - Disminución del tiempo promedio para completar tareas administrativas digitales en un 25%.
- **Impacto Cualitativo:**
 - Mejora en la moral y satisfacción del personal con sus herramientas de trabajo.
 - Proyección de una imagen institucional moderna y eficiente de cara al ciudadano.
 - Mitigación de riesgos de ciberseguridad asociados a hardware y sistemas operativos desactualizados.
- **Beneficiarios Directos:** El personal administrativo y operativo de la Fiscalía de la Nación que recibirá los nuevos equipos.
- **Beneficiarios Indirectos:** La ciudadanía, que recibirá un servicio más rápido y eficaz; y el área de TI, que verá reducida la carga de trabajo por mantenimiento correctivo.

4. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

- **Indicadores de Gestión (Durante el proyecto):**
 - **% de Avance del Cronograma (SPI):** Cumplimiento mensual > 0.95.
 - **% de Ejecución Presupuestal (CPI):** Ejecución mensual < 1.05.
 - **Nº de Hitos Completados vs. Planificados:** 100% de cumplimiento.
- **Indicadores de Resultado (Post-implementación):**
 - **KPI 1 (Resultado):** Porcentaje de equipos obsoletos reemplazados.
 - **KPI 2 (Resultado):** Reducción en el número de tickets de soporte técnico relacionados con fallas de hardware.
 - **KPI 3 (Resultado):** Puntuación en la encuesta de satisfacción de usuarios con los nuevos equipos.

5. Cronograma y Presupuesto

- **Fases del Proyecto:**

Nº	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1	Fase 1: Planificación y Requisitos	lun 5/01/26	vie 1/05/26
2	Definición de necesidades y especificaciones	lun 5/01/26	vie 6/02/26
3	Elaboración del documento de justificación y alcance del proyecto.	lun 9/02/26	vie 27/02/26




4	Elaboración de especificaciones técnicas detalladas y requisitos mínimos.	lun 2/03/26	vie 20/03/26
5	Preparación de la documentación para la licitación.	lun 23/03/26	vie 1/05/26
6	Proceso de Licitación y Adjudicación	lun 4/05/26	vie 11/09/26
7	Publicación de la convocatoria de licitación.	lun 4/05/26	vie 22/05/26
8	Periodo de consultas y aclaraciones para los proveedores interesados.	lun 25/05/26	vie 19/06/26
9	Evaluación de las propuestas por el comité de selección.	lun 22/06/26	vie 3/07/26
10	Elaboración del informe de evaluación y selección del proveedor.	lun 6/07/26	vie 24/07/26
11	Adjudicación del contrato al proveedor seleccionado.	lun 27/07/26	vie 7/08/26
12	Notificación formal al proveedor ganador y a los demás participantes.	lun 10/08/26	vie 21/08/26
13	Firma del contrato con el proveedor adjudicado.	lun 24/08/26	vie 11/09/26
14	Entrega, Instalación y Configuración	lun 14/09/26	vie 13/08/27
15	Entrega de los equipos de cómputo por parte del proveedor.	lun 14/09/26	vie 15/01/27
16	Instalación de software necesario y configuración de accesos.	lun 18/01/27	vie 26/03/27
17	Instalación física de los equipos en las oficinas o áreas designadas.	lun 29/03/27	vie 13/08/27



18	Puesta en marcha oficial de los nuevos equipos.	lun 16/08/27	vie 5/11/27
19	Informe de fin del proyecto	lun 16/08/27	vie 10/09/27
20	Seguimiento y soporte técnico continuo durante las primeras semanas de uso.	lun 16/08/27	vie 5/11/27

- **Presupuesto Total Asignado:** S/. 30,804,000.00
- **Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios.

GRÁFICA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

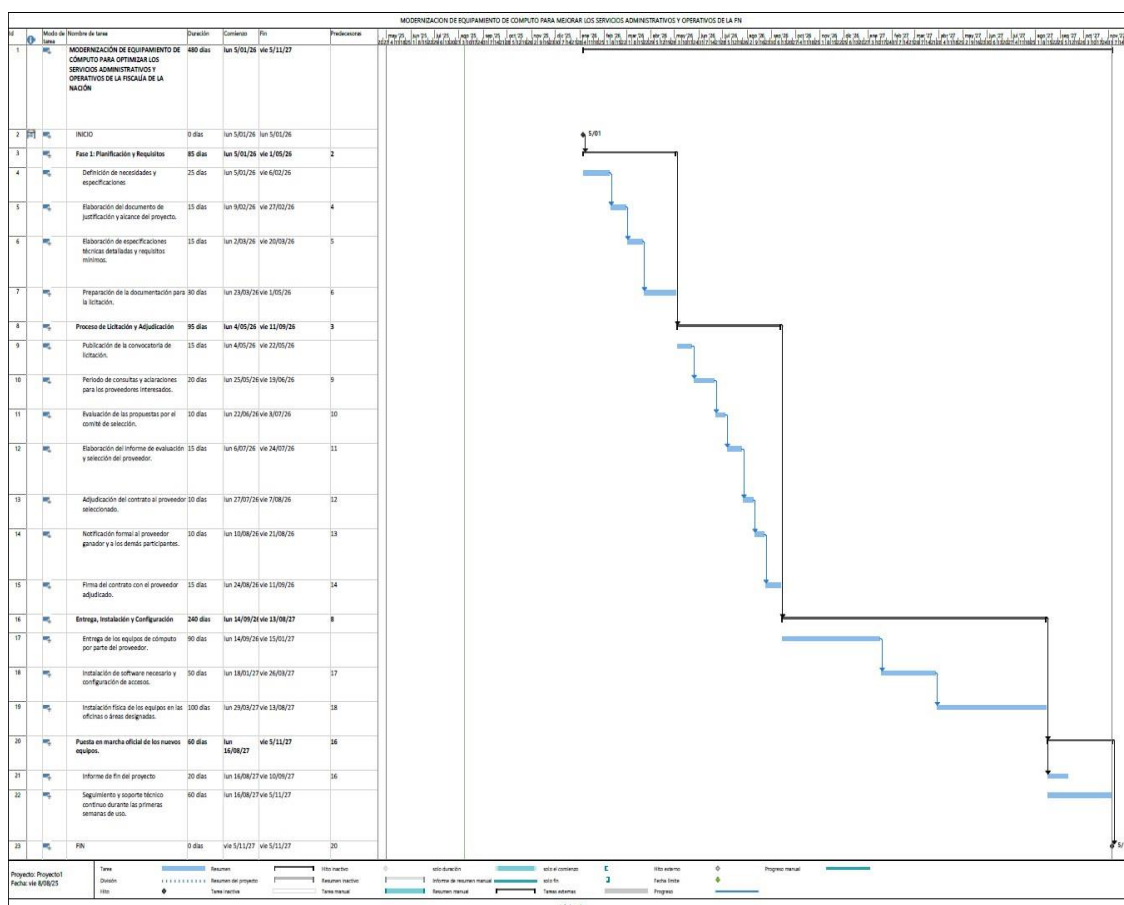

FICHA DE PROYECTO 20

Proyecto: Implementación de un Chatbot para la Mesa de Ayuda de TI.

Código de Proyecto: MP-PGD-020

Fecha de última actualización: 14/08/2025

1. Identificación y Alineamiento Estratégico

- **Nombre del Proyecto:** Implementación de un Chatbot para la Mesa de Ayuda de TI.
- **Área/Unidad Responsable:** Gerencia de Tecnologías de la Información.
- **Justificación del Proyecto (Problema o Necesidad):** La mesa de ayuda de TI enfrenta un alto volumen de consultas repetitivas y de baja complejidad, lo que satura al equipo de soporte, incrementa los tiempos de respuesta para incidentes complejos y limita la atención al horario de oficina. Este modelo es ineficiente y genera una experiencia de usuario subóptima.
- **Objetivo Estratégico del Plan de Gobierno y Transformación Digital al que se alinea:** Modernizar los servicios internos de la entidad mediante la adopción de tecnologías de automatización e inteligencia artificial para mejorar la eficiencia operativa.
- **Brecha de Capacidad/Servicio que cierra:** El proyecto cierra la brecha de no contar con un canal de soporte automatizado de primer nivel disponible 24/7. Introduce una capacidad de autoservicio que actualmente no existe, permitiendo a los usuarios resolver problemas comunes de forma instantánea.

2. Alcance y Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Implementar un chatbot en la mesa de ayuda para **automatizar la atención al usuario, optimizando los tiempos de respuesta** a consultas frecuentes y **reduciendo la carga de trabajo** operativo del equipo de soporte.
- **Objetivos Específicos:**
 - Desarrollar y entrenar un chatbot capaz de resolver las preguntas más frecuentes (FAQs).
 - Integrar el chatbot con el sistema de gestión de tickets para escalar los casos que requieran intervención humana.
 - Crear y alimentar una base de conocimiento que sirva como fuente de información para el chatbot.
 - Lograr una alta tasa de resolución de consultas sin necesidad de intervención humana.
- **Principales Entregables:**
 - Chatbot funcional e integrado en los canales de comunicación corporativos (ej. Intranet, Microsoft Teams).
 - Base de conocimiento con un mínimo de 100 artículos para el lanzamiento.
 - Panel de control (dashboard) con métricas de rendimiento del chatbot (interacciones, tasa de resolución, etc.).
- **Fuera del Alcance (Exclusiones):**
 - La resolución de incidentes complejos que requieran análisis técnico especializado.
 - El soporte a usuarios externos o ciudadanos.
 - El desarrollo de la plataforma de mesa de ayuda (el chatbot se integrará a la existente).

3. Impacto y Beneficiarios

- **Descripción del Impacto Esperado:** Los usuarios obtendrán respuestas inmediatas a sus consultas de TI más comunes, a cualquier hora del día. El equipo de soporte técnico se liberará de tareas repetitivas, pudiendo concentrarse en incidentes de mayor impacto y proyectos estratégicos, mejorando la percepción general del servicio de TI.
- **Impacto Cuantitativo:**
 - Automatizar la resolución del 30% del total de solicitudes a la mesa de ayuda.
 - Reducir el tiempo de primera respuesta para consultas simples de horas a segundos.
 - Ampliar la cobertura de atención a 24 horas, 7 días a la semana.
- **Impacto Cualitativo:**
 - Mejora en la satisfacción del usuario interno con el soporte de TI.
 - Fomento de una cultura de autoservicio entre los colaboradores.
 - Transformación del equipo de soporte hacia un rol más estratégico y menos reactivo.
- **Beneficiarios Directos:** Todos los colaboradores de la entidad (usuarios) y el personal de la mesa de ayuda de TI.
- **Beneficiarios Indirectos:** La organización en su conjunto, al beneficiarse de una menor pérdida de tiempo por problemas de TI y un área de tecnología más eficiente.

4. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

- **Indicadores de Gestión (Durante el proyecto):**
 - **% de Avance del Cronograma (SPI):** Cumplimiento mensual > 0.95.
 - **% de Ejecución Presupuestal (CPI):** Ejecución mensual < 1.05.
 - **Nº de Hitos Completados vs. Planificados:** 100% de cumplimiento.
- **Indicadores de Resultado (Post-implementación):**
 - **KPI 1 (Resultado):** Tasa de Resolución del Chatbot (interacciones resueltas sin escalamiento).
 - **KPI 2 (Resultado):** Reducción en el volumen de tickets manuales para consultas frecuentes.
 - **KPI 3 (Resultado):** Puntuación de Satisfacción del Usuario (CSAT) tras interactuar con el chatbot.

5. Cronograma y Presupuesto

- **Fases del Proyecto:**


Nº	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
25 días	PLANIFICACIÓN	mar 1/07/25	lun 4/08/25
20 días	Levantamiento de requerimientos funcionales y técnicos	mar 1/07/25	lun 28/07/25
4 días	Conformación del equipo técnico y de gestión	lun 7/07/25	jue 10/07/25
5 días	Análisis normativo legal	lun 7/07/25	vie 11/07/25
5 días	Definición de la arquitectura del sistema	mar 29/07/25	lun 4/08/25
24 días	DISEÑO Y PROTOTIPADO	mar 5/08/25	vie 5/09/25

10 días	Diseño de experiencia de usuario (UX/UI)	mar 5/08/25	lun 18/08/25
2 días	Prototipo navegable y validación	mar 19/08/25	mié 20/08/25
12 días	Especificaciones funcionales finales	jue 21/08/25	vie 5/09/25
70 días	DESARROLLO E INTEGRACIÓN	lun 8/09/25	vie 12/12/25
70 días	Desarrollo de módulos principales	lun 8/09/25	vie 12/12/25
30 días	Generación de notificaciones y paneles de monitoreo	lun 29/09/25	vie 7/11/25
42 días	PRUEBAS Y VALIDACIÓN	lun 15/12/25	mar 10/02/26
32 días	Pruebas unitarias de integración y de sistema	lun 15/12/25	mar 27/01/26
10 días	Auditoría de seguridad y validación legal	mié 28/01/26	mar 10/02/26
30 días	CAPACITACIÓN Y DESPLIEGUE	mié 11/02/26	mar 24/03/26
30 días	Capacitación de operadores y usuarios administrativos	mié 11/02/26	mar 24/03/26
30 días	Lanzamiento progresivo con plan de contingencia	mié 11/02/26	mar 24/03/26

Presupuesto Total Asignado: S/. 20,000.00

- **Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios.

GRÁFICA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

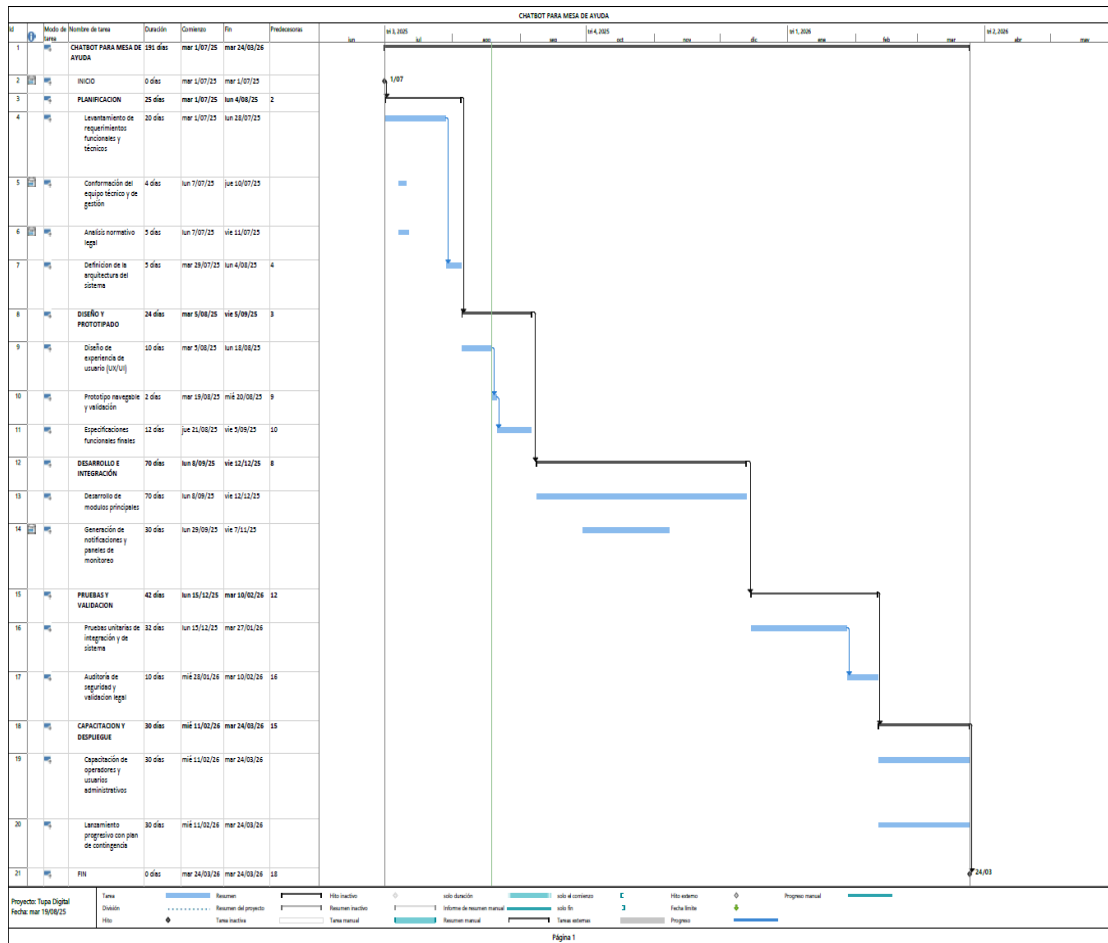

FICHA DE PROYECTO 21

Proyecto: Mejoramiento y Renovación de Equipos Multifuncionales por Obsolescencia.

Código de Proyecto: MP-PGD-021

Fecha de última actualización: 14/08/2025

1. Identificación y Alineamiento Estratégico

- **Nombre del Proyecto:** Mejoramiento y Renovación de Equipos Multifuncionales por Obsolescencia.
- **Área/Unidad Responsable:** Gerencia de Tecnologías de la Información, en coordinación la Oficina de Soporte y con la Gerencia de Logística.
- **Justificación del Proyecto (Problema o Necesidad):** Una parte importante de los equipos multifuncionales (impresoras/escáneres) ha superado los 5 años de antigüedad, lo que los convierte en equipos obsoletos. Esto provoca fallas operativas constantes, altos costos de mantenimiento correctivo y una baja eficiencia en los procesos de digitalización e impresión, afectando las labores administrativas diarias.
- **Objetivo Estratégico del Plan de Gobierno y Transformación Digital al que se alinea:** Asegurar la continuidad operativa de la institución mediante la dotación de herramientas tecnológicas adecuadas que soporten eficientemente los procesos administrativos y documentales.
- **Brecha de Capacidad/Servicio que cierra:** El proyecto cierra la brecha de obsolescencia en la infraestructura de impresión y digitalización. Reemplaza tecnología poco fiable y costosa por equipos modernos que cumplen con los requerimientos tecnológicos actuales de velocidad, seguridad y eficiencia.

2. Alcance y Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Realizar la **reposición de los equipos multifuncionales con más de 5 años de antigüedad** para **optimizar los procesos** administrativos y operativos, asegurando el uso de tecnología acorde a los requerimientos actuales.
- **Objetivos Específicos:**
 - Adquirir equipos multifuncionales modernos que cumplan con especificaciones técnicas de rendimiento, seguridad y eficiencia energética.
 - Reemplazar el 100% de los equipos identificados como obsoletos.
 - Configurar los nuevos equipos en la red institucional, aplicando políticas de seguridad y acceso.
 - Gestionar la baja y disposición final de los equipos antiguos conforme a la normativa.
- **Principales Entregables:**
 - Flota de equipos multifuncionales nuevos adquiridos y recepcionados.
 - Equipos nuevos instalados, configurados y operativos en las áreas designadas.
 - Informe de inventario actualizado con los equipos nuevos y los dados de baja.
- **Fuera del Alcance (Exclusiones):**
 - La adquisición de impresoras personales o de escritorio.
 - La compra de suministros (tóner, papel) más allá de la carga inicial.
 - Modificaciones en la infraestructura de red eléctrica o de datos.

3. Impacto y Beneficiarios

- **Descripción del Impacto Esperado:** Se espera una mejora significativa en la disponibilidad y velocidad de los servicios de impresión, copiado y escaneo. Esto reducirá las interrupciones en

el flujo de trabajo, disminuirá los costos operativos asociados a reparaciones y permitirá al personal realizar sus tareas documentales de manera más ágil.

- **Impacto Cuantitativo:**
 - Reducción de las llamadas a soporte técnico por fallas de multifuncionales en un 70%.
 - Disminución del gasto en mantenimiento correctivo para esta flota de equipos.
- **Impacto Cualitativo:**
 - Aumento de la productividad del personal al reducir los tiempos de espera y las interrupciones.
 - Mejora en la seguridad de los documentos mediante funciones modernas de los nuevos equipos.
 - Estandarización de la plataforma de impresión, facilitando la gestión y el soporte.
- **Beneficiarios Directos:** Todo el personal de la institución que utiliza los servicios de impresión, copiado y escaneo para sus labores diarias.
- **Beneficiarios Indirectos:** La Gerencia de Tecnologías de la Información, cuya carga de trabajo en soporte correctivo disminuirá, permitiendo enfocarse en tareas de mayor valor estratégico.

4. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

- **Indicadores de Gestión (Durante el proyecto):**
 - **% de Avance del Cronograma (SPI):** Cumplimiento mensual > 0.95.
 - **% de Ejecución Presupuestal (CPI):** Ejecución mensual < 1.05.
 - **Nº de Hitos Completados vs. Planificados:** 100% de cumplimiento.
- **Indicadores de Resultado (Post-implementación):**
 - **KPI 1 (Resultado):** Porcentaje de equipos con más de 5 años de antigüedad que fueron reemplazados.
 - **KPI 2 (Resultado):** Reducción en el número de tickets de soporte mensuales asociados a multifuncionales.
 - **KPI 3 (Resultado):** Nivel de satisfacción de los usuarios con la velocidad y funcionalidad de los nuevos equipos.

5. Cronograma y Presupuesto

- **Fases del Proyecto:**

Nº	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1	Fase 1: Planificación y Requisitos	lun 5/01/26	vie 24/04/26
2	Definición de necesidades y especificaciones técnicas.	lun 5/01/26	vie 30/01/26
3	Elaboración del documento de justificación y alcance del proyecto.	lun 2/02/26	vie 20/02/26
4	Elaboración de especificaciones técnicas detalladas y requisitos mínimos.	lun 23/02/26	vie 13/03/26

5	Preparación de la documentación para la licitación.	lun 16/03/26	vie 24/04/26
6	Proceso de Licitación y Adjudicación	lun 27/04/26	vie 9/10/26
7	Publicación de la convocatoria de licitación.	lun 27/04/26	vie 15/05/26
8	Periodo de consultas y aclaraciones para los proveedores interesados.	lun 18/05/26	vie 12/06/26
9	Evaluación de las propuestas por el comité de selección.	lun 15/06/26	vie 3/07/26
10	Elaboración del informe de evaluación y selección del proveedor.	lun 6/07/26	vie 24/07/26
11	Adjudicación del contrato al proveedor seleccionado.	lun 27/07/26	vie 21/08/26
12	Notificación formal al proveedor ganador y a los demás participantes.	lun 24/08/26	vie 18/09/26
13	Firma del contrato con el proveedor adjudicado.	lun 21/09/26	vie 9/10/26
14	Entrega, Instalación y Configuración	lun 12/10/26	vie 16/07/27
15	Entrega de los equipos de cómputo por parte del proveedor.	lun 12/10/26	vie 29/01/27
16	Instalación y configuración de accesos.	lun 1/02/27	vie 7/05/27
17	Instalación física de los equipos en las oficinas o áreas designadas.	lun 10/05/27	vie 16/07/27
18	Puesta en marcha oficial de los nuevos equipos.	lun 19/07/27	vie 5/11/27
19	Informe de fin del proyecto	lun 19/07/27	vie 13/08/27
20	Seguimiento y soporte técnico continuo durante las primeras semanas de uso.	lun 16/08/27	vie 5/11/27

- **Presupuesto Total Asignado:** S/.29,580,000.00
- **Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios.

[illegible]

FICHA DE PROYECTO 22

Proyecto: Mejoramiento y Estabilización del Suministro Eléctrico para Equipos Informáticos.

Código de Proyecto: MP-PGD-022

Fecha de última actualización: 14/08/2025

1. Identificación y Alineamiento Estratégico

- **Nombre del Proyecto:** Mejoramiento y Estabilización del Suministro Eléctrico para Equipos Informáticos.
- **Área/Unidad Responsable:** Gerencia de Tecnologías de la Información, en coordinación con la Oficina de Soporte, Oficina General de Inversiones.
- **Justificación del Proyecto (Problema o Necesidad):** Múltiples sedes de la institución operan con un suministro eléctrico deficiente, caracterizado por **corriente muy fluctuante, cortes intermitentes y cortes programados por horas**. Esta situación crítica provoca la interrupción de los servicios, riesgo de daño permanente a los equipos informáticos y posible pérdida de información, afectando directamente la continuidad operativa.
- **Objetivo Estratégico del Plan de Gobierno y Transformación Digital al que se alinea:** Garantizar la continuidad y resiliencia de los servicios tecnológicos de la institución mediante el fortalecimiento de la infraestructura física que los soporta.
- **Brecha de Capacidad/Servicio que cierra:** El proyecto cierra una brecha fundamental de infraestructura al no contar con sistemas de protección y respaldo de energía. Provee una capa de resiliencia que actualmente es inexistente para salvaguardar los activos de TI y asegurar la operación ininterrumpida ante fallas del servicio eléctrico comercial.

2. Alcance y Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Implementar soluciones de protección y respaldo de energía en las sedes afectadas para mitigar los efectos de las fluctuaciones y cortes de energía, asegurando así la operación continua y la integridad de los equipos informáticos.
- **Objetivos Específicos:**
 - Realizar un diagnóstico técnico del estado del suministro eléctrico en las sedes críticas.
 - Adquirir e instalar Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS) para proteger servidores, equipos de comunicaciones y estaciones de trabajo.
 - Instalar grupos electrógenos en sedes con cortes de energía prolongados o recurrentes.
 - Implementar soluciones de regulación de voltaje en sedes con alta fluctuación.
- **Principales Entregables:**
 - Informe de diagnóstico técnico de las sedes evaluadas.
 - Equipos UPS adquiridos, instalados y operativos.
 - Grupos electrógenos instalados y funcionales en las sedes designadas.
 - Personal local capacitado en el monitoreo y operación básica de los nuevos equipos.
- **Fuera del Alcance (Exclusiones):**
 - La renovación del sistema de cableado eléctrico general de los edificios.
 - El respaldo energético para sistemas no informáticos (ej. iluminación, aire acondicionado general).
 - La negociación con las empresas proveedoras de servicio eléctrico.

3. Impacto y Beneficiarios

- **Descripción del Impacto Esperado:** Se eliminarán las interrupciones del servicio y las paradas operativas causadas por problemas eléctricos. Los equipos informáticos estarán protegidos contra daños, y el personal podrá continuar sus labores durante los cortes de energía, garantizando la continuidad de las funciones críticas de la institución.
- **Impacto Cuantitativo:**
 - Reducción del tiempo de inactividad de los servicios de TI por causas eléctricas en un 99%.
 - Eliminación de los costos de reparación o reemplazo de equipos por fallas eléctricas.
 - Garantizar la autonomía operativa por un mínimo de 4 horas en sedes con grupos electrógenos.
- **Impacto Cualitativo:**
 - Aumento drástico de la fiabilidad y resiliencia de los servicios tecnológicos.
 - Protección de la integridad de los activos de información y equipamiento de la institución.
 - Mejora de la capacidad operativa en sedes con infraestructura eléctrica deficiente.
- **Beneficiarios Directos:** Todo el personal que labora en las sedes afectadas y la Gerencia de Tecnologías de la Información.
- **Beneficiarios Indirectos:** La institución en su conjunto, que depende de la disponibilidad de sus sistemas, y la ciudadanía, que no verá interrumpida la prestación de servicios por estas causas.

4. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

- **Indicadores de Gestión (Durante el proyecto):**
 - **% de Avance del Cronograma (SPI):** Cumplimiento mensual > 0.95.
 - **% de Ejecución Presupuestal (CPI):** Ejecución mensual < 1.05.
 - **Nº de Hitos Completados vs. Planificados:** 100% de cumplimiento.
- **Indicadores de Resultado (Post-implementación):**
 - **KPI 1 (Resultado):** Porcentaje de reducción de incidentes de caída de servicios atribuidos a fallas eléctricas.
 - **KPI 2 (Resultado):** Número de activos críticos (servidores, switches) protegidos con UPS y/o generador.
 - **KPI 3 (Resultado):** Disponibilidad de los sistemas durante eventos de corte eléctrico que antes eran disruptivos.

5. Cronograma y Presupuesto

- **Fases del Proyecto:**


Nº	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1	PLANIFICACION Y ANALISIS	lun 5/01/26	vie 1/05/26
2	Identificación de necesidad	lun 5/01/26	vie 30/01/26
3	Detección de problemas y visitas técnicas	lun 2/02/26	vie 27/02/26
4	Plan de trabajo	lun 2/03/26	vie 27/03/26



5	Estimación de requerimientos técnicos	lun 30/03/26	vie 10/04/26
6	Elaboración de EETT	lun 13/04/26	vie 24/04/26
7	Aprobación de EETT	lun 27/04/26	vie 1/05/26
8	ADQUISICIÓN	lun 4/05/26	vie 30/10/26
9	Estudio de Mercado	lun 4/05/26	vie 5/06/26
10	Proceso de Selección	lun 8/06/26	vie 28/08/26
11	Convocatoria de proceso	lun 31/08/26	vie 9/10/26
12	Firma de contrato	lun 12/10/26	vie 30/10/26
13	IMPLEMENTACIÓN	lun 2/11/26	vie 19/02/27
14	Instalación de equipos estabilizadores	lun 2/11/26	vie 19/02/27
15	CIERRE	lun 22/02/27	vie 5/03/27
16	Informe final	lun 22/02/27	vie 5/03/27

- **Presupuesto Total Asignado:** S/ .8,000.000.00
- **Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios.

GRÁFICA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

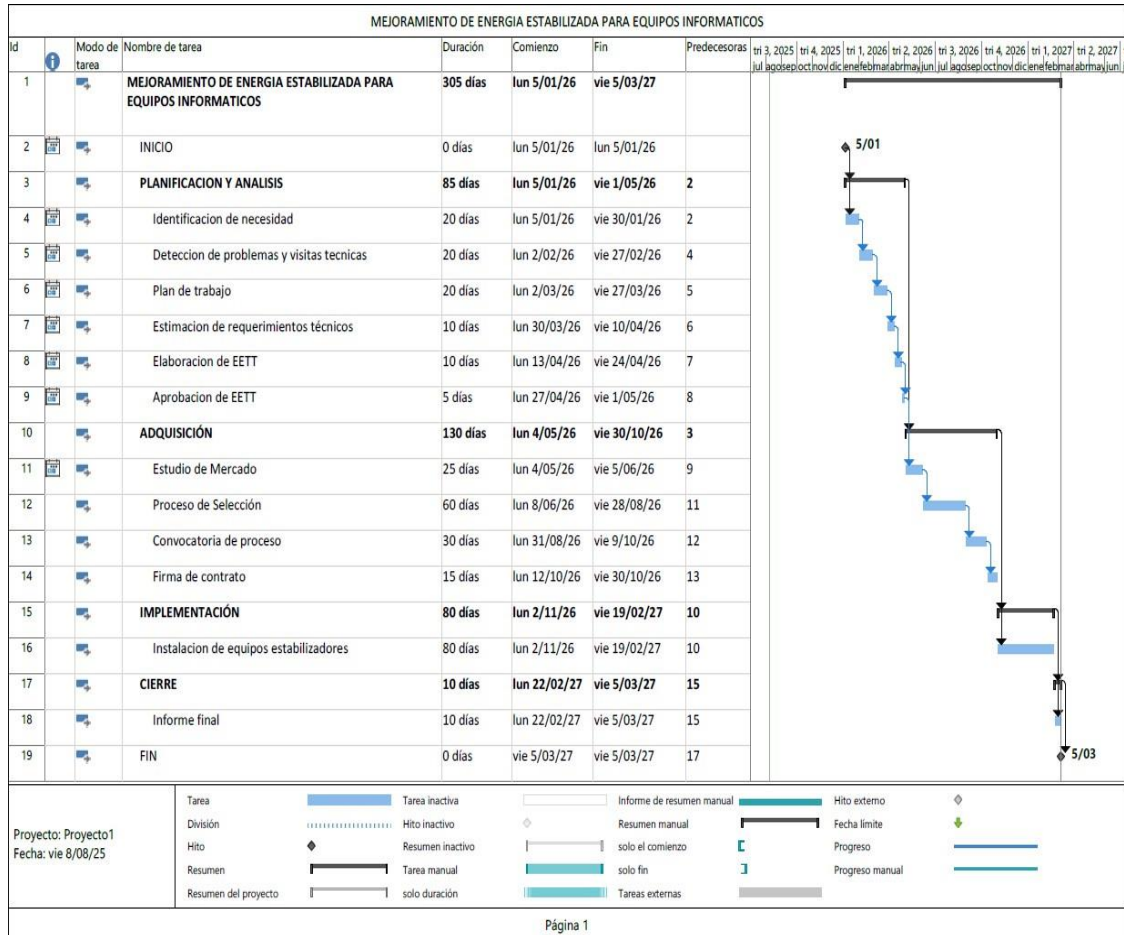

FICHA DE PROYECTO 23

Proyecto: Servicio de Mantenimiento Constante y Suministro de Consumibles para Multifuncionales-Escáner a Nivel Nacional.

Código de Proyecto: MP-PGD-023

Fecha de última actualización: 14/08/2025

1. Identificación y Alineamiento Estratégico

- **Nombre del Proyecto:** Servicio de Mantenimiento Constante y Suministro de Consumibles para Multifuncionales-Escáner a Nivel Nacional.
- **Área/Unidad Responsable:** Gerencia de Logística, en coordinación con la Gerencia de Tecnologías de la Información.
- **Justificación del Proyecto (Problema o Necesidad):** Existe una cantidad significativa de equipos multifuncionales inactivos a nivel nacional, principalmente por la **falta de consumibles** (tóner, kits de mantenimiento) y un plan de mantenimiento proactivo. Esta situación interrumpe las labores diarias, representa una pérdida sobre la inversión en hardware y evidencia una falla en la cadena de suministro logístico.
- **Objetivo Estratégico del Plan de Gobierno y Transformación Digital al que se alinea:** Garantizar la continuidad operativa de la institución, asegurando la disponibilidad de las herramientas tecnológicas y recursos esenciales para el desarrollo de las funciones en todas las sedes.
- **Brecha de Capacidad/Servicio que cierra:** El proyecto cierra una brecha crítica de gestión logística y de servicios. Reemplaza un proceso de abastecimiento reactivo e ineficaz por un servicio gestionado y proactivo que garantiza el funcionamiento continuo de la flota nacional de equipos multifuncionales.

2. Alcance y Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Implementar un servicio centralizado para el **mantenimiento constante** y el suministro proactivo de consumibles para toda la flota de equipos multifuncionales a nivel nacional, teniendo como meta inmediata la **recuperación de todos los equipos inactivos**.
- **Objetivos Específicos:**
 - Realizar un inventario nacional para identificar todos los equipos inactivos y determinar sus necesidades específicas de consumibles y/o reparaciones.
 - Contratar un servicio gestionado que incluya mantenimiento preventivo y la reposición automática de consumibles antes de su agotamiento.
 - Reactivar y poner en estado operativo el 100% de los equipos viables que se encuentran actualmente inactivos.
 - Establecer Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS/SLA) para los tiempos de atención y solución de fallas.
- **Principales Entregables:**
 - Informe de inventario detallado del estado de la flota de multifuncionales a nivel nacional.
 - Contrato de servicio gestionado de mantenimiento y suministro adjudicado y en ejecución.
 - Totalidad de equipos multifuncionales previamente inactivos, recuperados y en pleno funcionamiento.
 - Protocolo de atención y solicitud de servicio unificado para todas las sedes.
- **Fuera del Alcance (Exclusiones):**
 - La adquisición de nuevos equipos multifuncionales.

- El mantenimiento o suministro para impresoras personales.
- La compra de papel.

3. Impacto y Beneficiarios

- **Descripción del Impacto Esperado:** Se garantizará que todos los equipos multifuncionales a nivel nacional se mantengan operativos de forma continua. Esto eliminará las interrupciones en los flujos de trabajo administrativo-fiscales, maximizará el retorno de la inversión del hardware existente y estandarizará el proceso de soporte y abastecimiento.
- **Impacto Cuantitativo:**
 - Alcanzar un tiempo de operatividad (uptime) superior al 95% para la flota nacional de multifuncionales.
 - Recuperar el 100% de los equipos inactivos por falta de consumibles.
 - Reducir a cero el tiempo de inactividad por desabastecimiento de consumibles.
- **Impacto Cualitativo:**
 - Mejora de la moral y productividad del personal al contar con herramientas de trabajo fiables.
 - Costos operativos predecibles para el servicio de impresión y mantenimiento.
 - Proceso de soporte estandarizado y confiable para todas las sedes, sin importar su ubicación.
- **Beneficiarios Directos:** Todo el personal fiscal y administrativo a nivel nacional que depende de los servicios de impresión, copiado y escaneo.
- **Beneficiarios Indirectos:** Las áreas de Logística y TI, al simplificar la gestión de estos activos, y la institución en su conjunto, al mejorar su eficiencia general.

4. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

- **Indicadores de Gestión (Durante el proyecto):**
 - **% de Avance del Cronograma (SPI):** Cumplimiento mensual > 0.95.
 - **% de Ejecución Presupuestal (CPI):** Ejecución mensual < 1.05.
 - **Nº de Hitos Completados vs. Planificados:** 100% de cumplimiento.
- **Indicadores de Resultado (Post-implementación):**
 - **KPI 1 (Resultado):** Tasa de Disponibilidad Operativa de la flota de multifuncionales.
 - **KPI 2 (Resultado):** Porcentaje de equipos recuperados y puestos en servicio.
 - **KPI 3 (Resultado):** Tiempo promedio de atención de tickets de mantenimiento bajo el nuevo contrato de servicio.

5. Cronograma y Presupuesto

- **Fases del Proyecto:**


Nº	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1	PLANIFICACION Y ANALISIS	mié 1/10/25	mar 24/03/26
2	Identificación de necesidad	mié 1/10/25	mar 11/11/25



3	Detección de problemas y visitas técnicas	mié 12/11/25	mar 23/12/25
4	Plan de trabajo	mié 24/12/25	mar 20/01/26
5	Estimación de requerimientos técnicos	mié 21/01/26	mar 17/02/26
6	Elaboración de TDR	mié 18/02/26	mar 10/03/26
7	Aprobación de TDR	mié 11/03/26	mar 24/03/26
8	ADQUISICIÓN	mié 25/03/26	mar 24/11/26
9	Estudio de Mercado	mié 25/03/26	mar 5/05/26
10	Proceso de Selección	mié 6/05/26	mar 22/09/26
11	Convocatoria de proceso	mié 23/09/26	mar 3/11/26
12	Firma de contrato	mié 4/11/26	mar 24/11/26
13	IMPLEMENTACIÓN	mié 25/11/26	mar 23/11/27
14	Mantenimientos de equipos multifuncionales	mié 25/11/26	mar 23/11/27
15	CIERRE	mié 24/11/27	mar 7/12/27
16	Informe final	mié 24/11/27	mar 7/12/27

- **Presupuesto Total Asignado:** S/.6,000,000.00
- **Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios.

GRÁFICA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

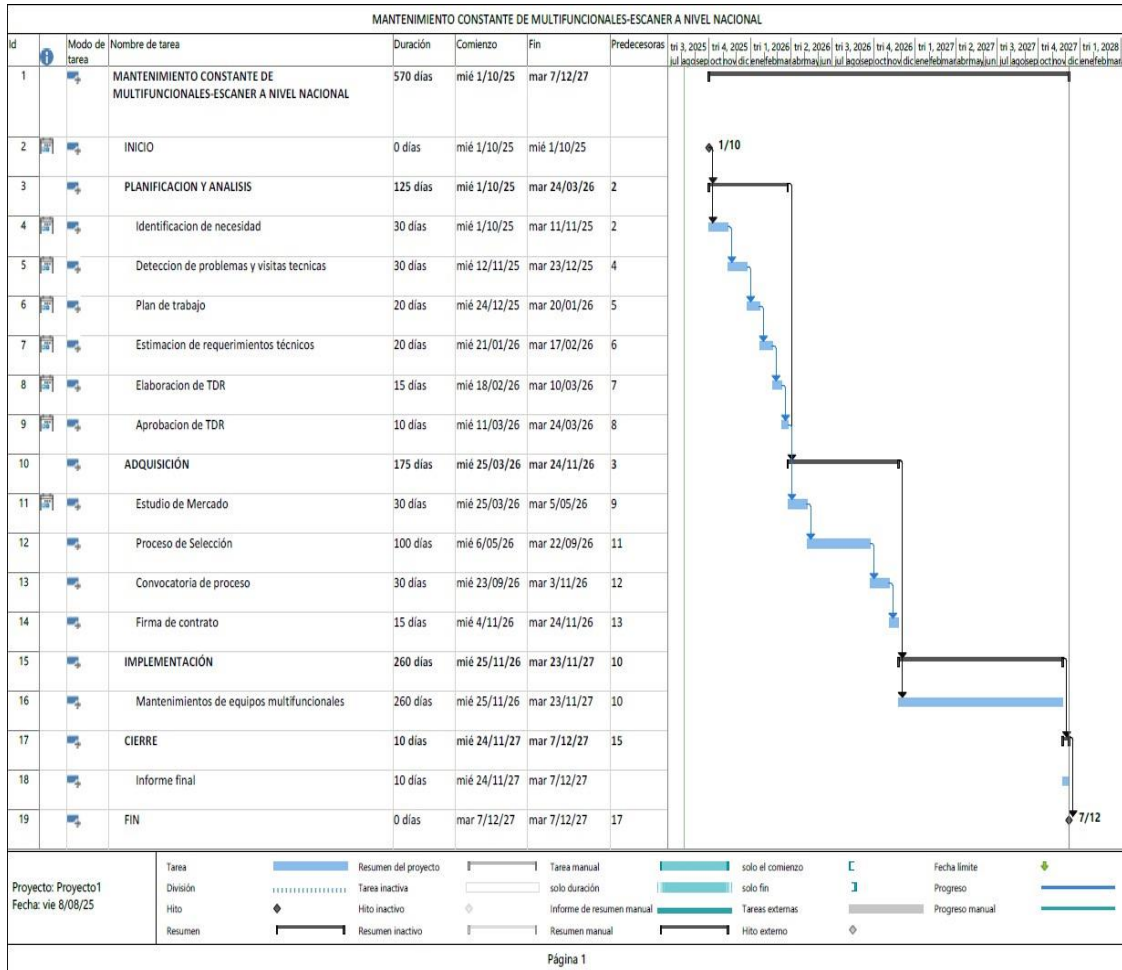

FICHA DE PROYECTO 24

Ficha de Proyecto: Implementación de App para la Gestión y Archivo de Documentos Fiscales.

Código de Proyecto: MP-PGD-024

Fecha de última actualización: 14/08/2025

1. Identificación y Alineamiento Estratégico

- **Nombre del Proyecto:** Implementación de App para la Gestión y Archivo de Documentos Fiscales.
- **Área/Unidad Responsable:** Gerencia de Tecnologías de la Información, en coordinación con las Fiscalías usuarias.
- **Justificación del Proyecto (Problema o Necesidad):** La gestión actual de documentos fiscales carece de herramientas móviles y eficientes que agilicen la labor de los fiscales. El registro y la consulta de información son procesos lentos, manuales y no están adaptados a un entorno de trabajo que requiere movilidad, lo que retrasa las investigaciones y presenta riesgos para la seguridad de la información.
- **Objetivo Estratégico del Plan de Gobierno y Transformación Digital al que se alinea:** Modernizar las herramientas de la investigación fiscal mediante la transformación digital, mejorando la eficiencia, seguridad y accesibilidad de la información.
- **Brecha de Capacidad/Servicio que cierra:** El proyecto cierra la brecha de no contar con un sistema de gestión documental moderno, seguro y orientado a dispositivos móviles, que es una necesidad fundamental para la labor fiscal actual. Introduce capacidades innovadoras como el registro por voz para optimizar drásticamente los flujos de trabajo.

2. Alcance y Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Implementar un aplicativo móvil para la gestión y archivo que permita el **registro a través de voz**, así como la **consulta y recuperación de documentos fiscales** de manera eficiente y segura, garantizando la integridad, confidencialidad y el fácil acceso a la información para los usuarios autorizados.
- **Objetivos Específicos:**
 - Desarrollar una aplicación móvil (nativa para iOS y Android) y una interfaz web complementaria.
 - Integrar un motor de reconocimiento de voz a texto para facilitar el registro de metadatos y resúmenes de documentos.
 - Implementar un sistema de búsqueda y filtros avanzados para la recuperación rápida de la información.
 - Asegurar la plataforma con controles de seguridad robustos, incluyendo autenticación de doble factor, cifrado de datos y trazabilidad de accesos.
- **Principales Entregables:**
 - Aplicativo móvil publicado en las tiendas oficiales.
 - Portal web para acceso de escritorio y funciones administrativas.
 - Repositorio de documentos seguro (en la nube o local).
 - Manuales de usuario y documentación técnica.
- **Fuera del Alcance (Exclusiones):**
 - La digitalización de archivos históricos en formato físico.
 - El análisis del contenido o la validez legal de los documentos.
 - La dotación de dispositivos móviles al personal.

3. Impacto y Beneficiarios

- **Descripción del Impacto Esperado:** Los fiscales podrán registrar, consultar y gestionar documentos críticos de forma más rápida y segura, incluso estando fuera de la oficina. La función de voz a texto reducirá significativamente el tiempo dedicado al ingreso manual de datos. Se espera una mejora general en la agilidad y seguridad del manejo de la información fiscal.
- **Impacto Cuantitativo:**
 - Reducción del tiempo promedio para registrar un documento en un 50% mediante la función de voz.
 - Disminución del tiempo de búsqueda y recuperación de un documento de minutos a segundos.
- **Impacto Cualitativo:**
 - Mejora radical en la eficiencia y movilidad de los fiscales.
 - Elevación de los estándares de seguridad y confidencialidad de la información sensible.
 - Modernización de un proceso central de la investigación fiscal.
- **Beneficiarios Directos:** Fiscales y personal autorizado que gestiona y consulta documentos en el marco de sus funciones.
- **Beneficiarios Indirectos:** El sistema de justicia en su conjunto, que se beneficia de investigaciones más ágiles, y el área de TI, al gestionar una plataforma centralizada y segura.

4. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

- **Indicadores de Gestión (Durante el proyecto):**
 - **% de Avance del Cronograma (SPI):** Cumplimiento mensual > 0.95.
 - **% de Ejecución Presupuestal (CPI):** Ejecución mensual < 1.05.
 - **Nº de Hitos Completados vs. Planificados:** 100% de cumplimiento.
- **Indicadores de Resultado (Post-implementación):**
 - **KPI 1 (Resultado):** Tasa de Adopción (porcentaje de usuarios objetivo utilizando la app mensualmente).
 - **KPI 2 (Resultado):** Tiempo promedio de recuperación de documentos a través de la búsqueda.
 - **KPI 3 (Resultado):** Nivel de Satisfacción del Usuario (CSAT) con la funcionalidad de registro por voz.

5. Cronograma y Presupuesto

- **Fases del Proyecto:**

Nº	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1	PLANIFICACIÓN	mar 1/07/25	lun 11/08/25
2	Levantamiento de requerimientos funcionales y técnicos	mar 1/07/25	lun 28/07/25
3	Conformación del equipo técnico y de gestión	lun 7/07/25	jue 10/07/25
4	Análisis normativo legal	mar 29/07/25	lun 4/08/25

5	Definición de la arquitectura del sistema	mar 5/08/25	lun 11/08/25
6	DISEÑO Y PROTOTIPADO	mar 12/08/25	vie 12/09/25
7	Diseño de experiencia de usuario (UX/UI)	mar 12/08/25	lun 25/08/25
8	Prototipo navegable y validación	mar 26/08/25	mié 27/08/25
9	Especificaciones funcionales finales	jue 28/08/25	vie 12/09/25
10	DESARROLLO E INTEGRACIÓN	lun 15/09/25	vie 7/11/25
11	Desarrollo de módulos principales	lun 15/09/25	vie 7/11/25
12	Generación de notificaciones y paneles de monitoreo, dashboard	lun 6/10/25	vie 17/10/25
13	PRUEBAS Y VALIDACIÓN	lun 10/11/25	vie 28/11/25
14	Pruebas unitarias de integración y de sistema	lun 10/11/25	vie 28/11/25
15	Auditoría de seguridad y validación legal	lun 17/11/25	mar 25/11/25
16	CAPACITACIÓN Y DESPLIEGUE	lun 1/12/25	vie 19/12/25
17	Capacitación de operadores y usuarios administrativos	lun 1/12/25	vie 19/12/25
18	Lanzamiento progresivo con plan de contingencia	lun 1/12/25	vie 19/12/25

- **Presupuesto Total Asignado: S/.50,000.00**
- **Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios.



GRÁFICA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

